

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO

INFORME FINAL



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
(2026)



1.	Resumen Ejecutivo del Programa.....	2
2.	Avance del Proyecto	3
2.1	Logros alcanzados en los Componentes del Programa	4
2.2	Avance Objetivos generales y específicos de desarrollo	36
2.3	Desempeño del Contrato de Préstamo	40
3.	Análisis de las Herramientas de Planificación	40
3.1	Gestión de Adquisiciones	41
3.2	Estado de las evaluaciones del contrato de préstamo	42
4.	Lecciones aprendidas, buenas prácticas, hallazgos y recomendaciones	43
5.	Sostenibilidad	43
6.	Estado de cláusulas contractuales...	44
7.	Estado del archivo y gestión documental....	44
8.	Historias de Campo, Registro Fotográfico y Registro audiovisual....	45

I. Resumen Ejecutivo del Programa

El Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República fue creado con el fin de incrementar la efectividad del control fiscal mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la incorporación de herramientas digitales y la consolidación de un modelo de participación ciudadana soportado en tecnologías digitales. Su ejecución se estructuró en tres componentes misionales y un componente transversal de administración del Programa, financiados con un préstamo BID por USD 30 millones.

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital. Durante la ejecución del Programa se consolidaron los principales instrumentos de gobernanza institucional para la transformación digital de la CGR. Como resultado de estas intervenciones, la entidad automatizó cuatro procesos misionales priorizados, fortaleciendo la productividad institucional y reduciendo actividades manuales.

Componente 2. Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal. Este componente concentró la mayor inversión del Programa y permitió modernizar las capacidades tecnológicas del ejercicio del control fiscal. Estas soluciones fortalecieron la capacidad de análisis de grandes volúmenes de información y permitieron migrar progresivamente hacia un modelo de control preventivo soportado en analítica de datos e inteligencia institucional.

Componente 3. Enfoque ciudadano e integridad. Los principales resultados estuvieron orientados a transformar la relación entre la ciudadanía y la Contraloría. Uno de los resultados más representativos fue el incremento de la participación ciudadana mediante canales digitales, pasando de aproximadamente 37 % al inicio del Programa a 93,3 %, junto con la gestión digital de más de 33.800 requerimientos ciudadanos, fortaleciendo la transparencia y la interacción con la ciudadanía.

La ejecución financiera del Programa muestra una evolución consistente durante las vigencias de ejecución y un adecuado nivel de absorción de los recursos del préstamo.

- Monto del préstamo: USD 30.000.000.
- Desembolsos acumulados: USD\$22.319.605,38 equivalentes al 74,70% del valor total del préstamo.
- Justificaciones acumuladas: USD\$20.152.878,27, equivalentes al 67,17% de los recursos desembolsados.


Análisis de relaciones

Porcentaje de desembolsos: (Total desembolsado / Total Proyecto)	74,70%
Porcentaje de justificaciones: (Total justificaciones/ Total Proyecto = ejecución real registrada x componente)	67,17%
# Meses transcurridos desde la firma hasta hoy:	54
# Meses totales del Proyecto:	54
% Tiempo transcurrido desde firma hasta hoy:	100%
# Meses transcurridos desde ultima justificación hasta hoy:	8
Cumplimiento de objetivos específicos	100%

2. Avance del Proyecto

Al cierre del Programa para la Transformación Digital de la CGR, la relación entre el avance físico (cumplimiento de las metas y productos) y el avance financiero (ejecución de los recursos presupuestados) presentó un comportamiento positivo: se logró el 100% de la ejecución física de los tres componentes estructurales, sin agotar el 100% del presupuesto aprobado. A nivel representativo, el comportamiento se visualiza de la siguiente manera:

Gráfico 1. Avance del Proyecto

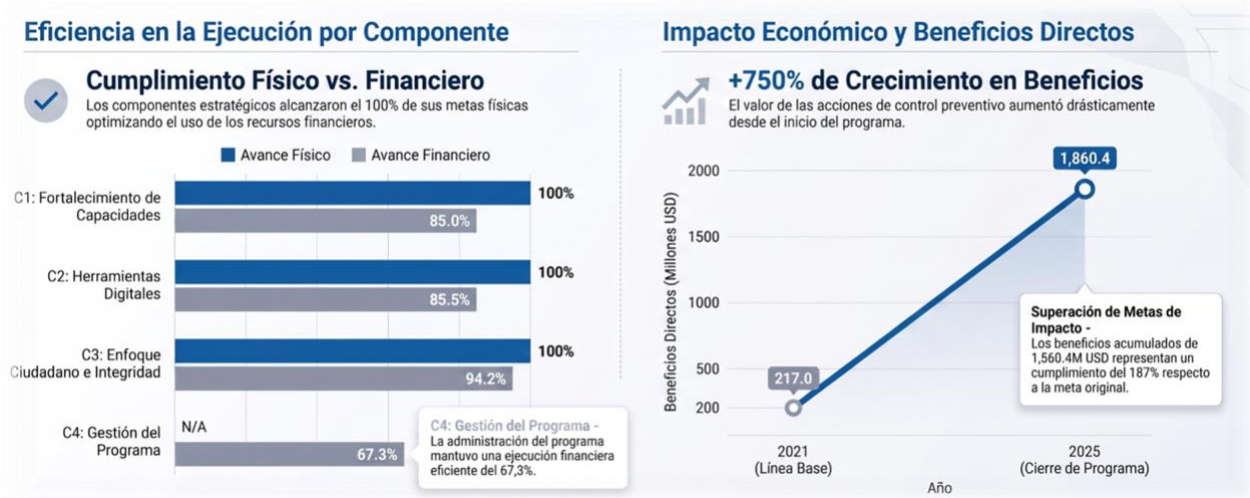

Fuente: Elaboración propia a partir de la información compilada de avance del Programa (gráfico aportado por NoteBookLM)

2.1 Logros alcanzados en los Componentes del Programa

En el **Componente 1 – Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital**, se consolidaron los principales instrumentos de arquitectura institucional, gobierno de datos, interoperabilidad, automatización de procesos y gestión por procesos. Uno de los principales resultados, se encuentra asociado a la automatización de cuatro procesos institucionales priorizados, superando las capacidades iniciales de digitalización previstas para la entidad y fortaleciendo la productividad institucional. Paralelamente se implementaron modelos de gobierno de datos, identidad digital, interoperabilidad y gestión documental, que constituyen la base para la transformación digital de largo plazo.

Producto 1.1. Estrategia de transformación digital, diseñada e implementada

La operación estableció el diseño e implementación de esta estrategia con el fin de orientar de manera integral la modernización de la Contraloría General de la República, constituyéndose en el marco estratégico para fortalecer las capacidades institucionales, incorporar nuevas tecnologías, transformar los procesos de gestión y apoyar el cumplimiento de las nuevas competencias asignadas a la Entidad. Para alcanzar este objetivo, se adelantó el diagnóstico del estado de madurez digital de la CGR, la definición de la visión y la hoja de ruta de transformación; como resultado, el

producto alcanzó el cumplimiento de la meta prevista, consolidando una estrategia institucional que orientó la implementación coordinada de los demás productos del Programa.

Avance físico

Producto 1.1	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de transformación digital, diseñada e implementada	Documento de estrategia	P	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		A	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizada al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.1		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de transformación digital, diseñada e implementada	P	\$515.220,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.220,00
	P(a)	\$515.220,00	\$241.537,84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.553,82
	A	\$201.403,65	\$241.150,17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.553,82

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizada al 30 de junio de 2026

Para el producto 1.1. se programó una inversión total de USD515.220, de los cuales se registraron pagos por USD442.553,82 sin requerirse recursos adicionales para las vigencias posteriores, alcanzando aproximadamente el 85,9% del presupuesto previsto. Los recursos efectivamente ejecutados fueron suficientes para cumplir la totalidad de la meta física del producto, reflejando una implementación eficiente de la Estrategia con un menor nivel de gasto frente al inicialmente estimado.

Producto 1.2. Modelo de gobierno de datos y definición de estándares en función de las nuevas competencias con un desglose de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas), diseñado e implementado.

Para el cumplimiento del producto se desarrollaron actividades la actualización del Modelo de gobierno de datos en función de las nuevas competencias con un desglose de género y diversidad y la adquisición de plataformas de soporte para el modelo de gobierno de datos y el modelo de transparencia de los ejercicios analíticos. Estas acciones permitieron consolidar un marco de gobernanza de datos que fortalece la toma de decisiones basada en información confiable, promueve una gestión institucional más eficiente y garantiza la disponibilidad de información para el

ejercicio del control fiscal con un enfoque inclusivo, alcanzando la meta física prevista para el producto.

Avance físico

Producto 1.2	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de gobierno de datos y definición de estándares en función de las nuevas competencias con un desglose de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas), diseñado e implementado.	Modelo (documento)	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.2		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de gobierno de datos y definición de estándares en función de las nuevas competencias con un desglose de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas), diseñado e implementado.	P	\$41.338,90	\$75.000,00	\$168.441,10	\$0.00	\$0.00	\$284.780,00
	P(a)	\$41.338,90	\$512.527,47	\$159.171,69	\$0.00	\$0.00	\$565.481,29
	A	\$30.198,98	\$362.424,04	\$172.858,27	\$0.00	\$0.00	\$565.481,29

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto registró una programación financiera inicial de USD284.780,00, la cual fue ajustada durante la ejecución, como resultado de la ampliación del alcance y de las necesidades identificadas para consolidar el modelo de gobierno de datos y su plataforma de soporte. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD565.481,29, por lo que la meta financiera se cumplió en un 100%, ejecutando la totalidad de los recursos programados.

Producto 1.3 Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos, diseñado e implementado.

El Programa contempló el diseño e implementación de este modelo en la vigencia 2025, con el fin de modernizar la gestión documental de la Contraloría General de la República, garantizar la organización, clasificación e interoperabilidad de la información institucional y facilitar su integración con los demás sistemas de información para apoyar el ejercicio del control fiscal. Para alcanzar esta meta, se desarrolló el expediente electrónico como soporte para la gestión integral del ciclo

documental y se articuló este producto con las iniciativas de gobierno de datos. Al cierre del Programa, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento.

Avance físico

Producto 1.3	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos, diseñado e implementado.	Software	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.3		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos, diseñado e implementado.	P	\$515.220,00	\$440.000,00	\$440.000,00	\$320.000,00	\$0.00	\$1.200.000,00
	P(a)	\$515.220,00	\$153.846,15	\$0.00	\$188.397,25	\$758.637,18	\$1.205.884,78
	A	\$201.403,65	\$0.00	\$0.00	\$447.247,60	\$800.215,56	\$1.247.463,16

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD1.200.000,00, la cual fue ajustada durante la ejecución con una asignación mayor del 0,49%, como resultado de la incorporación de recursos para culminar los contratos asociados al desarrollo del modelo semántico y del expediente electrónico. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD1.247.463,16, superando ligeramente la programación financiera acumulada (103,5% de ejecución), debido a los pagos realizados con cargo a la reserva presupuestal, la variación de TRM y a los ajustes efectuados durante el cierre financiero del Programa.

Producto 1.4 Estrategia de gestión por procesos diseñada e implementada

Para la vigencia 2024 se programó el diseño e implementación de una estrategia de gestión por procesos para fortalecer el modelo de operación de la CGR mediante la estandarización, optimización y articulación de sus procesos institucionales. Para alcanzar esta meta, se adelantó un diagnóstico y estado del arte de la gestión por procesos mediante la contratación de un consultor especializado, quien identificó las necesidades y lineamientos para el fortalecimiento del modelo institucional. Posteriormente, estos resultados se integraron con el desarrollo de la implementación de la estrategia en articulación con la evolución de la automatización

de procesos, consolidando un enfoque de gestión por procesos que sirvió como habilitador para la modernización institucional y el desarrollo de las capacidades digitales de la entidad. Como resultado, el producto alcanzó el 100 % de cumplimiento al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 1.4	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de gestión por procesos diseñada e implementada	Documento de estrategia	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.4		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de transformación digital, diseñada e implementada	P	\$346.646,15	\$653.353,85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.000.000,00
	P(a)	\$346.646,15	\$1.087.127,47	\$858.383,52	\$6.043,73	\$0.00	\$417.253,85
	A	\$53.084,89	\$311.072,87	\$49.192,91	\$3.903,18	\$0.00	\$417.253,85

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD1.000.000,00, que fue ajustada durante la ejecución hasta una programación financiera acumulada (P(a)) de USD417.253,85, como resultado de la optimización del alcance y la redistribución de recursos hacia otros productos del Programa. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD417.253,85, por lo que la meta financiera se cumplió en un 100% respecto de la programación acumulada, financiando la contratación de la consultoría especializada para el diagnóstico y diseño de la estrategia. La reducción frente a la programación inicial no afectó el cumplimiento del producto.

Producto 1.5 Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada.

El Programa contempló para desarrollar en las vigencias 2024 y 2025, el diseño e implementación de una estrategia para la automatización de procesos con el fin de optimizar los procesos misionales y de apoyo de la Entidad mediante la incorporación de tecnologías digitales que incrementaran la eficiencia operativa, la trazabilidad y la

oportunidad en la gestión institucional. Para alcanzar esta meta, se estructuró la estrategia sobre la base del modelo de gestión por procesos desarrollado previamente y se realizó la automatización y su evolución en cuatro procesos priorizados de la entidad: Gestión de Cobro Coactivo, Búsqueda de Bienes, Proceso Administrativo Sancionatorio y Hojas de Vida de Sujetos de Control. Estos desarrollos fortalecieron las capacidades institucionales para la transformación digital, mejoraron la eficiencia y estandarización de los procesos y contribuyeron al cumplimiento del indicador de automatización previsto en el Programa. Como resultado, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento al cierre de la operación.

Avance físico

Producto 1.5	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada.	Software	P	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00
		P(a)	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00
		A	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.5		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada.	P	\$604.154,50	\$600.000,00	\$400.000,00	595.845,50	\$0,00	\$2.200.000,00
	P(a)	\$604.154,50	\$592.142,86	\$813.749,37	\$1.112.097,74	\$12.747,69	\$2.146.071,99
	A	\$77.721,85	\$217.324,47	\$1.172.352,85	\$665.925,13	\$13.429,24	\$2.146.753,54

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto tuvo con una programación financiera inicial (P) de USD2.200.000, se ajustó durante la ejecución con una disminución del 2,45% frente a lo inicial. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD2.146.753,54, superando ligeramente la programación financiera acumulada en USD681,55 (0,03%), diferencia atribuible a los ajustes de cierre y a la consolidación de pagos efectuados durante el proceso de liquidación del Programa. En consecuencia, la meta financiera fue alcanzada en su totalidad, garantizando la implementación de la estrategia.

Producto 1.6 Estrategia de interoperabilidad diseñada e implementada

Para 2025 se programó el diseño e implementación de la estrategia de interoperabilidad orientada a fortalecer el intercambio seguro, estandarizado y eficiente de información entre la Contraloría General de la República y los diferentes actores del ecosistema público. Para alcanzar esta meta, se realizó la identificación y caracterización del ecosistema de información pública con el que interactúa la CGR y el análisis de los sistemas, procesos y procedimientos institucionales en el marco de los macroprocesos misionales y de apoyo, así como la definición de la forma de implementación de dicha estrategia. Estas acciones fortalecieron las capacidades digitales de la entidad, facilitaron la integración de los sistemas de información para una gestión más eficiente. Como resultado, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 1.6	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de interoperabilidad diseñada e implementada	Documento de Estrategia	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.6		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de interoperabilidad diseñada e implementada	P	\$366.885,50	\$666.667,00	\$466.447,50	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00
	P(a)	\$366.885,50	\$388.351,65	\$16.850,73	\$56.087,87	\$2.640,11	\$92.188,00
	A	\$21.664,56	\$2.691,31	\$13.734,72	\$51.457,30	\$2.784,80	\$92.332,69

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el cumplimiento del producto 1.6. se programó un recurso inicial (P) de USD1.500.000,00 y se realizó una programación financiera acumulada (P(a)) de USD92.188,00, lo que representa una reducción del 93,85% frente a la programación inicial, como resultado de la redistribución de recursos hacia otros productos del Programa (recategorización) y de la ejecución del alcance mediante un esquema de consultoría de menor costo. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD92.332,69, superando levemente la programación acumulada en USD144,69 (0,16%), debido a

ajustes de cierre y a la consolidación de pagos efectuados durante la liquidación de la operación.

Producto 1.7 Modelo de riesgos y alertas para el ciclo de control fiscal diseñado

El Programa contempló para 2025 el diseño del modelo de riesgos y alertas para el ciclo de control fiscal con el propósito de fortalecer las capacidades analíticas de la CGR mediante el uso de información y analítica de datos para identificar riesgos, priorizar actuaciones de control y generar alertas tempranas que apoyaran la toma de decisiones. Para alcanzar esta meta, se definieron los lineamientos funcionales y metodológicos del modelo y se desarrolló el Modelo Predictivo de Riesgo, cuya puesta en producción fue realizada con recursos propios de la Entidad. La implementación de este modelo fortaleció la capacidad institucional para focalizar el control fiscal con base en evidencia, facilitando la identificación oportuna de riesgos y la optimización de las actuaciones de vigilancia y control. Como resultado, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 1.7	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de riesgos y alertas para el ciclo de control fiscal diseñado	Software	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.7		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de riesgos y alertas para el ciclo de control fiscal diseñado	P	\$434.276,05	\$400.000,00	\$465.723,95	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00
	P(a)	\$434.276,05	\$221.978,02	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.190,91
	A	\$ 16.931,16	\$2.259,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.190,91

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto tuvo una programación financiera inicial (P) de USD1.300.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación fue ajustada de manera significativa hasta una programación financiera acumulada (P(a)) de USD 19.190,91, con la que se contrató un consultor individual para apoyar la gestión y estructuración inicial. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD19.190,91, equivalentes al 100% de

la programación financiera acumulada, por lo que la meta financiera fue alcanzada en su totalidad, financiando los gastos asociados al cumplimiento del producto y manteniendo la coherencia entre la ejecución física y financiera del Programa.

Producto 1.8 Modelo de identidad digital diseñado e implementado

El Programa contempló el diseño e implementación de un Modelo de identidad digital para fortalecer los mecanismos de autenticación, autorización y gestión de identidades y garantizar un acceso seguro a los servicios y plataformas digitales de la Contraloría General de la República. Para alcanzar esta meta, se diseñó la arquitectura funcional y tecnológica del modelo, se definieron los lineamientos para la administración de identidades y controles de acceso, y se implementaron las capacidades tecnológicas requeridas para su operación, fortaleciendo la seguridad de la información y la protección de los activos digitales de la entidad. La implementación se consolidó durante la vigencia 2025 permitiendo alcanzar el 100% de cumplimiento del producto al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 1.8	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de identidad digital diseñado e implementado	Software	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.8		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de identidad digital diseñado e implementado	P	\$350.952,25	\$0,00	\$249.047,75	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00
	P(a)	\$350.952,25	\$153.846,15	\$191.513,17	\$585.104,68	\$0,00	\$141.328,12
	A	\$0,00	\$0,00	\$55.280,35	\$86.047,77	\$0,00	\$141.328,12

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto 1.8. tuvo una programación inicial (P) de USD600.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación fue ajustada (P(a)) a USD141.328,12, como resultado de la optimización de recursos, el apoyo de recursos propios de la Entidad y de la redefinición del alcance financiero del producto. Los pagos efectivos (A)

ascendieron a USD141.328,12, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada.

Producto 1.9 Modelo de gestión de derechos digitales diseñado e implementado

Para las vigencias 2024 y 2025, se programó el Modelo de gestión de derechos digitales con el fin de fortalecer la protección de la información institucional, garantizar el uso seguro de los activos digitales y establecer mecanismos para la administración y control de los derechos de acceso y uso de la información en la Contraloría General de la República. Para alcanzar esta meta, se definieron los lineamientos técnicos y funcionales del modelo, se diseñó la arquitectura para la gestión de derechos digitales y se implementaron las capacidades tecnológicas necesarias para administrar, proteger y controlar el acceso a la información institucional, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad digital y la gobernanza de la información. La implementación se consolidó durante la vigencia 2025 mediante la ejecución de los contratos previstos, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 1.9	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de gestión de derechos digitales diseñado e implementado	Software	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 1.9	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de gestión de derechos digitales diseñado e implementado	P	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$150.155,85	\$122.319,25	\$2.694,91
	A	\$0,00	\$0,00	\$13.970,53	\$127.363,02	\$2.846,37

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD600.000,00. Durante la ejecución del Programa, se ajustó (P(a)) a USD 144.028,46, como resultado de la optimización y recategorización de los recursos del préstamo. Los pagos efectivos (A) alcanzaron USD144.179,92, valor que supera levemente la programación acumulada en USD151,46 (0,11 %), debido a ajustes propios del

trámite financiero y al reconocimiento de pagos con recursos de reserva presupuestal. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida, al ejecutarse la totalidad de los recursos requeridos en la programación ajustada.

En el **Componente 2 – Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal** se concentró la mayor inversión del Programa y se alcanzaron los principales resultados misionales. Durante la ejecución se desarrollaron cuarenta y nueve modelos analíticos, herramientas de georreferenciación, sistemas de monitoreo del ciclo de control fiscal, plataformas de análisis de datos, infraestructura tecnológica y estrategia de ciberseguridad. Asimismo, se logró el seguimiento de 1.976 alertas fiscales de un total de 2.125 generadas (93%), fortaleciendo significativamente la capacidad preventiva y concomitante del control fiscal.

Producto 2.1 Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) diseñado e implementado

Para la vigencia 2025 se programó el diseño e implementación del Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF), orientado a fortalecer la planeación, gestión y seguimiento del ejercicio del control fiscal mediante una herramienta tecnológica que facilitara la toma de decisiones basada en información oportuna y confiable. Para alcanzar esta meta, se desarrollaron actividades de consultoría para el diseño funcional y técnico del sistema, se estructuró y ejecutó el diseño y piloto de la solución, incluyendo el tablero de control estratégico, y posteriormente se implementó y puso en funcionamiento el sistema para la construcción, gestión, seguimiento y monitoreo del PVCF. Como resultado, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.1	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) diseñado e implementado	Software	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.1		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) diseñado e implementado	P	\$451.070,35	\$500.000,00	\$575.000,00	\$573.929,65	\$0,00	\$2.100.000,00
	P(a)	\$451.070,35	\$1.047.582,42	\$1.951.453,22	\$604.003,81	\$2.967,18	\$1.965.295,08
	A	\$0,00	\$57.060,68	\$1.745.882,39	\$159.384,83	\$3.129,80	\$1.965.457,70

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el cumplimiento del producto se realizó una programación financiera inicial (P) de USD2.100.000,00. Durante la ejecución del Programa, se ajustó (P(a)) disminuyendo los recursos en 6,41%, como resultado de optimizaciones derivadas del proceso de contratación y de la ejecución del producto. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD1.962.327,90, equivalentes al 99,85% de la programación ajustada. En consecuencia, la meta financiera se considera cumplida, al haberse ejecutado casi el 100% de los recursos requeridos para el diseño, desarrollo e implementación del sistema, en concordancia con el cumplimiento del 100% de la meta física del producto.

Producto 2.2 Herramienta de georreferenciación de control fiscal diseñada e implementada.

El programa contempló para diseñar e implementar en la vigencia 2024, una Herramienta de georreferenciación para el control fiscal, con el fin de fortalecer las capacidades de análisis territorial de la Contraloría General de la República mediante la integración y visualización geoespacial de información estratégica para la vigilancia y el control fiscal. Para alcanzar esta meta, se desarrollaron mesas técnicas de definición funcional y tecnológica, se contrató un consultor especializado para apoyar la estructuración de los requerimientos de la solución y posteriormente se realizó el diseño e implementación de la herramienta, incluyendo la actualización y mantenimiento de la infraestructura de información geográfica (SIG) de la Entidad. Como resultado, se implementó una plataforma que fortalece la focalización y el análisis territorial del control fiscal, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.2	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Herramienta de georreferenciación de control fiscal diseñada e implementada	Software	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.2		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Herramienta de georreferenciación de control fiscal diseñada e implementada	P	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$367.250,15	\$284.870,88	\$0,00	\$461.716,42
	A	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el cumplimiento del producto se programaron recursos iniciales (P) de USD700.000,00. Durante la ejecución del Programa, se realizó una programación financiera acumulada (P(a)) de USD461.716,42, que representa una reducción del 34,04% frente a la programación inicial, como resultado de la optimización de recursos durante la contratación y ejecución del proyecto. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD461.716,42, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada, financiando el diseño, desarrollo e implementación de la herramienta de georreferenciación para el control fiscal. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida en su totalidad, al ejecutarse la totalidad de los recursos programados para la consecución del producto.

Producto 2.3 Modelo de operación del sistema de Control Fiscal Remoto diseñado e implementado

El Programa contempló el diseño e implementación del Modelo de operación del Sistema de Control Fiscal Remoto, para fortalecer las capacidades de la Contraloría General de la República y realizar actuaciones de vigilancia y control fiscal soportadas en herramientas digitales, optimizando la oportunidad, cobertura y eficiencia del ejercicio de control. Para alcanzar esta meta, se desarrolló el diseño inicial del modelo de operación, se definieron sus componentes funcionales y tecnológicos y, posteriormente, se implementaron las herramientas tecnológicas de soporte, incluyendo las integraciones, configuraciones y componentes de software requeridos. Como resultado, el modelo apoyó el fortalecimiento del control fiscal con

enfoques diferencial y territorial, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.3	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de operación del sistema de Control Fiscal Remoto diseñado e implementado	Software	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.3		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de operación del sistema de Control Fiscal Remoto diseñado e implementado	P	\$460.544,45	\$650.000,00	\$389.455,55	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00
	P(a)	\$460.544,45	\$443.956,04	\$495.964,78	\$553.859,45	\$2.564,10	\$720.520,85
	A	\$57.950,12	\$0,00	\$207.271,99	\$452.734,64	\$2.815,97	\$720.772,72

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto tuvo una programación financiera inicial (P) de USD1.500.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación fue ajustada a una programación financiera acumulada (P(a)) de USD720.520,85, lo que representa una reducción del 51,97% frente a la programación inicial, derivada de optimizaciones en la estructuración y contratación de las actividades requeridas para el desarrollo del producto. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD720.772,72, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada, financiando las actividades necesarias para el diseño, implementación y puesta en operación del modelo de Control Fiscal Remoto. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida en su totalidad, al ejecutarse la totalidad de los recursos programados para la consecución del producto.

Producto 2.4 Metodología para establecer líneas de trabajo de solicitudes de identificación y de fuentes de información y analítica de datos diseñada

Para la vigencia 2023 se contempló el diseño de una Metodología para establecer líneas de trabajo de solicitudes de identificación y de fuentes de información y analítica de datos, con el propósito de fortalecer las capacidades de la Entidad para la gestión, análisis y aprovechamiento estratégico de la información como soporte del control fiscal. Para ello se desarrolló y actualizó la metodología para los ejercicios

analíticos de la Entidad, definiendo líneas de trabajo para la identificación y gestión de fuentes de información, en articulación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la Oficina de Sistemas e Informática (OSEI) y otras dependencias involucradas. Estas actividades permitieron fortalecer el proceso de madurez analítica de la CGR, alineándolo con el modelo de gobierno de datos y la estrategia de transformación digital institucional, consolidando una metodología que orienta el desarrollo de ejercicios analíticos para el control fiscal. Como resultado, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.4	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Metodología para establecer líneas de trabajo de solicitudes de identificación y de fuentes de información y analítica de datos diseñada	Documento de metodología	P	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		A	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.4		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Metodología para establecer líneas de trabajo de solicitudes de identificación y de fuentes de información y analítica de datos diseñada	P	\$0,00	\$250.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000,00
	P(a)	\$0,00	\$131.868,13	\$146.341,46	\$0,00	\$0,00	\$156.689,64
	A	\$0,00	\$0,00	\$156.689,64	\$0,00	\$0,00	\$156.689,64

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el desarrollo del producto se programaron (P) de USD250.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) fue de USD156.689,64, lo que representa una reducción del 37,32% frente a la programación inicial, como resultado de eficiencias en la contratación y ejecución de las actividades previstas. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD156.689,64, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada, financiando las actividades necesarias para el diseño y consolidación de la metodología. La meta financiera fue cumplida en su totalidad, al ejecutarse la totalidad de los recursos programados para la consecución del producto.

Producto 2.5 Modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante diseñados e implementados.

Para la vigencia 2023 se contempló el diseño e implementación de modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante, con el propósito de fortalecer las capacidades de la Contraloría General de la República para identificar riesgos, generar alertas y apoyar la toma de decisiones mediante el análisis avanzado de datos, la cual tuvo un ajuste para su cumplimiento en la vigencia 2024. Para alcanzar esta meta, se desarrolló el análisis y la construcción de las líneas base de los modelos analíticos. Posteriormente, se ejecutaron consultorías especializadas para definir los componentes técnicos y se desarrolló el diseño e implementación de escenarios de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante, incorporando modelos basados en inteligencia artificial y nuevas capacidades analíticas para fortalecer la vigilancia y el control fiscal. Como resultado, el producto alcanzó el 100% de cumplimiento al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.5	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante diseñados e implementados	Software	P	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.5		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante diseñados e implementados	P	\$316.503,45	\$1.683.496,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00
	P(a)	\$316.503,45	\$769.780,22	\$1.207.859,49	\$41.573,27	\$0,00	\$641.539,23
	A	-	\$19.899,76	\$616.350,29	\$5.289,18	\$0,00	\$641.539,23

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el cumplimiento del producto se realizó una programación financiera inicial (P) de USD2.000.000,00. La programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD641.539,23, lo que representa una reducción del 67,92% frente a la programación inicial, como resultado de la optimización de recursos y de ajustes en la programación de las actividades requeridas para el desarrollo del producto. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD641.539,23, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada. En consecuencia, la meta financiera fue

cumplida en su totalidad, al ejecutarse la totalidad de los recursos programados para la consecución del producto.

Producto 2.6 Modelo de data lake basado en big data diseñado e implementado.

El programa programó para su cumplimiento en 2024, el diseño e implementación de un modelo de Data Lake basado en Big Data, orientado a consolidar una arquitectura de datos que permitiera integrar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información para fortalecer las capacidades analíticas de la Contraloría General de la República y apoyar el control fiscal preventivo y concomitante. Para ello se desarrollaron consultorías especializadas en ingeniería y arquitectura de software que definieron la línea base y la estructuración técnica de la solución, así como el diseño e implementación de escenarios de analítica y del lago de datos, incorporando una arquitectura basada en tecnologías Big Data, alineada con el modelo de gobierno de datos y la estrategia de transformación digital de la Entidad, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.6	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de data lake basado en big data diseñado e implementado	Software	P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.6		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Modelo de data lake basado en big data diseñado e implementado	P	\$0,00	\$375.000,00	\$375.000,00	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00
	P(a)	\$0,00	\$2.129.252,75	\$16.097,56	\$180.332,60	\$0,00	\$1.394.900,39
	A	\$0,00	\$780.331,77	\$508.108,98	\$106.459,64	\$0,00	\$1.394.900,39

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD750.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se incrementó a USD1.394.900,39, equivalente a un aumento del 85,99% frente a la programación inicial, como resultado del fortalecimiento del alcance técnico y de las inversiones requeridas para la implementación de la arquitectura de datos y sus capacidades asociadas. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a

USD1.394.900,39, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada, financiando el diseño e implementación del modelo de Data Lake basado en Big Data. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida en su totalidad, al ejecutarse la totalidad de los recursos programados para la consecución del producto.

Producto 2.7 Sistema metabuscador integral diseñado e implementado.

Para la vigencia 2025 se programó el cumplimiento del sistema metabuscador integral que permitiera centralizar, indexar y explotar la información generada por los procesos automatizados de la CGR. Para alcanzar esta meta, se adelantó la consultoría para fortalecer la interoperabilidad entre fuentes de datos y optimizar el acceso a la información institucional mediante herramientas avanzadas de búsqueda y analítica. Como resultado, la Entidad dispuso de una solución tecnológica que mejora la localización y explotación de información para apoyar la toma de decisiones y fortalecer el ejercicio del control fiscal, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto al cierre del Programa.

Avance físico

Producto 2.7	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Sistema metabuscador integral diseñado e implementado	Software	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.7		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Sistema metabuscador integral diseñado e implementado	P	\$0,00	\$0,00	\$750.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$232.000,11	\$374.326,92	\$464.120,92
	A	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$89.794,00	\$394.842,54	\$484.636,54

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto tuvo una programación financiera inicial (P) de USD1.500.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD464.120,92, reflejando una reducción frente a la programación inicial como resultado de la optimización de recursos y de la reprogramación de las inversiones requeridas para el desarrollo de la solución. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD484.636,54, superando en USD 20.515,62 (4,42%) la programación

financiera acumulada. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida e incluso superada, garantizando los recursos necesarios para la implementación del sistema.

Producto 2.8 Gestión, infraestructura y servicios TIC con criterios de eficiencia energética, adquiridos y en operación.

El Programa contempló para las vigencias 2023, 2024 y 2025, la adquisición y puesta en operación de la infraestructura tecnológica, licencias, plataformas y servicios TIC con criterios de eficiencia energética, necesarios para soportar la modernización tecnológica de la Contraloría General de la República y garantizar la disponibilidad de las capacidades requeridas para la transformación digital institucional. Para alcanzar esta meta, se ejecutaron acciones orientadas a la renovación y sostenimiento de plataformas tecnológicas, incluyendo la continuidad de la solución Business on Demand (SAP) para la gestión administrativa, la contratación de consultoría especializada para fortalecer la gestión de infraestructura y servicios TIC, la gestión de licenciamiento para las tecnologías implementadas, así como la estructuración y adquisición de soluciones de Low Code, créditos para Azure destinados al Data Lake y al sistema metabuscador, infraestructura de conectividad mediante switches y la adquisición de equipos de cómputo para fortalecer la capacidad tecnológica de la Entidad. Como resultado, se consolidó una infraestructura TIC moderna y en operación, que soporta los nuevos servicios digitales, las plataformas analíticas y los procesos misionales del Programa, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto al cierre de la operación.

Avance físico

Producto 2.8	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Gestión, infraestructura y servicios TIC con criterios de eficiencia energética, adquiridos y en operación	Servicios operativos	P	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.8		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Gestión, infraestructura y servicios TIC con criterios de eficiencia energética, adquiridos y en operación	P	\$1.474.860,50	\$427.232,00	\$300.000,00	\$497.907,50	\$0,00	\$2.700.000,00
	P(a)	\$1.474.860,50	\$895.866,11	\$1.214.804,67	\$4.510.908,08	\$1.304.773,33	\$4.114.439,28
	A	\$863.954,99	\$552.612,51	\$891.216,68	\$501.881,77	\$1.395.851,50	\$4.205.517,45

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD2.700.000,00. La programación financiera acumulada (P(a)) ascendió a USD4.114.439,28, reflejando el fortalecimiento de las inversiones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, licenciamiento y servicios TIC. Los pagos efectivos (A) alcanzaron USD4.205.517,45, superando en USD 91.078,17 (2,21%) la programación acumulada. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida e incluso superada, evidenciando la ejecución efectiva de los recursos requeridos para la consecución del producto.

Producto 2.9 Estrategia de ciberseguridad diseñada implementada

Para la vigencia 2025 se contempló el diseño e implementación de una estrategia integral de ciberseguridad para fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica y los servicios digitales de la Contraloría General de la República, en concordancia con el proceso de transformación digital. Para el cumplimiento del producto se adelantó la estructuración técnica de las iniciativas de ciberseguridad, la formulación del diagnóstico de riesgos cibernéticos con base en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la evaluación de vulnerabilidades y pruebas de penetración, y la estrategia de ciberseguridad institucional. Como resultado, la Contraloría fortaleció sus capacidades para gestionar riesgos cibernéticos, proteger sus activos de información y soportar de manera segura la operación de las nuevas plataformas y servicios digitales desarrollados en el marco del Programa, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 2.9	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de ciberseguridad diseñada implementada	Servicios operativos	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 2.9		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de ciberseguridad diseñada implementada	P	\$1.582.514,70	\$1.083.334,00	\$300.000,00	\$534.151,30	\$0,00	\$3.500.000,00
	P(a)	\$1.582.514,70	\$533.408,68	\$415.032,44	\$181.875,21	\$7.692,31	\$1.790.389,83
	A	\$1.469.437,21	\$62.261,75	\$51.531,17	\$199.467,39	\$8.098,98	\$1.790.796,50

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD3.500.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD1.790.389,83, lo que representa una disminución del 48,85% frente a la programación inicial, derivada de la optimización de las inversiones y de la implementación de algunas iniciativas de ciberseguridad mediante recursos institucionales. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD1.790.796,50, superando en USD406,67 la programación financiera acumulada. La meta financiera fue cumplida, reflejando la ejecución efectiva de los recursos previstos para la consecución del producto.

En el **Componente 3 – Enfoque ciudadano e integridad** se materializó una transformación significativa en la relación entre la Entidad y la ciudadanía. La implementación de la plataforma CGR|COL apoyó la gestión de más de 33.800 solicitudes ciudadanas mediante canales digitales y se elevó la participación ciudadana por medios electrónicos desde una línea base del 37% hasta el 93,3% al cierre del Programa. Adicionalmente se desarrollaron estrategias de participación ciudadana, trazabilidad de denuncias, fortalecimiento de veedurías, enfoque diferencial e indicadores de género e integridad, consolidando un modelo de interacción más transparente, accesible y orientado al ciudadano.

Producto 3.1 Estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, diseñada e implementada

En el marco del Programa se programó para 2024, el diseño e implementación de la estrategia para la atención, el acercamiento y la participación ciudadana, orientada a fortalecer la relación entre la Contraloría General de la República y la ciudadanía mediante canales digitales inclusivos, con enfoque diferencial para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y demás poblaciones diversas, promoviendo una mayor participación en el ejercicio del control fiscal. Para alcanzar esta meta, se desarrollaron actividades de diagnóstico y diseño de la experiencia ciudadana, estructuración de la estrategia con apoyo de consultoría especializada, definición de mecanismos de atención y participación con enfoque de género y diversidad, articulación con iniciativas de transformación digital y consolidación de un ecosistema multicanal para ampliar la cobertura, accesibilidad y oportunidad de

los servicios dirigidos a la ciudadanía. Como resultado, la Entidad fortaleció su modelo de atención y participación ciudadana, integrando herramientas digitales y mecanismos de interacción más inclusivos y eficientes, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.1	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, diseñada e implementada	Servicios operativos	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.1		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, diseñada e implementada	P	\$343.416,15	\$206.583,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$550.000,00
	P(a)	\$343.416,15	\$372.097,11	\$241.576,10	\$219.502,82	\$0,00	\$1.071.610,78
	A	\$477.479,29	\$395.911,40	\$57.521,90	\$140.698,19	\$0,00	\$1.071.610,78

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el cumplimiento del producto se programaron (P) USD550.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD1.071.610,78, reflejando el fortalecimiento del alcance de las actividades y la incorporación de inversiones adicionales para consolidar la estrategia de atención y participación ciudadana. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD1.071.610,78, alcanzando el 100 % de la programación financiera acumulada y el cumplimiento del producto.

Producto 3.2 Tablero de control de indicadores de género y diversidad relevantes para ser monitoreados periódicamente, diseñada e implementada

el Programa contempló el diseño e implementación de una herramienta gerencial de tablero de control de indicadores de género y diversidad, con el propósito de disponer de información periódica para el seguimiento de variables relacionadas con pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas, fortaleciendo la toma de decisiones con enfoque inclusivo. Para alcanzar esta meta, se desarrollaron actividades de diagnóstico y definición de

indicadores, diseño de la arquitectura funcional del tablero, elaboración de fichas técnicas y hoja de ruta para su implementación, Como resultado, la Contraloría General de la República dispuso de una herramienta gerencial que fortalece el monitoreo de indicadores de género y diversidad, incorpora el enfoque diferencial en la gestión institucional y contribuye al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.2	Unidad de Medida	2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Tablero de control de indicadores de género y diversidad relevantes para ser monitoreados periódicamente, diseñada e implementada	Tablero	P	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.2		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Tablero de control de indicadores de género y diversidad relevantes para ser monitoreados periódicamente, diseñada e implementada	P	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$103.380,98	\$1.488,77	\$0,00	\$5.136,30
	A	\$0,00	\$0,00	\$3.799,30	\$1.337,00	\$0,00	\$5.136,30

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD100.000,00. posteriormente la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD5.136,30 y los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD5.136,30, alcanzando el 100% de la programación financiera acumulada. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida, evidenciando una ejecución acorde con los recursos finalmente requeridos para la consecución del producto.

Producto 3.3 Sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimiento ciudadanos, diseñado e implementado

Para la vigencia 2024 se programó el cumplimiento de dicho producto para fortalecer la gestión integral de las peticiones ciudadanas mediante herramientas digitales que permitieran su recepción, seguimiento y trazabilidad a través de múltiples canales de interacción. Para lograr su cumplimiento, se desarrolló e implementó un modelo tecnológico para la recopilación y gestión de contactos y requerimientos provenientes de redes sociales, correo electrónico, buzones y otros canales digitales;

adicionalmente, se contó con consultoría especializada para apoyar el diseño funcional, la implantación de la solución tecnológica y la consolidación de la estrategia de atención y participación ciudadana, incorporando funcionalidades para mejorar la experiencia del ciudadano y la interoperabilidad con el ecosistema digital institucional. Como resultado, la Contraloría General de la República implementó CGR|COL para fortalecer la trazabilidad de las denuncias y requerimientos ciudadanos, optimizar la gestión de los casos, incrementar la transparencia en el seguimiento y contribuir a una atención más oportuna y eficiente, alcanzando así el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.3	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimiento ciudadanos, diseñado e implementado	Software de trazabilidad	P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.3		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimiento ciudadanos, diseñado e implementado	P	\$204.543,15	\$145.456,85	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00
	P(a)	\$204.543,15	\$46.074,35	\$241.576,10	\$389.394,99	\$4.450,77	\$723.730,21
	A	\$428.982,93	\$42.159,66	\$42.163,66	\$205.973,19	\$4.698,22	\$723.977,66

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para dar cumplimiento al producto, se realizó una programación financiera inicial (P) de USD350.000,00. Dicha programación se ajustó (P(a)) incrementándose hasta USD723.730,21, reflejando el fortalecimiento del alcance del producto mediante el desarrollo de la solución tecnológica, la implementación de funcionalidades adicionales y la utilización de recursos de reserva presupuestal para su consolidación. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD 723.977,66, superando la programación financiera acumulada en USD 247,45 (0,03%), debido a ajustes de cierre asociados a la ejecución del Programa. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida evidenciando la ejecución total de los recursos requeridos para la consecución del producto.

Producto 3.4 Estrategia para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5, diseñada e implementada

El Programa contempló el diseño e implementación de una estrategia para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5 – Igualdad de Género, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales e incorporar el enfoque de sostenibilidad y de género en el ejercicio del control fiscal. Para alcanzar esta meta, se desarrolló una consultoría especializada que permitió formular una metodología integral de fiscalización de los ODS para los macroprocesos de vigilancia y control fiscal Macro y Micro, actualizar la Guía de Evaluación del Desempeño de la Gestión Fiscal conforme a estándares internacionales (ISSAI 300 y 3000 e INTOSAI GOV 9400), y fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de auditoría mediante el acompañamiento en la estructuración e implementación de la estrategia. Como resultado, la Entidad consolidó una estrategia institucional que integra el enfoque de los ODS, especialmente el ODS 5, en los procesos de auditoría y evaluación del desempeño, fortaleciendo la incorporación de la perspectiva de género en el control de los recursos públicos y alcanzando el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.4	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5, diseñada e implementada	Documento de estrategia	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.4		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5, diseñada e implementada	P	\$0,00	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$90.264,30	\$233.097,04	\$0,00	\$89.143,61
	A	\$0,00	\$4.960,50	\$17.898,10	\$66.285,01	\$0,00	\$89.143,61

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD200.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD89.143,61, como resultado de la redefinición del alcance y de las necesidades efectivas de contratación para la formulación, adopción y despliegue de la estrategia. Los pagos efectivos (A) ascendieron igualmente a USD89.143,61. En

consecuencia, la meta financiera en A fue cumplida, al ejecutarse el 100% de la programación financiera acumulada prevista para este producto.

Producto 3.5 Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de la CGR en materia de integridad institucional diseñada e implementada.

Para la vigencia 2025 se programó el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría General de la República en materia de integridad institucional, con el fin de consolidar una cultura organizacional basada en los principios de ética, transparencia, prevención de riesgos de corrupción y buen gobierno. Para el logro del producto, se desarrollaron actividades de levantamiento y análisis de información institucional, formulación y consolidación de la estrategia de integridad, acompañamiento técnico especializado mediante consultorías para su diseño e implementación, así como la elaboración de una hoja de ruta para orientar su despliegue y sostenibilidad en la Entidad, con lo que se alcanzó el 100 % de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.5	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de la CGR en materia de integridad institucional diseñada e implementada	Documento de estrategia	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.5		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de la CGR en materia de integridad institucional diseñada e implementada	P	\$0,00	\$352.500,00	\$447.500,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$432.052,22	\$8.316,20	\$33.133,22
	A	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.817,02	\$9.108,75	\$33.925,77

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD800.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD33.133,22, concentrándose los recursos en las actividades efectivamente requeridas para la consolidación de la estrategia, incluyendo pagos asociados a consultorías ejecutadas en 2025 y recursos de reserva presupuestal en 2026. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD33.925,77, superando la programación

financiera acumulada en USD 792,55, equivalente al 2,39% para la consecución del producto.

Producto 3.6 Estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas, diseñada e implementada

Para la vigencia 2024, el Programa contempló el diseño e implementación de una estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas, con el fin de fortalecer el control social, ampliar la participación de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos y consolidar mecanismos innovadores de interacción entre la Contraloría General de la República y las organizaciones de veeduría. Para alcanzar esta meta, se desarrolló una consultoría especializada para diseñar e implementar estrategias innovadoras e inclusivas de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, complementada con el apoyo de un consultor individual para la estructuración, seguimiento y consolidación de las actividades del producto. La estrategia se articuló con las herramientas digitales y el enfoque ciudadano del Programa, promoviendo mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas que fortalecen el ejercicio del control fiscal participativo. Como resultado, la Contraloría consolidó e implementó una estrategia institucional para promover las veedurías ciudadanas, fortaleciendo las capacidades de la ciudadanía para ejercer control social sobre la gestión pública y alcanzando el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.6	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas, diseñada e implementada	Documento de estrategia	P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.6		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas, diseñada e implementada	P	\$107.654,20	\$291.667,00	\$475.678,80	\$0,00	\$0,00	\$875.000,00
	P(a)	\$107.654,20	\$0,00	\$237.363,41	\$1.472,33	\$0,00	\$114.275,48
	A	\$0,00	\$0,00	\$112.938,48	\$1.337,00	\$0,00	\$114.275,48

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Para el cumplimiento del producto se realizó una programación financiera inicial (P) de USD875.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD114.275,48, concentrando los recursos necesarios para la contratación de la consultoría especializada y el apoyo técnico requerido para el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD 14.275,48, equivalentes al 100% de la programación financiera acumulada, lo que evidencia la ejecución total de los recursos previstos para este producto. En consecuencia, la meta financiera fue cumplida, garantizando el financiamiento de las actividades necesarias para alcanzar el resultado programado.

Producto 3.7 Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta operación, con enfoque de género y diversidad, diseñada e implementada

Para la vigencia 2025, se contempló diseñar e implementar la estrategia orientada a fortalecer la apropiación de la transformación digital por parte de los servidores de la Contraloría General de la República y a facilitar la adopción de las nuevas herramientas, procesos y tecnologías desarrolladas en los tres componentes del Programa. Se formuló inicialmente la estrategia de gestión del cambio y comunicaciones en 2023 y, posteriormente, se ejecutó una fase complementaria enfocada en el uso de herramientas digitales y de productividad, acompañada de procesos de capacitación, sensibilización, comunicaciones internas y fortalecimiento de capacidades, logrando formar a más de 1.200 servidores públicos, incluidos funcionarios de las gerencias departamentales, y consolidando una cultura organizacional orientada a la innovación y al uso efectivo de las soluciones tecnológicas implementadas. Como resultado, la estrategia quedó diseñada e implementada de manera transversal, alcanzando el 100% de cumplimiento del producto.

Avance físico

Producto 3.7	Unidad de Medida	2022		2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta operación, con enfoque de género y diversidad, diseñada e implementada	Documento de estrategia	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
		A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Avance financiero – Financiamiento

Producto 3.7		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta operación, con enfoque de género y diversidad, diseñada e implementada	P	\$589.083,15	\$200.000,00	\$335.916,85	\$0,00	\$0,00	\$1.125.000,00
	P(a)	\$589.083,15	\$619.338,85	\$503.341,71	\$394.962,68	\$158.828,68	\$922.185,52
	A	\$211.663,71	\$138.761,93	\$252.589,82	\$160.341,38	\$167.724,97	\$931.081,81

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

El producto contó con una programación financiera inicial (P) de USD1.200.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD 922.185,52, reflejando la priorización de los recursos necesarios para desarrollar la estrategia de gestión del cambio, las actividades de capacitación y formación digital continua, las acciones de comunicación y acompañamiento para la apropiación de las soluciones tecnológicas implementadas en la Entidad. Los pagos efectivos (A) ascendieron a USD931.081,81, superando la programación financiera acumulada en USD 8.896,29 (0,96%), y garantizando la financiación de la totalidad de las actividades previstas para este producto.

Finalmente, otros costos asociados a la **Administración del Programa** garantizaron el adecuado funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa, el cumplimiento de los procedimientos fiduciarios del Banco Interamericano de Desarrollo, el seguimiento permanente mediante el Plan de Monitoreo y Evaluación, la realización de auditorías externas con opinión limpia y la adecuada gestión administrativa, financiera y contractual hasta el cierre de la operación. Este componente permitió sostener la gobernanza del Programa durante toda su ejecución y asegurar la calidad técnica y financiera de los productos entregados.

Avance financiero

Otros Costos		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
4.1. Administración del programa	P	\$309.537,00	\$310.000,00	\$275.000,00	\$265.463,00	\$0,00	\$1.160.000,00
	P(a)	\$309.537,00	\$303.987,46	\$441.203,35	\$390.266,68	\$520.433,15	\$1.888.628,69
	A	\$265.263,68	\$187.733,37	\$410.866,88	\$504.331,61	\$322.772,43	\$1.690.967,97

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Otros Costos		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
4.2. Auditoría	P	\$25.330,00	\$64.670,00	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$210.000,00
	P(a)	\$25.330,00	\$64.670,00	\$0,00	\$49.940,63	\$66.366,42	\$168.137,70
	A	\$0,00	\$30.535,48	\$37.388,08	\$33.847,72	\$13.206,46	\$114.977,74

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

Otros Costos		2022	2023	2024	2025	2026	EOP
4.3. Evaluaciones	P	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$430.000,00
	P(a)	\$0,00	\$0,00	\$86.037,80	\$47.328,05	\$153.846,15	\$204.939,61
	A	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.093,46	\$0,00	\$51.093,46

Fuente: Matriz de Resultados – MR actualizado al 30 de junio de 2026

el Componente 4: Administración del Programa contó con una programación financiera inicial (P) de USD1.800.000,00. Durante la ejecución del Programa, la programación financiera acumulada (P(a)) se ajustó a USD2.261.706,00, reflejando la incorporación de los recursos requeridos para la coordinación técnica, administrativa, financiera y de adquisiciones del Programa, así como para la auditoría externa y la evaluación final e impacto de la operación y otras consultorías asociadas. Los pagos efectivos (A) han ascendido a USD1.857.039,17, financiando las actividades de administración y soporte a la ejecución del Programa.

Análisis de la Triple Restricción del Proyecto y análisis de desviaciones

El análisis de la triple restricción evidencia que el Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República mantuvo el cumplimiento de su alcance estratégico, pese a los ajustes realizados en tiempo y costo durante su ejecución. En materia de alcance, el Programa logró la implementación de la totalidad de los productos previstos en los tres componentes misionales, alcanzando los objetivos de fortalecimiento institucional, modernización de las herramientas para el control fiscal y promoción de la transparencia y la participación ciudadana, con un nivel de cumplimiento físico del 100 % al cierre de la operación

En relación con el tiempo, la ejecución requirió una extensión del plazo originalmente previsto, autorizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de culminar garantizar el cierre de operación efectiva y elaborar un documento de memorias institucionales del Programa. Esta ampliación permitió finalizar las actividades programadas sin afectar el logro de los resultados esperados.

Respecto al costo, la ejecución presentó cambios frente a la programación financiera inicial (P), derivadas de la redistribución de recursos entre productos, economías obtenidas en procesos de contratación, ajustes en el alcance financiero de algunas adquisiciones y la priorización de inversiones de mayor impacto para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Estas variaciones fueron gestionadas mediante las modificaciones y recategorizaciones aprobadas durante la ejecución, sin comprometer el cumplimiento de las metas físicas. En consecuencia, aunque algunos productos ejecutaron recursos inferiores o superiores a los inicialmente programados, las desviaciones fueron controladas oportunamente y permitieron preservar el equilibrio entre alcance, tiempo y costo, garantizando el cumplimiento de los resultados esperados por el Programa.

TIEMPO

# Meses	Descripción	# Meses	% Acumulado
Número de meses	Línea de Base Plazo de ejecución	48.00	100%
	Real	54.00	113%

ALCANCE

# Productos	Descripción	2022	2023	2024	2025	2026	EOP	% Acumulado
Cantidad de productos	Línea de Base Plan al Inicio (P)	0.00	4.00	12.00	13.00	0.00	29.00	100%
	Línea de Base Plan al Inicio (Pa)	0.00	3.00	12.00	14.00	0.00	29.00	100%
	Real	0.00	3.00	12.00	14.00	0.00	29.00	100%
	% Anual	0%	10%	41%	48%	0%		

COSTO


\$	Descripción	2022	2023	2024	2025	2026	EOP	% Acum.
Costo de productos	Línea de Base Plan al Inicio (P)	8.524.530,45	10.024.961,10	7.523.211,50	3.927.296,95	\$0,00	30.000.000,00	100%
	Real	4.175.737,02	3.409.151,42	6.771.824,84	4.366.515,60	3.141.525,59	21.864.754,47	73%
	% Anual	49%	34%	90%	11%	-		

Fuente: Elaboración propia con formato propuesto por el BID

GRÁFICA AVANCE DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN

Variable	ALCANCE %	TIEMPO %	COSTO %
Real al corte del ISP	100%	113%	73%
Línea de Base (LB)	100%	100%	100%

100% de alcance cumplido con +13% de tiempo y -27% en costos.

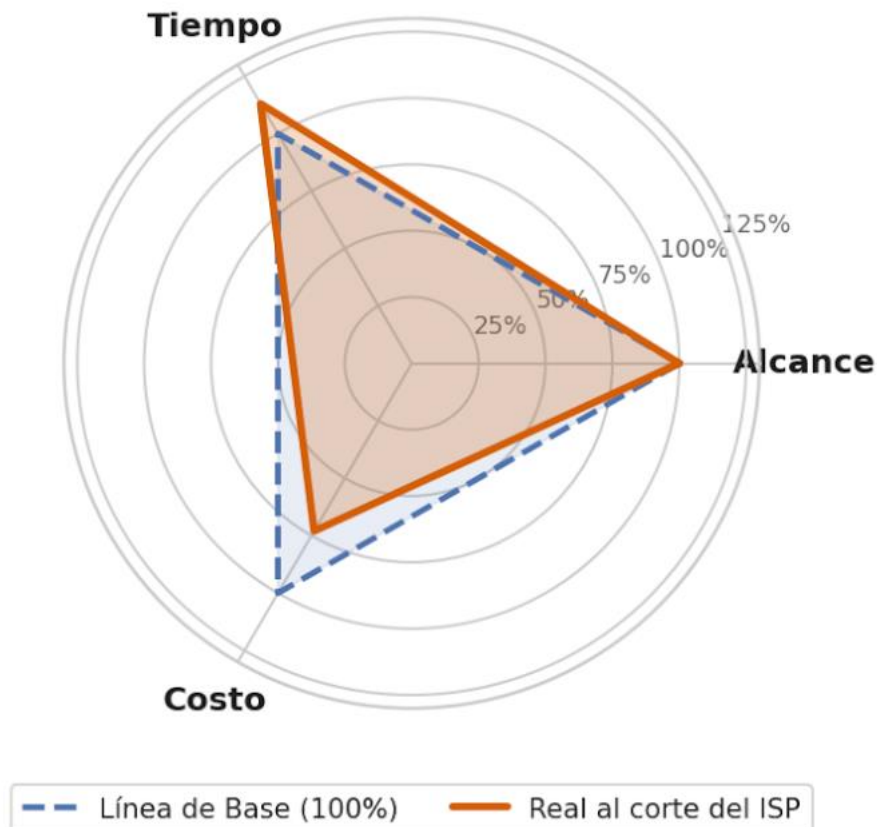GRAFICO. TRIPRE RESTRICCIÓN

Fuente: Elaboración propia

2.2 Avance Objetivos generales y específicos de desarrollo

Objetivo General de Desarrollo 1.1. Incrementar la efectividad del control fiscal de la CGR.

El Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República cumplió su objetivo general de incrementar la efectividad del control fiscal de la CGR, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la incorporación de herramientas avanzadas de analítica de datos, inteligencia artificial, automatización, interoperabilidad y georreferenciación, así como el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la vigilancia y el seguimiento de la gestión fiscal. Los indicadores de medición evidencian el cumplimiento de las metas previstas en la Matriz de Resultados, reflejado en la consolidación de capacidades para generar alertas oportunas, fortalecer el control preventivo y concomitante, mejorar la toma de decisiones basada en datos y ampliar la interacción con la ciudadanía a través de canales digitales.

Indicadores	Frecuen cia de Medida	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Tipo de Acumulad ón	Vigencias								Meta Final	Avance meta Final	Avance porcentual de la meta establecida	Medios de Verificación
						Meta 2022	Avance 2022	Meta 2023	Avance 2023	Meta 2024	Avance 2024	Meta 2025	Avance 2025				
IMPACTO. Incrementar la efectividad del control fiscal de la CGR																	
1.1. Ahorros generados por renovación o cancelación de contratos, los cuales la CGR ha identificado que conllevan un potencial detrimento fiscal.	Anual	Millones USD\$	11,0	2020	Acumulado	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	21,2	1,9	21,2	1,9		Línea de base 2020 más beneficios por los ahorros generados por renovación o cancelación de contratos en 2025. Fuente: Informes generados por DIARI CGR
1.2. Beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante	Anual	Millones USD\$s	217,0	2021	Flujo	235,0	367,3	413,0	385,7	694,4	994,0	1860,4					
					Acumulado	367,3	780,3	1165,9	1860,3								

Fuente:

- DIARI. Alertas generadas por las acciones preventivas y concomitantes.
- Oficina de Planeación. Acciones de seguimientos permanentes incluidos en plan de vigilancia en cada vigencia y el reporte de beneficios en el SIIGEP.

Imagen 1. Proyectos entregados a la comunidad con acompañamiento de la DIARI en seguimiento permanente



Fuente: DIARI-CGR

Más de 140 proyectos fueron entregados a la comunidad gracias a las acciones de control realizadas en tiempo real que advirtieron riesgos y permitieron realizar correcciones oportunas. Esto se traduce en \$7.763.495.084.560 en beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante.

Objetivo Específico de Desarrollo 1.1 Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones.

El objetivo específico de desarrollo 1.1 se cumplió mediante la implementación de iniciativas de transformación digital que fortalecieron la automatización de procesos, la gestión documental electrónica, la gestión por procesos, el gobierno de datos, la interoperabilidad y la identidad digital. Estas capacidades permitieron optimizar actividades institucionales, reducir tareas manuales, estandarizar procesos y mejorar la eficiencia operativa de la Entidad. En este contexto, el indicador "Proporción de tareas automatizadas" evidencia el avance alcanzado en la incorporación de soluciones tecnológicas que incrementan la productividad institucional y respaldan el ejercicio de un control fiscal más ágil, oportuno y basado en información confiable. 2025 se automatizaron un universo de procesos identificado por la Oficina de Sistemas e Informática – OSEI, resultado de dicho trabajo, se relacionan los siguientes

procesos: Gestión de Cobro Coactivo, Búsqueda de Bienes, Proceso Administrativo Sancionatorio y Hojas de Vida de sujetos de control.

Indicador: Proporción de tareas automatizadas.

Indicadores	Frec. de Medida	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Tipo de Acumulación	Metas y avance								Meta Final	Avance meta Final	Avance porcentual de la meta establecida	Medios de Verificación	
						Meta 2022	Avance 2022	Meta 2023	Avance 2023	Meta 2024	Avance 2024	Meta 2025	Avance 2025					
RESULTADO #1: Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones																		
1.1. Proporción de tareas automatizadas	Anual	%	inicial	0,0%	2020	Acumulado	2,0%	1,9%	4,0%	1,4%	6,0%		8,0%		8,0%	1%		Promedio de tareas automatizadas de los procesos priorizados / promedio de tareas totales de los procesos priorizados. Fuente: OSEI CGR
						Flujo		2,0%		2,0%		2,0%		2,0%		2,0%		
			ajust.			Acumulado	2,0%		2,0%	4,0%		6,0%		6,0%		8,0%		


Medio de verificación / fuente: OSEI

Objetivo Específico de Desarrollo 2.1 Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control

El objetivo específico de desarrollo orientado a incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control fiscal, se cumplió mediante la implementación de un conjunto de herramientas digitales que fortalecieron la capacidad analítica y operativa de la Contraloría General de la República para la planeación, seguimiento y ejecución del control fiscal. Entre los principales resultados se destacan la puesta en operación del sistema de seguimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal, la herramienta de georreferenciación, el modelo de control fiscal remoto, el Data Lake institucional, los modelos de analítica de datos, el sistema metabuscador inteligente y la estrategia de ciberseguridad, los cuales permitieron mejorar la identificación de riesgos, la generación de alertas, el análisis masivo de información y la toma de decisiones basada en evidencia.

El fortalecimiento de capacidades analíticas permitió ampliar el ciclo de atención y seguimiento de alertas. Se alcanzó la operación de 49 modelos analíticos fortaleciendo el modelo preventivo y concomitante del control fiscal; de manera adicional se realizó seguimiento sobre 1.802 alertas de un total de 2.125 emitidas. Este comportamiento evidencia consolidación progresiva del modelo de control preventivo soportado en datos y aumento de capacidad institucional para transformar alertas en actuaciones efectivas.

Indicador: Proporción de alertas con seguimiento sobre el total de alertas

Indicadores	Frec. de Medida	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Tipo de Acumulación	Metas y avance								Meta Final	Avance meta Final	Avance porcentual de la meta establecida	Medios de Verificación	
						Meta 2022	Avance 2022	Meta 2023	Avance 2023	Meta 2024	Avance 2024	Meta 2025	Avance 2025					
RESULTADO #2: Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control																		
2.1. Proporción de alertas con seguimiento sobre el total de alertas	Anual	%	≤	25,8%	2020	Acumulado	25,8%	22,7%	28,2%	39,7%	30,8%		33,4%		33,4%	18%	 101%	Número de alertas que cuentan con seguimiento sobre las que se conoce el destino final / número total de alertas emitidas. Fuente: DIARI y OPLA
			Alertas con seg.			481		594		533		194	1802					
			Total alertas	64,9%		519	70,9%	636	77,5%	571	84,1%	399	84,1%	2125				
			Acumulado			92,7%		93,1%		93,2%		84,8%		84,8%				

Fuente: DIARI.

Objetivo Específico de Desarrollo 3.1 Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales.

El objetivo específico de desarrollo 3.1 se cumplió mediante el diseño e implementación de un ecosistema de herramientas y estrategias que fortalecieron la interacción entre la Contraloría General de la República y la ciudadanía. Entre los principales logros se destacan la estrategia de atención, acercamiento y participación ciudadana, el tablero de control de indicadores de género y diversidad, el sistema de trazabilidad de denuncias y requerimientos ciudadanos, la estrategia para promover las veedurías ciudadanas y las acciones de gestión del cambio y formación digital, las cuales ampliaron los mecanismos de participación, mejoraron la trazabilidad de las solicitudes ciudadanas y fortalecieron la transparencia, la inclusión y el control social. El Programa consolidó la digitalización de la relación con la ciudadanía. El resultado se sustentó en fortalecimiento de infraestructura tecnológica, optimización de plataforma web y correo institucional, despliegue de estrategias de divulgación y mejoras operativas para atención. Se reportó que el 97,7% de las solicitudes ciudadanas fueron canalizadas por medios digitales, con más de 28 mil interacciones gestionadas por estos canales.

Indicador: Porcentaje de participación ciudadana canalizada por canales digitales.

Indicadores	Frec. de Medida	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Tipo de Acumulación	Metas y avance								Meta Final	Avance meta Final	Avance porcentual de la meta establecida	Medios de Verificación
						Meta 2022	Avance 2022	Meta 2023	Avance 2023	Meta 2024	Avance 2024	Meta 2025	Avance 2025				
RESULTADO #3: Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales																	
3.1. Porcentaje de participación ciudadana canalizada por canales digitales	Anual	%	37,0%	2020	Flujo	37,0%	87,8%	39,0%	90,0%	43,0%	90,0%	47,0%	93,3%	47,0%	93,3%	199%	Número de requerimientos ciudadanos por canales digitales / total de requerimientos ciudadanos Fuente: Delegada de Participación Ciudadana

Fuente: Contraloría delegada para la Participación Ciudadana. Número de Consultas ciudadanas por Canales Digitales.

2.3 Desempeño del Contrato de Préstamo

El desempeño del Contrato de Préstamo durante su ejecución mostró una evolución favorable en términos del cumplimiento de los productos, la ejecución financiera y el avance de los indicadores de resultado. Entre 2022 y 2023 el Programa concentró sus esfuerzos en la estructuración metodológica, la conformación de capacidades institucionales y el inicio de los principales procesos de contratación. Durante 2024 se consolidó la implementación de las soluciones tecnológicas y se incrementó significativamente la ejecución física y financiera de los componentes, mientras que en 2025 se culminó la implementación de los productos previstos, se consolidó el cumplimiento de las metas de la Matriz de Resultados, se adelantó el proceso de cierre técnico y financiero de la operación y se definió la cancelación parcial de recursos no requeridos, manteniendo el cumplimiento de los objetivos del Programa.

3. Análisis de las Herramientas de Planificación

El programa se soportó en un conjunto de herramientas de planificación y seguimiento integradas, conformadas por el Cronograma Plurianual de Ejecución del Proyecto (PEP), el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA), el Plan Financiero (PF) y la Matriz de Resultados (MR). Estas herramientas fueron complementarias entre sí y permitieron articular la programación técnica, física, contractual y financiera del Programa, garantizando la trazabilidad entre los objetivos de desarrollo, los productos comprometidos, la ejecución presupuestal y el cronograma de implementación.

Cada instrumento cumplió una función específica dentro de la gestión del Programa. El PEP definió la programación estratégica de toda la operación durante su horizonte de ejecución; el POA desagregó anualmente las actividades, metas e hitos necesarios para cumplir dicha programación; el Plan de Adquisiciones estableció la secuencia de los procesos contractuales requeridos para producir los bienes, servicios y consultorías del Programa; el Plan Financiero programó la asignación y utilización de los recursos del préstamo y de la contrapartida, mientras que la Matriz de Resultados constituyó el principal instrumento de monitoreo del desempeño, permitiendo medir


el avance físico y financiero mediante indicadores de impacto, resultado y producto, así como la programación (P), programación acumulada (P(a)) y los pagos efectivos (A).

3.1 Gestión de Adquisiciones

La ejecución de las adquisiciones del Programa evolucionó conforme al avance de su implementación, pasando de la contratación de consultorías para el diseño y fortalecimiento institucional hacia la adquisición de bienes, infraestructura tecnológica y soluciones digitales para la puesta en operación de los productos estratégicos. En términos generales, el Plan de Adquisiciones alcanzó un alto nivel de cumplimiento, con la mayoría de los procesos planificados contratados y ejecutados, permitiendo el desarrollo de las iniciativas previstas en los tres componentes del Programa.

Durante la ejecución se realizaron ajustes al Plan de Adquisiciones para responder a cambios en prioridades institucionales, evolución tecnológica y optimización de recursos, evitando duplicidades con desarrollos financiados por la CGR y priorizando soluciones de mayor valor estratégico. Asimismo, algunos procesos presentaron retrasos derivados de la complejidad técnica de las soluciones, la actualización de requerimientos funcionales y los tiempos propios de los procesos de contratación bajo las políticas del BID, lo que motivó modificaciones contractuales y la extensión del período de desembolsos sin afectar el cumplimiento de los objetivos del Programa.

Gráfico 1. Gestión de las Adquisiciones durante la ejecución del Programa

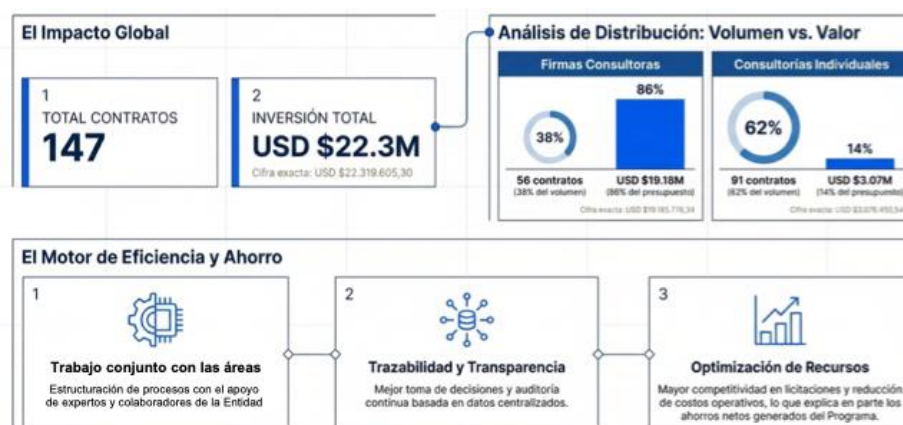

Fuente: Elaboración propia a partir de la información compilada del Programa - (gráfico aportado por NoteBookLM)

3.2 Estado de las evaluaciones del contrato de préstamo

La Evaluación Final y de Impacto del Programa tuvo como objetivo valorar el grado de cumplimiento de los objetivos del Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO, así como los resultados e impactos generados por la intervención. Para ello, se desarrolló una evaluación de carácter mixto, sustentada en la Teoría del Programa y estructurada en tres ámbitos: (i) impacto y resultados, mediante análisis de atribución y comportamiento de indicadores; (ii) análisis económico ex post, para determinar la eficiencia de la inversión y la relación beneficio-costos; y (iii) evaluación del cumplimiento, examinando la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de los productos, la operación y el arreglo institucional. La metodología combinó análisis documental, información físico-financiera, entrevistas semiestructuradas, consultas a actores clave y técnicas cuantitativas, permitiendo triangular la evidencia para sustentar las conclusiones de la evaluación.

Imagen 2. Gestión de las Adquisiciones durante la ejecución del Programa



Fuente: Elaboración propia a partir de la información compilada del Programa (gráfico aportado por NoteBookLM)

4. Lecciones aprendidas, buenas prácticas, hallazgos y recomendaciones

La evaluación final concluyó que el Programa alcanzó un desempeño favorable en términos de relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad. Entre los principales hallazgos se destaca el cumplimiento de los productos estratégicos previstos, la consolidación de capacidades institucionales para el control fiscal basado en datos, la modernización de la infraestructura tecnológica y el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante herramientas digitales. Asimismo, el análisis evidenció una evolución positiva de los indicadores de impacto y de resultado, con incrementos en los beneficios asociados al control preventivo y concomitante y el cumplimiento o superación de las metas establecidas para los indicadores institucionales. Desde la perspectiva económica, los resultados indicaron que, incluso bajo escenarios conservadores de atribución, los beneficios estimados superan ampliamente los costos de implementación, confirmando la conveniencia económica de la inversión. La evaluación también identificó que las diferencias observadas entre la ejecución física y financiera obedecieron principalmente a eficiencias contractuales, ajustes de programación y economías en los procesos de contratación, sin afectar el logro de los productos comprometidos. Como resultado, se recomienda consolidar mecanismos para la sostenibilidad de las soluciones implementadas, fortalecer la apropiación institucional, asegurar recursos para su operación y mantenimiento, y continuar utilizando los modelos analíticos y las herramientas tecnológicas desarrolladas como soporte permanente para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control fiscal.

5. Sostenibilidad

De acuerdo con el documento de memorias institucionales, el Programa presenta condiciones favorables para su sostenibilidad al haber consolidado capacidades institucionales, procesos, herramientas tecnológicas y modelos de gestión que fueron incorporados a la transformación digital de la Contraloría General de la República. Durante su ejecución se adelantaron acciones orientadas a garantizar la continuidad de los beneficios, entre ellas la formulación de la estrategia de transformación digital, el fortalecimiento del gobierno de datos, la estandarización de procesos, el desarrollo

de capacidades institucionales y del talento humano, la implementación de estrategias de gestión del cambio y apropiación tecnológica, el fortalecimiento de la gobernanza mediante el Comité de Gestión del Programa y la definición de un Roadmap con objetivos orientadores para asegurar la operación, el escalamiento de las soluciones, la evolución tecnológica, el monitoreo de resultados y la institucionalización de las capacidades desarrolladas.

De esta manera, los beneficios del Programa continuarán materializándose mediante el uso permanente de las plataformas, modelos analíticos y herramientas implementadas, su articulación con el Plan Estratégico Institucional, la continuidad de las estrategias de transformación digital e integridad y el fortalecimiento progresivo de las capacidades tecnológicas y organizacionales de la Entidad. No obstante, la evaluación final identifica como retos para consolidar esta sostenibilidad la definición de fuentes permanentes de financiación para el mantenimiento y actualización tecnológica, la institucionalización del conocimiento generado y el fortalecimiento de la apropiación por parte del talento humano, aspectos que constituyen la hoja de ruta para preservar y ampliar los resultados alcanzados en el largo plazo.

6. Estado de cláusulas contractuales

Durante el proceso de cierre de gestión del Programa, se realizó una verificación de cumplimiento a cada una de las cláusulas contractuales del Programa, por parte de la especialista en Adquisiciones, logrando un cierre efectivo del 100%.

7. Estado del archivo y gestión documental

El archivo y gestión del Programa se encuentra organizado, toda la información del Programa se encuentra contenida en: [1 INFORMACIÓN BID 5385](#)

8. Historias de Campo, Registro Fotográfico y Registro audiovisual

