



## PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO

Objeto: Realizar la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO

### PRODUCTO III. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2026



#### Contáctenos

📍 Cl. 94a # 13-59 - Piso 5to  
📍 Bogotá-Colombia

☎ +57 601 6237717  
🌐 [www.econometria.com](http://www.econometria.com)

QR - Portafolio  
de servicios

Conoce nuestro  
portafolio de servicios



|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                          | 4  |
| 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL PROGRAMA.....                                           | 5  |
| 1.1. Aproximación al objeto de evaluación .....                                             | 5  |
| 1.1.1. Actores e instancias clave.....                                                      | 7  |
| ➤ Actores principales del Programa .....                                                    | 8  |
| ➤ Actores e instancias con rol de seguimiento y evaluación .....                            | 9  |
| ➤ Actores pertenecientes a la estructura organizacional de la CGR .....                     | 10 |
| 1.2. Teoría de Cambio del Programa .....                                                    | 12 |
| 1.3. Análisis de las recomendaciones de la evaluación intermedia .....                      | 22 |
| 2. METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN .....                                             | 25 |
| 2.1. Alcance de la evaluación final .....                                                   | 26 |
| 2.2. Ámbito evaluativo: impacto y resultados (análisis atribución) .....                    | 30 |
| 2.3. Ámbito evaluativo: análisis económico ex - post.....                                   | 31 |
| 2.4. Ámbito evaluativo: cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional).....   | 33 |
| 2.5. Organización y tratamiento de información: matriz de consistencia y triangulación..... | 39 |
| 3. RESULTADOS POR ÁMBITO EVALUATIVO.....                                                    | 40 |
| 3.1. Ámbito evaluativo: impacto y resultados del Programa .....                             | 40 |
| ➤ Impacto del Programa .....                                                                | 40 |
| ➤ Resultados del Programa .....                                                             | 44 |
| ➤ Conclusiones.....                                                                         | 47 |
| 3.2. Ámbito evaluativo: análisis económico ex – post del Programa.....                      | 47 |
| ➤ Conclusiones.....                                                                         | 51 |
| 3.3. Ámbito evaluativo: cumplimiento .....                                                  | 53 |
| 3.3.1. Análisis de relevancia .....                                                         | 53 |
| ➤ Diseño del Programa (lógica vertical) .....                                               | 53 |
| ➤ Arreglo institucional y alineación con la misión de la CGR.....                           | 56 |
| ➤ Conclusiones.....                                                                         | 59 |
| 3.3.2. Análisis de efectividad .....                                                        | 60 |
| ➤ Cumplimiento de productos y avance físico.....                                            | 60 |
| ➤ Ejecución presupuestal y avance .....                                                     | 63 |
| ➤ Apropiación institucional de productos y desarrollos estratégicos.....                    | 67 |
| ➤ Restricciones, cuellos de botella y ajustes en la implementación .....                    | 69 |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ➤ Plan de adquisiciones, contratación y soporte fiduciario .....                             | 70 |
| ➤ Control interno, financiero y contable del Programa .....                                  | 72 |
| ➤ Conclusiones.....                                                                          | 73 |
| 3.3.3. Análisis de sostenibilidad .....                                                      | 74 |
| ➤ Análisis de riesgos .....                                                                  | 74 |
| ➤ Análisis de sostenibilidad: institucional, financiero, tecnológico y capital humano .....  | 76 |
| ○ Condiciones institucionales .....                                                          | 76 |
| ○ Condiciones tecnológicas .....                                                             | 77 |
| ○ Condiciones financieras .....                                                              | 78 |
| ○ Condiciones en relación con el capital humano .....                                        | 78 |
| ➤ Conclusiones.....                                                                          | 78 |
| 4. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES .....                                              | 79 |
| 4.1. Lecciones aprendidas .....                                                              | 79 |
| 4.1.1. Buenas prácticas .....                                                                | 80 |
| 4.1.2. Aspectos por mejorar .....                                                            | 81 |
| 4.2. Recomendaciones .....                                                                   | 82 |
| DOCUMENTOS CONSULTADOS .....                                                                 | 84 |
| Anexo 1. LISTADO DE Reuniones del Comité de Gestión del Programa.....                        | 87 |
| Anexo 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS (adjunto en archivo comprimido) ..... | 95 |

## Tablas e ilustraciones

|                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Distribución Presupuestal por Componentes del Programa para la Transformación Digital de la CGR .....                                                                            | 6  |
| Tabla 2. Relación entre los ámbitos evaluativos, y métodos de evaluación y criterios técnicos asociados a la evaluación final del Programa para la Transformación Digital de la CGR ..... | 27 |
| Tabla 3. Productos del Programa seleccionados para análisis detallado .....                                                                                                               | 36 |
| Tabla 4. Ficha técnica de indicador de producto .....                                                                                                                                     | 37 |
| Tabla 5. Resultados del modelo antes y después sin tendencia .....                                                                                                                        | 42 |
| Tabla 6. Resultados modelo de intensidad de tratamiento .....                                                                                                                             | 43 |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 7. Resultados del modelo antes y después – resultados del Programa .....                                                                                                               | 45 |
| Tabla 8. Resultados del modelo de intensidad de tratamiento - resultados del Programa .....                                                                                                  | 46 |
| Tabla 9. Resumen de parámetros usados .....                                                                                                                                                  | 49 |
| Tabla 10. Resumen del ejercicio de beneficios económicos bajo 3 escenarios .....                                                                                                             | 51 |
| Tabla 11. Nivel de cumplimiento físico acumulado del Programa .....                                                                                                                          | 61 |
| Tabla 12. Paralelo de avance físico y financiero por componentes del Programa .....                                                                                                          | 66 |
| Tabla 13. Avance físico y financiero por producto del Programa .....                                                                                                                         | 67 |
| Tabla 14. Riesgos vigentes al cierre del Programa .....                                                                                                                                      | 74 |
| <br>Ilustración 1. Teoría de Cambio del Programa para la Transformación Digital de la CGR.....                                                                                               | 21 |
| Ilustración 2. Integración del abordaje técnico, conceptual y metodológico para el desarrollo de la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR..... | 29 |
| Ilustración 3. Beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante .....                                                                              | 41 |
| Ilustración 4. Comportamiento de los indicadores de resultado del Programa .....                                                                                                             | 45 |
| Ilustración 5. Ejecución física acumulada del Programa – vigencias .....                                                                                                                     | 61 |
| Ilustración 6. Avance físico presupuestal del Programa – vigencias.....                                                                                                                      | 64 |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el **Producto 3. Informe de la evaluación final y de impacto** asociado a la **EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO DEL PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/OC-CO**. Para el desarrollo de este producto fueron considerados los Términos de Referencia (TdR) establecidos por la Contraloría General de la República (CGR) en la Solicitud de Propuesta (SP) No. CGR- 216-SCC/CO-L1266-P00147 (CGR, 2026), así como la propuesta técnica presentada para el desarrollo de la evaluación por parte de Econometría Consultores.

En este contexto adicional a esta introducción el producto está integrado en cuatro secciones:

**Sección 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL PROGRAMA:** en esta sección se realiza una aproximación al Programa para la Transformación Digital de la CGR, considerando sus contenidos, actores e instancia principales; posteriormente se presenta la Teoría de Cambio (TdC) del Programa que se basa en su cadena de valor, sobre dicha cadena se plantean supuestos y una hipótesis central que guían el análisis evaluativo.

**Sección 2. METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN:** en este apartado se presentan los elementos metodológicos que fueron empleados para el desarrollo de la evaluación final y de impacto, siguiendo los parámetros técnicos fijados en lo TdR, el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) del Programa. En esa línea se expone el alcance de evaluación y, en función de ello, los métodos, incluyendo fuentes y procesamiento de información abordado para cada uno de los tres ámbitos evaluativos: i) impacto y resultados; ii) análisis económico ex post; y iii) cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional).

**Sección 3. RESULTADOS POR ÁMBITO EVALUATIVO:** en esta sección se exponen los resultados y conclusiones asociados a cada uno de los ámbitos de la evaluación: i) impacto y resultados; ii) análisis económico ex post; y iii) cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional).

**Sección 4. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES:** se detallan las lecciones aprendidas identificadas como parte del presente ejercicio evaluativo, y se plantean recomendaciones soportadas en los hechos destacados en la sección previa.

Como parte de este producto se anexan los siguientes documentos:

**Anexo 1. LISTADO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA**

**Anexo 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS**

Cabe señalar que este producto recoge y se soporta en los elementos sustantivos, tanto metodológicos como técnicos, desarrollados y presentados en los productos anteriores de la presente evaluación.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL PROGRAMA

En esta sección se realiza una aproximación al objeto de evaluación, es decir el Programa para la Transformación Digital de la CGR, considerando sus contenidos, actores e instancia principales; posteriormente se presenta la Teoría de Cambio (TdC) del Programa que se basa en su cadena de valor, sobre esta se plantean supuestos y una hipótesis central que guían el análisis evaluativo.

### 1.1. Aproximación al objeto de evaluación

En 2021 el Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República (CGR) surge como respuesta a un desafío institucional de carácter estructural: fortalecer la efectividad del control fiscal en un contexto marcado por la ampliación de competencias de la entidad, mayores exigencias de vigilancia preventiva y constante, persistencia de brechas en productividad, necesidad de automatización de procesos, uso estratégico de datos, interoperabilidad y relacionamiento con la ciudadanía. En esa lógica, el Programa fue concebido como una intervención de fortalecimiento institucional apoyada por el BID, orientada no solo a incorporar herramientas tecnológicas, sino a transformar capacidades, procesos y mecanismos de gestión para mejorar el desempeño de la entidad en el cumplimiento de su misión.

En este contexto, se definió como objetivo general incrementar la efectividad del control fiscal de la CGR, a partir de tres objetivos específicos: i) incrementar la productividad de la entidad en el cumplimiento de sus funciones; ii) fortalecer la eficacia del ejercicio del control fiscal; y iii) ampliar las oportunidades de participación ciudadana por canales digitales. Estos objetivos se materializan a través de cuatro componentes:

**Componente 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital:** Este componente busca mejorar la productividad de la CGR mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la transformación digital, a través del diseño e implementación de una estrategia de transformación digital, un modelo de gobierno y tratamiento de datos, estándares acordes con las nuevas competencias de la entidad, mecanismos de automatización de procesos, interoperabilidad con actores externos y un modelo de riesgos enfocado en el control fiscal.

**Componente 2. Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal:** Este componente busca incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control fiscal mediante la incorporación y fortalecimiento de herramientas digitales, incluyendo sistemas de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del ciclo de control fiscal, herramientas de georreferenciación, mecanismos de control fiscal remoto, modelos de analítica y big data, fortalecimiento de infraestructura y servicios TIC y una estrategia de ciberseguridad.

**Componente 3. Enfoque ciudadano e integridad:** Este componente busca incrementar las oportunidades de participación ciudadana y fortalecer la integridad en el ciclo de control fiscal, mediante estrategias de atención, acercamiento y participación ciudadana con enfoque

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

diferencial, trazabilidad de denuncias y requerimientos, promoción de veedurías, fortalecimiento de la integridad institucional y acciones de gestión del cambio orientadas a la apropiación de capacidades digitales.

**Componente 4. Capacidad Institucional y Mecanismo de Ejecución:** Este componente está orientado a asegurar la adecuada gestión operativa, administrativa, financiera, de seguimiento y control del Programa, de modo que se cuente con las capacidades, recursos y mecanismos necesarios para su funcionamiento, monitoreo y ejecución integral. En el marco de la presente evaluación, este componente puede entenderse como la dimensión asociada a la capacidad institucional y al mecanismo de ejecución que soportan la operación.

El crédito aprobado por el BID para el financiamiento de este programa asciende a los US\$30 millones con un plazo de amortización de 24 años y un periodo de gracia de seis años y medio. Como se detalla en la siguiente tabla, el financiamiento del programa se divide en 4 componentes distribuido de la siguiente manera:

**Tabla 1. Distribución Presupuestal por Componentes del Programa para la Transformación Digital de la CGR**

| No.          | Componente                                                                    | Presupuesto USD\$   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital | \$ 7.982.606        |
| 2            | Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal          | \$15.755.688        |
| 3            | Enfoque ciudadano e integridad                                                | \$4.000.000         |
| 4            | Gastos de administración del Programa                                         | \$2.261.706         |
| <b>Total</b> |                                                                               | <b>\$30.000.000</b> |

Fuente: elaboración propia considerando Términos de Referencia – TdR (CGR, 2026)

En 2025 se llevó a cabo la Evaluación de Medio Término (EMT) del Programa, cuyos resultados y recomendaciones constituyen un referente clave para actualizar la lectura actualizada sobre la implementación y el estado de la operación, resultados e impacto de la intervención. En este contexto, la EMT concluyó que el Programa mantenía una alta pertinencia frente a las necesidades institucionales de la CGR y una alineación clara con sus prioridades estratégicas; sin embargo, también identificó retos relevantes asociados a la articulación entre componentes, la consistencia entre avance físico y presupuestal, la estabilidad del plan de adquisiciones, el posible impacto en el fortalecimiento de capacidades institucionales transversales, la robustez del sistema de seguimiento y evaluación y las condiciones de sostenibilidad de los desarrollos impulsados.

Estos hallazgos muestran que el análisis del Programa debe trascender el cumplimiento formal de productos y considerar también sus posibles impactos sostenibles en la capacidad de institucionalización, coordinación interna más allá de la ejecución contractual.

Esta lectura se complementa con la información de seguimiento más reciente. El reporte público del BID correspondiente al primer semestre de 2025 indica, para ese momento, una ejecución desembolsada del 54.9% de los recursos del préstamo, lo que sugiere que para este momento, la presente evaluación se sitúa en una fase avanzada del ciclo de implementación. Así, el objeto

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

evaluativo corresponde a un Programa con trayectoria suficiente de ejecución, cuyos logros, restricciones y aprendizajes pueden ser examinados desde una lógica de impacto y consolidación institucional.

### 1.1.1. Actores e instancias clave

En el contexto de la evaluación final y de impacto, la identificación de actores es relevante, dado que constituye un insumo analítico fundamental para comprender la lógica de implementación de la operación, las condiciones de logro de sus resultados y las posibilidades de sostenibilidad de los desarrollos alcanzados, desde la perspectiva de los sujetos asociados al Programa.

Ello bajo el entendimiento de que usualmente los resultados no dependen exclusivamente de la producción de bienes o herramientas tecnológicas, sino de la capacidad del arreglo institucional para articular funciones de dirección estratégica, gestión operativa, soporte técnico, control fiduciario, monitoreo, generación de evidencia y apropiación organizacional. Por ello, el análisis de actores no se limita a una enumeración de dependencias, sino que permite reconocer cómo se distribuyen las responsabilidades en el ciclo de gestión del Programa y en qué puntos de esa estructura se concentran decisiones, capacidades, cuellos de botella y riesgos para su consolidación.

La arquitectura institucional del Programa está definida por el Contrato de Préstamo, el CONPES 4045, el Reglamento Operativo, y los instrumentos de seguimiento y evaluación. Este esquema combina actores de distintos niveles, tipologías y funciones: unos con funciones de dirección y coordinación de la operación; otros con responsabilidades especializadas en planeación, adquisiciones, finanzas, tecnología, control interno y producción de información; y otros con funciones de seguimiento externo, auditoría, articulación interinstitucional e interoperabilidad.

Esta diferenciación resulta especialmente importante para la evaluación final y de impacto, en tanto permite evaluar perspectivas diferenciales y valorar no solo el grado de cumplimiento de los productos y resultados, sino también la calidad de la operación del Programa, su coordinación intra e interinstitucional, la institucionalización de sus acciones y las condiciones asegurarían la sostenibilidad de los avances logrados.

En consecuencia, es relevante considerar desde una perspectiva integral los actores y instancias clave que han incidido en la ejecución del Programa, siendo necesario priorizar algunos de estos para ser consultados en el marco de la presente evaluación. Como un ejercicio exploratorio se clasifican los actores e instancias en las siguientes cuatro tipologías: **i) actores principales del Programa; ii) actores con rol de seguimiento y evaluación; iii) actores pertenecientes a la estructura organizacional de la CGR; y iv) actores externos que apoyan la ejecución de los componentes.**<sup>1</sup> Esta clasificación permite un abordaje ordenado del arreglo institucional y facilitará la delimitación de fuentes, instrumentos y mecanismos de consulta para la evaluación.

<sup>1</sup> Información tomada del Producto 1 de la EMT y complementada con el informe final de la misma.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

### ➤ Actores principales del Programa

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Es la entidad financiadora del Programa y el principal referente técnico en materia de supervisión, monitoreo y evaluación de la operación de crédito. Su papel es central en la validación de reportes de avance, en el seguimiento al cumplimiento del préstamo y en la definición del marco general de la evaluación final e impacto. El reporte público del primer semestre de 2025 ratifica la vigencia de esta función y la continuidad del acompañamiento del Banco sobre la operación CO-L1266.

- Contraloría General de la República (CGR)

Actúa como organismo ejecutor (OE) del Programa, de conformidad con el Contrato de Préstamo. En esta condición, concentra la responsabilidad por la implementación de los componentes, la administración de la operación y la apropiación institucional de los desarrollos impulsados. La evaluación final debe valorar precisamente hasta qué punto los productos y resultados logrados fueron incorporados a la dinámica institucional de la entidad y contribuyeron al fortalecimiento de su función de control fiscal.

- Contralor General de la República

Ejerce el liderazgo general del Programa en su nivel estratégico. Su papel es relevante en la medida en que vincula la conducción institucional de la CGR con las prioridades de la operación y orienta la toma de decisiones de alto nivel requeridas para la transformación digital.

- Vicecontralor

En el desarrollo del Programa, el Vicecontralor tuvo un rol relevante en etapas previas de su gobernanza. De acuerdo con la Evaluación de Medio Término, en 2023 le fueron asignadas transitoriamente funciones de Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa, hasta la designación formal del titular de esa gerencia. No obstante, con la modificación introducida por la Resolución Organizacional OGZ-0868 de 18 de octubre de 2024, el Vicecontralor ya no aparece como integrante expreso del Comité de Gestión del Programa.

- Comité de Gestión del Programa (CGP)

Es la principal instancia de gobernanza del Programa. De acuerdo con la Resolución Organizacional OGZ-0868 de 18 de octubre de 2024, su composición vigente incluye al Contralor General de la República o su delegado, al Director adscrito al Despacho del Contralor General o su delegado, al Director de la Oficina de Planeación o su delegado, al Director de la Oficina de Sistemas e Informática o su delegado, al Gerente Administrativo y Financiero o su delegado y al Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa. La resolución también establece que el Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa tendrá voz, pero no voto; que podrán ser invitados otros directivos cuando se considere necesario; y que el Jefe de la Unidad de Análisis de la Información de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata será invitado permanente.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- **Unidad Ejecutora del Programa (UEP)**

Es la instancia operativa central del Programa. Tiene a su cargo la coordinación cotidiana de la ejecución, la interlocución con el BID, la consolidación de reportes, el seguimiento técnico y financiero y la secretaría técnica del CGP. Es un actor crítico para la evaluación final, pues articula información sobre avances, adquisiciones, monitoreo, riesgos y gestión general de la operación.

- **Gerencia del Programa**

Cumple una función de conducción operativa y de articulación entre la alta dirección, la UEP y las distintas áreas de la CGR. El informe final de la EMT resalta su papel en la comunicación permanente con las áreas de la entidad y en la preparación de decisiones para el Comité de Gestión.

- **Especialista financiero**

Responsable del seguimiento financiero de la operación, del soporte a la ejecución presupuestal y del cumplimiento de procedimientos fiduciarios y de reporte financiero. Su rol es central para valorar el manejo de recursos, las justificaciones de gasto y la coherencia entre ejecución financiera y avance del Programa.

- **Especialista en adquisiciones**

Encargado del componente de contratación y adquisiciones del Programa. Su papel es particularmente importante a la luz de la EMT, que identificó el plan de adquisiciones como un frente crítico para comprender ajustes, retrasos y condiciones de implementación de la operación.

- **Especialista en planeación y monitoreo**

Tiene un rol central en la consolidación de información de seguimiento, en la producción de reportes y en el enlace entre la ejecución del Programa y sus indicadores de resultado e impacto. Es un actor determinante para la trazabilidad entre planificación, monitoreo y evidencia del desempeño del Programa.

- **Especialista en tecnologías de la información**

Aporta soporte técnico a los desarrollos digitales del Programa y a la interlocución con las áreas de sistemas y tecnología de la CGR. Su papel es clave en una operación cuyo núcleo sustantivo está ligado a herramientas digitales, infraestructura, automatización y analítica.

➤ **Actores e instancias con rol de seguimiento y evaluación**

- **Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Subdirección de Crédito**

Cumple funciones de seguimiento a la ejecución del Programa en el marco de la operación de crédito. Su papel se vincula al monitoreo del cumplimiento de compromisos del préstamo y a la supervisión institucional del financiamiento externo.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

Participa en las acciones de seguimiento de la operación, dada su relación con la gestión del crédito y la ejecución general del financiamiento. Su rol es relevante para comprender el entorno institucional y financiero del Programa.

- **Audidores externos y evaluadores del Programa**

Corresponden a los terceros independientes previstos en la operación para realizar funciones de verificación, control y valoración externa del Programa. En este grupo se incluyen, por una parte, los auditores externos encargados de las auditorías financieras del préstamo, en los términos previstos contractualmente, y, por otra, los evaluadores responsables de desarrollar la evaluación de medio término y la evaluación final e impacto.

- **UEP como instancia de monitoreo operativo**

Además de su función ejecutora, la UEP también cumple un rol específico en el seguimiento del Programa al presentar informes semestrales de progreso, consolidar datos de la Matriz de Resultados y articular la información que alimenta el PME y el PMR. En ese sentido, también forma parte del sistema de seguimiento de la operación.

➤ **Actores pertenecientes a la estructura organizacional de la CGR**

- **Despacho del Contralor General de la República**

Cumple un papel relevante en la conducción de alto nivel del Programa. De acuerdo con la modificación introducida en 2024 a la composición del Comité de Gestión del Programa, el Director adscrito al Despacho del Contralor General o su delegado integra esta instancia. Su participación refuerza la articulación entre las decisiones estratégicas de la alta dirección y el seguimiento a la ejecución institucional, financiera, contractual y programática del Programa.

- **Unidad de Servicios y Aplicaciones Tecnológicas de la Información (USATI)**

Es un actor técnico clave para la implementación y sostenimiento de los desarrollos tecnológicos del Programa. Su papel resulta especialmente relevante en productos asociados a automatización de procesos, interoperabilidad, expediente electrónico, infraestructura tecnológica, servicios digitales y ciberseguridad. Su inclusión permite precisar mejor la apropiación, uso y sostenibilidad de los productos del componente tecnológico.

- **Despacho del Vicecontralor**

Además de participar en la gobernanza del Programa, interviene en la implementación de productos asociados al fortalecimiento del control fiscal. Su función resulta relevante por su capacidad de articulación entre conducción institucional y operación misional.

- **Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI)**

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Es una de las áreas más importantes para la generación de información del Programa. Participa en la implementación de productos de los Componentes 1 y 2 y produce insumos clave para la medición de indicadores de resultado e impacto vinculados al control preventivo y concomitante.

- Oficina de Sistemas e Informática

Cumple un papel sustantivo en la implementación de productos tecnológicos y en el reporte de avances relacionados con automatización de procesos y desarrollos digitales. Además, participa en el CGP, lo que refuerza su rol estratégico y técnico dentro del Programa.

- Oficina de Planeación

Es una dependencia clave para el seguimiento del Programa. Produce y consolida información para indicadores, participa en la implementación de productos y cumple un papel articulador entre planeación institucional, monitoreo y reporte de avances. Su importancia es transversal a la ejecución y a la evaluación final.

- Líder del Macroproceso de Control Fiscal Micro

Corresponde al ámbito funcional vinculado al seguimiento de alertas y a otras actividades asociadas al componente de eficacia del control fiscal. Para efectos del Programa, su relevancia radica en la provisión de información y evidencia para el análisis de resultados, particularmente en lo relativo al seguimiento de alertas. Dado que durante la vigencia del Programa el liderazgo de este macroproceso ha recaído en distintas dependencias, el actor relevante para la evaluación debe entenderse como el líder del Macroproceso de Control Fiscal Micro en cada periodo, y no como una delegada única y permanente.

- Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (CDPC)

Cumple un papel central en el componente de participación ciudadana y suministra, junto con Planeación, información sobre requerimientos ciudadanos canalizados por medios digitales. Es un actor sustantivo para valorar resultados del Componente 3 y la relación entre transformación digital y apertura institucional.

- Gerencia Administrativa y Financiera

Cumple funciones vinculadas a la ordenación del gasto y al soporte administrativo de la operación. Además, integra el CGP, lo que refuerza su importancia en la gestión del Programa.

- Dirección de Contratación (DC)

Su papel se asocia a la gestión contractual y de adquisiciones, aspecto identificado por la EMT como un frente crítico de análisis para la implementación. Su inclusión permite capturar mejor la dimensión operativa del Programa.

- Dirección Financiera (DF)

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Aparece en el informe final de la EMT como una dependencia relevante para la comprensión de la capacidad institucional y la estructura de soporte financiero del Programa. Su incorporación ayuda a precisar la dimensión financiera del arreglo institucional.

- Dirección de Gestión Documental (DGD)

También identificada en el informe final de la EMT, resulta relevante para valorar la trazabilidad documental, la gestión de información y la incorporación institucional de desarrollos relacionados con expedientes, documentos y flujos de información.

## 1.2. Teoría de Cambio del Programa

En seguida se presenta la Teoría de Cambio (TdC) del Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República (CGR); dicha teoría se basa en la cadena de valor del Programa sobre la cual se plantean supuestos y una hipótesis central que guían el análisis evaluativo. Se trata, en este sentido, de asegurar la comprensión de la interrelación de los componentes que conforman el Programa, así como su lógica de intervención, ello como soporte técnico de esta evaluación.

En este contexto se asume que la cadena de valor muestra “la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total” (DNP, 2019). Los procesos de esta cadena se presentan bajo la lógica del ciclo Deming de Mejora Continua o ciclo PHVA: Planear, Hacer (o ejecutar), Verificar y Actuar y cumplen el propósito de contextualizar el Programa en el contexto institucional de la CGR. Estos procesos se evaluarán bajo dos características: una, su capacidad de transformar insumos en productos y dos, su alineación con el modelo de operación por procesos de la entidad. Esto facilita que los criterios que se aplican en esta evaluación final se ejecuten en un análisis comparado entre el Programa y la gestión de la CGR.

En adición a los insumos, procesos y productos, la cadena de valor también detalla los resultados que se espera lograr, los cuales se analizan en función tanto de lo que se plantea como objetivo, como de la contribución de los productos a estos. Finalmente se incluyen los impactos a lograr, a los cuales se llega a partir de los productos y situaciones contextuales.

La cadena de valor parte de la declaración del objetivo del Programa, el cual busca: *aumentar la productividad de la entidad, implementando herramientas digitales de monitoreo y evaluación del control fiscal, además de un mapa georreferenciado que facilita la adopción de decisiones más informadas. Asimismo, el proyecto apunta a desarrollar un modelo de análisis de datos que permita desagregar información por género y poblaciones indígenas, afrocolombianas y diversas, fortaleciendo así la capacidad de la CGR para ejercer un control más inclusivo y efectivo. Finalmente, el proyecto busca apoyar el cierre de brechas de género y diversidad, así como la adopción de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).* (BID, 2021a).

- Insumos

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Este objetivo determina los insumos que serán transformados y que, para los efectos del Programa, se clasifican en financieros, normativos, técnicos, de información y en relación con el mecanismo de ejecución establecido por el ROP. El talento humano, más que insumo, es un componente transversal a la cadena de valor. Son insumos del Programa:

- Financieros: Crédito por un valor de US\$30 millones. Tiene un plazo de amortización de 24 años y un período de gracia de seis años y medio. Esto se debe cumplir en una vigencia de cuatro años, del 13 de diciembre de 2021 al 12 de diciembre de 2025. Complementarios, se consideran los recursos de inversión y gasto de funcionamiento de la CGR de las vigencias 2022 a 2025.
- Normativos:
  - o Resolución Organizacional OGZ-0792-2021 de 2021 que crea el Comité de gestión del programa y se conforma la Unidad Ejecutora. Se modificó con la Resolución Organizacional OGZ – 0820 - 2023 de 2023.
  - o Decreto Ley 267 de 2000, dicta normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y demás normativa que de este se desprende.
  - o Acto Legislativo 04 de 2019, que reforma el control fiscal.
  - o Documento CONPES 4045 de 2021 que dio Concepto favorable para contratar esta operación de crédito.
  - o Normograma del Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI) de la CGR.
- Técnicos: para este caso, se considerandos conjuntos. Uno relacionado con los mecanismos de operación del Programa que define el BID y que se traducen en el Contrato del Préstamo y el ROP y sus derivados a los que se suman la Matriz de Resultados, el Plan de Monitoreo y Evaluación, el plan de adquisiciones, el plan financiero, el plan de ejecución plurianual y los planes operativos anuales. Un segundo conjunto se refiere a lo que define la entidad a través del Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI).
- De información básicos para la implementación y seguimiento del Programa:
  - o Ejecución Presupuestal Agregada SIIF por semestre y vigencia.
  - o Reporte de pagos con recursos de destinación específica SIIF.
  - o Reporte OPS 1 BID - Reporte Movimiento cuentas Bancarias Tesorería SIIF - Relación desembolsos y justificaciones UEP.
  - o Informes generados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, así como alertas generadas por las acciones preventivas y concomitantes.
  - o Acciones de seguimiento incluidos en plan de vigilancia en cada vigencia y el reporte de beneficios en el SIIGEP elaborados por la Oficina de Planeación.
  - o Datos de sistematización de procesos elaborados por la Oficina de Sistemas e Informática (OSEI) de la CGR.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- Datos sobre participación ciudadana por canales digitales de la CGR producidos por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
- Mecanismo de ejecución y gobernanza: el ROP ha definido un marco institucional y esquema de ejecución que opera a través de recursos de Crédito y con recursos institucionales, lo cual, desde este Reglamento, vela por una articulación efectiva. Con recursos del Crédito operan la Unidad Ejecutora del Programa que cuenta con una Gerencia del Programa y especialistas en temas financiero, planeación y monitoreo, adquisiciones y tecnologías de la información. También se constituyen para la gobernanza del Programa el Comité de Gestión del Programa que se creó con la Resolución Organizacional OGZ-0792-2021 de 2021, además de constituir la Unidad Ejecutora. Esta resolución se modificó con la Resolución Organizacional OGZ – 0820 - 2023 de 2023.

Conforman el Comité de Gestión del Programa el Contralor General de la República o su delegado, el Vicecontralor o su delegado, el Director de la Oficina de Planeación o su delegado, el Director de la Oficina de Sistemas de Informática o su delegado, el Gerente Administrativo y Financiero o su delegado y el Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa.

La coordinación técnica de las áreas de la CGR la ejerce el despacho del Vicecontralor. Interactúan para la gestión del Programa:

- La Gerencia Administrativa y Financiera a través de la Dirección Financiera, quien interactúa con el Especialista Financiero para temas contables, de tesorería y financieros; la Dirección de Contratación que interactúa con el Especialista en Adquisiciones para temas de gestión contractual; la Dirección de Gestión Documental para el archivo, guarda y custodia de contratos y de los demás elementos documentales en relación con la planeación, el seguimiento, la evaluación, auditorías internas y externas y misiones del BID para supervisión y acompañamiento.
  - La Oficina de Planeación para temas de planeación presupuestal y seguimiento y evaluación.
  - La Oficina de Sistemas e Informática.
  - Las Contralorías Delegadas relacionadas con los componentes del Programa.
- **Procesos**

Los procesos, como se citó, se refieren a la planeación, la ejecución y el seguimiento y la evaluación. En la planeación, y en el entendido que el Programa se ha diseñado para que sea pertinente a las necesidades de la CGR, se ejecutan las siguientes acciones:

- Concertar y emitir lineamientos institucionales para la implementación del Programa, acorde con los objetivos de la gestión estratégica de la entidad. Se revisa primordialmente que el desarrollo de los componentes del Programa sea complementario a las decisiones que se toman en el marco del Plan Estratégico, que para el caso aplica el actual 2022 – 2026. Como

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

se parte de la evaluación de medio término, no se revisa la alineación con el Plan Estratégico de la CGR para el periodo 2018 – 2022.

- Vincular la planeación del Programa a las decisiones que se deben tomar en el marco del Comité de Gestión del Programa (CGP) que en particular debe estudiar y revisar los requerimientos financieros y adoptar las medidas necesarias para propender por la adecuada implementación y sostenibilidad de los productos (BID, 2021).
- Formular y adelantar las revisiones para efectos de actualización del Plan de ejecución plurianual del Programa (PEP), de los Planes Operativos Anuales (POA), del Plan de Adquisiciones (PA) y del Plan Financiero (PF).
- Revisar lo estipulado en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) con el fin de establecer el estado de cumplimiento de hitos, productos y metas.

La ejecución se centra en la gestión contractual que requieren los tres componentes del Programa, en la cual participan activamente las áreas de apoyo de la CGR. Los tres componentes, se describen a continuación:

- Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital, el cual comprende:
  - Diseño e implementación de la estrategia de transformación digital.
  - Diseño e implementación de un modelo de gobierno de datos, y la definición de estándares en función de las nuevas competencias, que permitirán la desagregación por género y poblaciones diversas (pueblos indígenas, afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas) con el fin de fortalecer las bases de datos para conocer mejor las necesidades de la población y atenderlas con enfoque inclusivo.
  - Diseño e implementación de un modelo semántico asociado a los datos y la información.
  - Fortalecimiento de la capacidad de gestión por procesos.
  - Implementación de la automatización de procesos.
  - Desarrollo de una estrategia de interoperabilidad con actores externos, como por ejemplo los sujetos de control y entidades como la Agencia Nacional de Contratación Pública, Ministerio de
  - Diseño e implementación del modelo de riesgos en el control fiscal.
  - Implementación del modelo de gestión y ciclo de vida de la identidad digital y de los certificados electrónicos.
  - Diseño e implementación del modelo de gestión de derechos digitales.
- Fortalecimiento de herramientas digitales para el control fiscal, el cual comprende:
  - Implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del ciclo de control fiscal para la adopción de decisiones.
  - Desarrollo del mapa georreferenciado de control fiscal.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- Implementación de mecanismos de Control Fiscal Remoto.
  - Diseño de una metodología para establecer líneas de trabajo en la gestión de información y analítica de datos.
  - Fortalecimiento de los procesos de analítica para la vigilancia y el control fiscal preventivo y concomitante.
  - Diseño e implementación de un modelo de Data Lake basado en Big Data.
  - Implementación de un metabuscador basado en procesamiento de lenguaje natural.
  - Fortalecimiento de la gestión, infraestructura y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un enfoque de eficiencia energética y reducción de emisiones.
  - Diseño e implementación de una estrategia de ciberseguridad.
- Enfoque ciudadano e integridad, el cual comprende:
- Diseño e implementación de una estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidades identificadas.
  - Diseño e implementación de una herramienta gerencial de tablero de control con indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) para conocer mejor las necesidades de la población con enfoque inclusivo.
  - Diseño e implementación de un sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos.
  - Apoyo a la implementación de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5.
  - Diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento del control de integridad.
  - Diseño e implementación de una estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas.
  - Diseño e implementación de una estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua que será transversal a los tres componentes y tendrá enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos).

El cuarto componente agrupa las actividades de capacidad institucional y mecanismo de ejecución, incluyendo coordinación, seguimiento, monitoreo, gestión administrativa, control y evaluación de la operación.

El seguimiento y la evaluación operan a través de lo que establece el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa (BID). El monitoreo se desarrolla a partir de la Matriz de Resultados del Programa, y su resultado se plasma en los informes semestrales de progreso. Este monitoreo, cita este Plan, debe responder las siguientes preguntas:

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- Monitoreo de conformidad: ¿Las actividades y procesos realizados se adhieren a los objetivos establecidos por el programa?
- Monitoreo financiero: ¿Hay suficiencia y oportunidad en la liberación de los fondos del programa?
- Monitoreo de actividades: ¿Las actividades proyectadas están siendo planificadas y ejecutadas de acuerdo con el tiempo requerido?
- Monitoreo de productos: ¿Los productos primarios, intermedios y finales se están desarrollando en la secuencia deseada?
- Monitoreo de resultados: ¿Se están alcanzando las metas a nivel de indicadores de impacto y resultados?
- Monitoreo de riesgos: ¿Los riesgos identificados en el programa ponen en peligro el logro de los objetivos? ¿Las acciones de mitigación planificadas se están desarrollando?

Este ejercicio de monitoreo se plasma en reportes con los cuales se actualizan los informes semestrales de progreso (ISP) del Programa y del *Project Monitoring Report* (PMR). Parte integral de estos informes lo constituye el análisis a los riesgos, ejercicio que hace parte de este seguimiento y evaluación.

A su vez, el PME plantea que se deben efectuar auditorías a los estados financieros, lo cual se traduce en el producto Estados Financieros Auditados (EFA), para su presentación al BID. También, en cada semestre se debe efectuar un ejercicio de auditoría que acompaña el informe semestral de progreso correspondiente.

Suma en esta etapa de seguimiento y evaluación, la ejecución de la evaluación de medio término, efectuada en 2024 y cuyos resultados definen recomendaciones, cuya implementación son objeto de esta evaluación.

Al final del Programa tiene prevista la ejecución de la actual evaluación final de resultados e impacto.

#### • **Productos**

De acuerdo con el PME, son productos del Programa por componente:

- Del Componente 1 - Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital:
  - 1.1. Estrategia de transformación digital, diseñada e implementada.
  - 1.2. Modelo de gobierno de datos y definición de estándares en función de las nuevas competencias con un desglose de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos, población con discapacidad y otras poblaciones diversas), diseñado e implementado.
  - 1.3. Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos, diseñado e implementado.
  - 1.4. Estrategia de gestión por procesos diseñada e implementada.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- 1.5. Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada.
  - 1.6. Estrategia de interoperabilidad diseñada e implementada.
  - 1.7. Modelo de riesgos y alertas para el ciclo de control fiscal diseñado.
  - 1.8. Modelo de identidad digital diseñado e implementado.
  - 1.9. Modelo de gestión de derechos digitales diseñado e implementado
- Del Componente 2 - Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal:
    - 2.1. Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) diseñado e implementado.
    - 2.2. Herramienta de georreferenciación de control fiscal diseñada e implementada.
    - 2.3. Modelo de operación del sistema de Control Fiscal Remoto diseñado e implementado.
    - 2.4. Metodología para establecer líneas de trabajo de solicitudes de identificación y de fuentes de información y analítica de datos diseñada.
    - 2.5. Modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante diseñados e implementados.
    - 2.6. Modelo de data lake basado en Big data diseñado e implementado.
    - 2.7. Sistema metabuscador integral diseñado e implementado.
    - 2.8. Gestión, infraestructura y servicios TIC con criterios de eficiencia energética, adquiridos y en operación.
    - 2.9. Estrategia de ciberseguridad diseñada implementada.
  - Del Componente 3 - Enfoque ciudadano e integridad:
    - 3.1. Estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo los pueblos indígenas y afrocolombianos, para cerrar las brechas de género y diversidad identificadas, diseñada e implementada.
    - 3.2. Herramienta gerencial de tablero de control de indicadores de género y diversidad (pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas) diseñada e implementada.
    - 3.3. Sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos, diseñado e implementado.
    - 3.4. Estrategia para auditar los ODS, con énfasis en el ODS 5, diseñada e implementada.
    - 3.5. Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de la CGR en materia de integridad institucional diseñada e implementada.
    - 3.6. Estrategia para profundizar la promoción de las veedurías ciudadanas, diseñada e implementada.
    - 3.7. Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta operación, con enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos), diseñada e implementada.

- **Resultados**

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Estos productos, a su vez, se orientan al logro de tres resultados intermedios que condensan la lógica específica del Programa:

- R.1. Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones, medido por la proporción de tareas automatizadas.
- R.2. Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control, medido por la proporción de alertas con seguimiento sobre el total de alertas.
- R.3. Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales, medido por esta participación.

Tales resultados se corresponden con los objetivos específicos de la intervención y con los indicadores definidos en la matriz de resultados y en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME), particularmente en materia de automatización de tareas, seguimiento de alertas y canalización digital de la participación ciudadana.

#### • Impactos

Frente al impacto, es necesario reflexionar sobre la problemática que llevó a la formulación del Programa y plantear objetivos y lograr cambios sustanciales. Este Programa surge en respuesta a un problema público que reconoce la CGR en relación con brechas de efectividad en el ejercicio del control fiscal, derivada de la ampliación de competencias introducidas por la reforma de Control Fiscal formalizada con el Acto Legislativo 04 de 2019.

A ello se sumó el contexto excepcional de la pandemia que incrementó las exigencias sobre las capacidades de control preventivo y concomitante debido al incremento, para 2019, de 1.711 sujetos de control a un escenario de 5.677 sujetos (CGR, 2022, pág. 331).

Bajo este contexto, se reforzó la necesidad de impulsar una transformación digital de la entidad para mejorar la eficiencia, eficacia y productividad para dar respuesta a este aumento del universo de sujetos de control, en tanto se presentaban limitaciones institucionales relacionadas con baja automatización de procesos, debilidades en interoperabilidad y calidad de información, capacidades insuficientes para monitoreo y seguimiento de alertas, y baja participación ciudadana en el ciclo del control fiscal.

Institucionalmente se espera que este Programa mejore la calidad del análisis de datos lo que fortalece el seguimiento y la trazabilidad de los procesos inherentes al control fiscal, con un alcance que busca incorporar con mayor eficacia a la ciudadanía en el ciclo de control - CONPES 4045 / 2021 - (DNP, 2021).

Bajo lo anterior, el impacto se comprende como los *Ahorros generados por renegociación o cancelación de contratos en pesos colombianos*, lo cual se prevé lograr a partir de las acciones para mejorar la productividad, la capacidad de monitoreo y en participación ciudadana que no solo se produzcan, sino que además sean apropiadas institucionalmente, sostenidas en el tiempo y traducidas en un mejor desempeño del control fiscal.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

### • Supuestos para la evaluación

El desarrollo de la cadena propone un conjunto de supuestos críticos:

- Entre los insumos y las actividades, se asume que el diseño del Programa es pertinente frente a las necesidades de la entidad, que el arreglo institucional definido es funcional y que los recursos técnicos, humanos, financieros y normativos están disponibles oportunamente.
- Entre las actividades y los productos, se asume que la contratación y las adquisiciones se ejecutan sin rezagos críticos, que la implementación técnica es viable y que la gestión de riesgos y el seguimiento permiten corregir desvíos.
- Entre los productos y los resultados, se asume que los desarrollos son efectivamente apropiados por las dependencias responsables, que se integran a la operación cotidiana y que la información que generan es suficiente y utilizable para reflejar cambios en productividad, monitoreo y participación ciudadana.
- Entre los resultados y el impacto, se asume que esas mejoras intermedias contribuyen materialmente a una mayor efectividad del control fiscal, que el cambio observado en el indicador de impacto refleja razonablemente los efectos del Programa y que la información disponible permite analizar dicho cambio con suficiente consistencia.

Estos supuestos dialogan de forma directa con las preguntas orientadoras definidas en la matriz de consistencia, especialmente aquellas relativas a coherencia del diseño, pertinencia del arreglo institucional, cumplimiento de productos, apropiación, factores facilitadores y restrictivos de la implementación, eficiencia operativa y sostenibilidad de los resultados.

### • Hipótesis central para la evaluación


Se plantea para esta evaluación: si la Contraloría General de la República (CGR) cuenta con recursos, arreglos institucionales y capacidades suficientes para implementar acciones de transformación digital, fortalecer herramientas de control fiscal, ampliar la participación ciudadana y sostener un mecanismo adecuado de ejecución, entonces será posible generar productos útiles y apropiados institucionalmente, que contribuyan a incrementar la productividad, la capacidad de seguimiento y la participación ciudadana, derivando finalmente en una mayor efectividad del control fiscal.

Sobre esta lógica se soporta el análisis evaluativo desarrollado considerando la identificación de los principales puntos de contraste entre diseño, implementación, productos, resultados e impacto.

La siguiente ilustración presenta de manera esquemática esta Teoría de Cambio del Programa que se soporta en su cadena de valor sobre la cual se fijan los supuestos y la hipótesis central descrita:

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## Ilustración 1. Teoría de Cambio del Programa para la Transformación Digital de la CGR

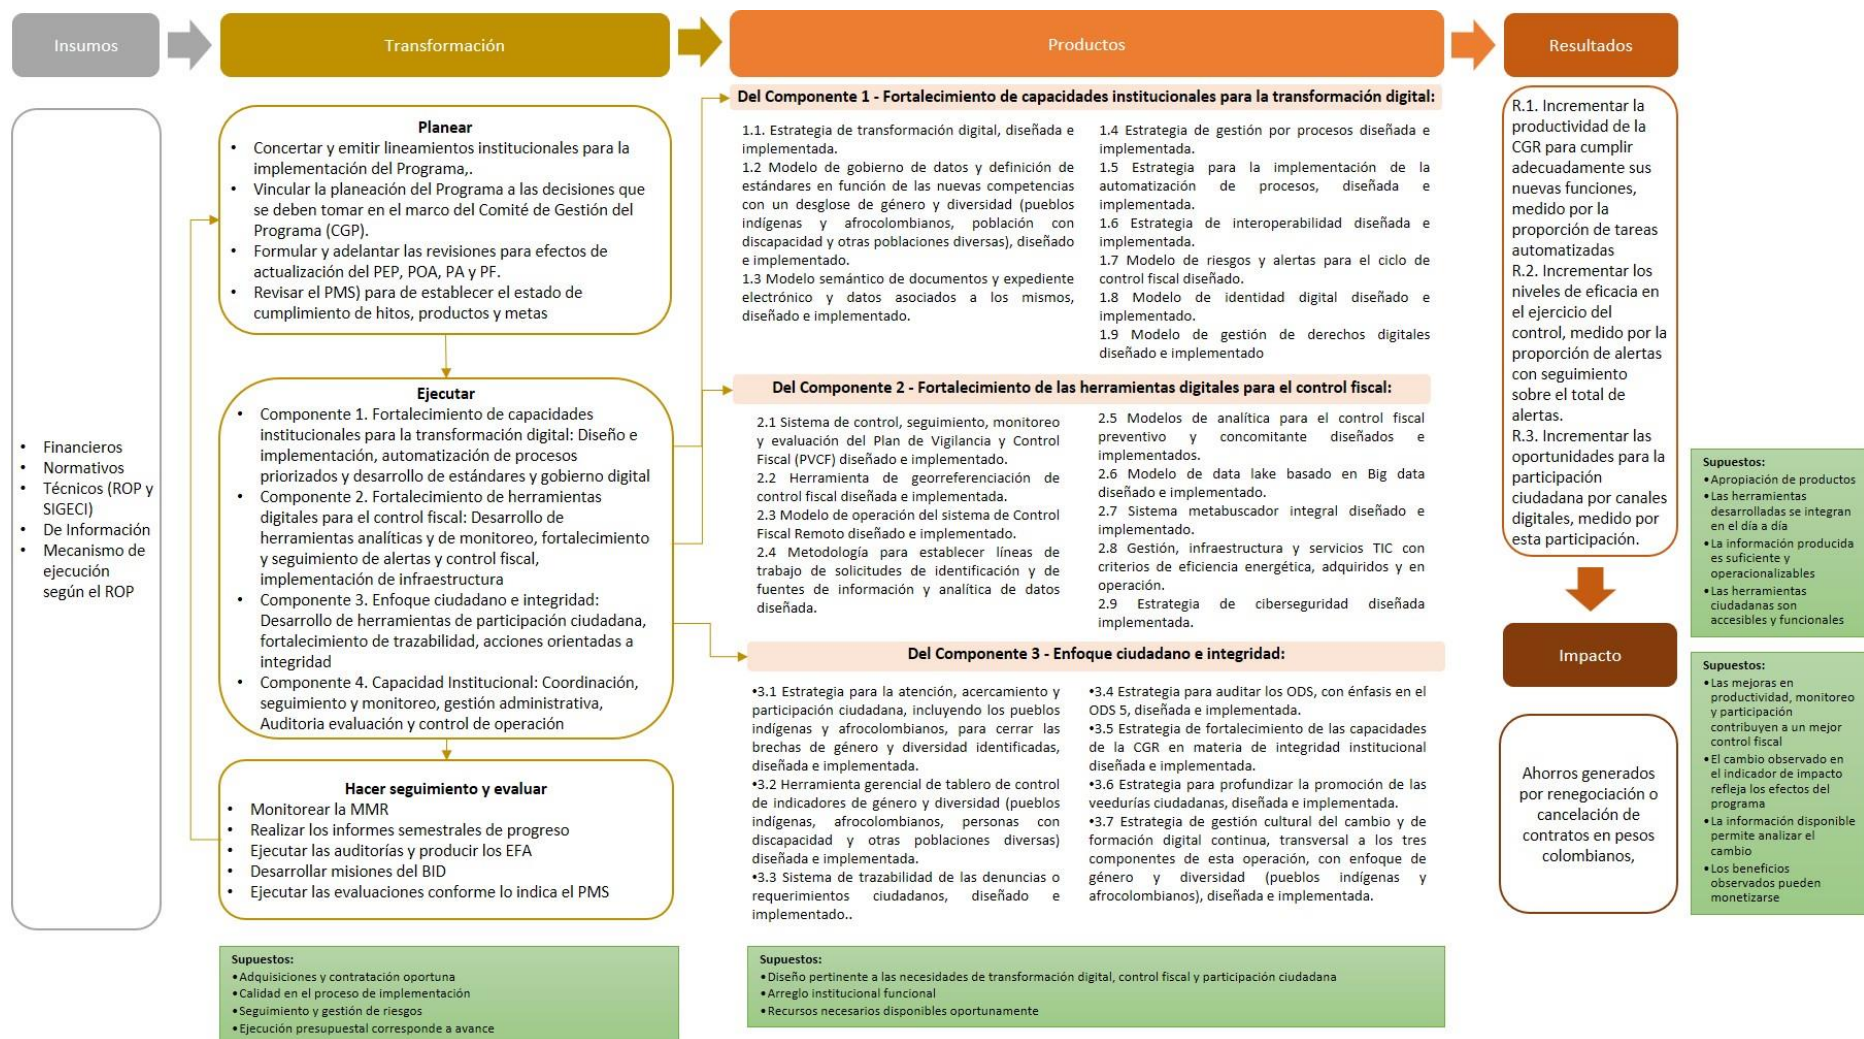

Fuente: elaboración propia a partir de documentos del Programa y fuentes oficiales.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

### 1.3. Análisis de las recomendaciones de la evaluación intermedia

El Programa para la Transformación Digital de la CGR contó con una evaluación de medio término (Econometría SAS, 2025). Ella generó recomendaciones para incorporar mejoras en la implementación, el seguimiento y la mitigación de riesgos que se recapitulan en esta sección junto con un análisis de su grado de incorporación en el Programa.

- **Recomendación: Explicitar acciones integradas de continuidad enfocadas en la gestión del cambio como un mecanismo de mantenimiento de los logros y resultados del Programa**

Para mantener los logros del Programa a largo plazo, en la evaluación intermedia se recomendó facilitar la adaptación gradual de los funcionarios y usuarios a las nuevas prácticas de transformación digital. Esto incluía continuar con capacitaciones continuas, divulgar los avances logrados y visibilizar qué áreas tendrían a cargo las nuevas herramientas tecnológicas para reducir la resistencia al cambio.

En esta evaluación final se evidencian acciones concretas para atender esta recomendación. Se percibe que la entidad comprendió una premisa fundamental: la Transformación Digital no se consolida únicamente comprando e instalando herramientas tecnológicas, sino mediante procesos gestionados de adopción y acompañamiento permanente. La presente evaluación encuentra que la recomendación se atendió transformando la "gestión del cambio" de un simple documento a una estrategia operativa promoviendo que tanto los funcionarios actuales, los nuevos empleados y la ciudadanía se apropien de la tecnología como su principal aliada.

A partir de las entrevistas 2026 y los avances documentados es posible ver que la atención a esta recomendación se desplegó en cinco frentes clave:

Primero, una evolución de la teoría a la adopción práctica para vencer la resistencia al cambio. Inicialmente, el Programa formuló un diseño base de cultura digital, pero rápidamente se identificó que la principal barrera era la resistencia natural de los funcionarios. Entonces, para contrarrestar esto, durante 2024 y 2025 se estructuraron fases complementarias (como la iniciativa CGR-210-SCC) enfocadas no en la teoría, sino en el uso y apropiación directa de las herramientas de productividad en el día a día.

Segundo, para que la gestión del cambio trascendiera al Programa y fuera sostenible, se tomaron dos medidas estructurales. De un lado, se midió el nivel de predisposición y resistencia de los funcionarios frente a la tecnología, y de otro lado, se estableció una alianza con el Centro de Estudios Fiscales de la CGR para estructurar la socialización y garantizar la transferencia formal de conocimiento, asegurando que las reglas quedaran claras para todos los servidores.

Tercero, evitar el modelo donde el contratista simplemente entrega el software y se retira. Se incentivó que los contratos de las herramientas digitales incluyeran fases obligatorias de acompañamiento, transferencia de conocimiento y mesas de ayuda.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Cuarto, se realizaron acciones de gestión del cambio para la mitigación del riesgo por la llegada de nuevos funcionarios. Entonces, se estructuró un plan de capacitación y formación riguroso diseñado específicamente para nivelar a este nuevo personal.

Quinto, estrategias de gestión del cambio con el cliente externo. Esto se hizo a través de estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a jóvenes de colegios, universitarios y veedores. El objetivo fue enseñar a la ciudadanía a utilizar las nuevas herramientas.

- **Recomendación: Optimizar los instrumentos de seguimiento y evaluación**

El Programa había recibido la recomendación de incrementar la periodicidad en el reporte de la información de los indicadores a una métrica mensual, en lugar de anual. Además, para la evaluación de impacto, ante la falta de un grupo de control, se sugirió utilizar metodologías más profundas como el método de series de tiempo interrumpidas o de intensidad de tratamiento, e incluir nuevas métricas que capturarán la eficiencia real.

En cuanto a la periodicidad, atendiendo a la recomendación de aumentar la frecuencia de los reportes, la Unidad Ejecutora intentó realizar un piloto de seguimiento bimensual; sin embargo, las dinámicas de las áreas de la entidad señalaron que esto era inviable, por lo que se consolidó un seguimiento trimestral desde marzo de 2024.

Respecto a la metodología de evaluación de impacto, se detectó que debido a la periodicidad de los datos, no fue posible aplicar el método de series de tiempo interrumpidas sugerido. No obstante, sí se adoptó la recomendación de utilizar el método de intensidad de tratamiento, evaluando el impacto del Programa al relacionar el nivel de ejecución presupuestal con el desempeño de los indicadores, como se muestra en otras secciones de este documento.

- **Recomendación: Fortalecer el plan de adquisiciones apuntando a la planeación y sostenibilidad del Programa.**

Se consideró clave en la evaluación intermedia contar con acciones en favor de mantener la estabilidad en el Plan de Adquisiciones (PA) para que sirviera de guía efectiva y evitara reprocesos administrativos. Además, se recomendó planear adquisiciones a largo plazo que fuesen compatibles con futuras exigencias, integrando criterios de sostenibilidad ambiental y estableciendo recursos para el mantenimiento y actualización tecnológica a futuro.

Sobre esto, se encontró que los líderes del Programa reconocieron la observación sobre las múltiples modificaciones al PA, pero argumentaron que este instrumento debe tener flexibilidad. Por lo tanto, las variaciones continuaron realizándose y se justificaron como ajustes estratégicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los productos y para adaptarse a factores externos fuera de su control, como la fluctuación de la tasa de cambio. Las actas de los Comités de Gestión del Programa (CGP) entre 2024 y 2026 confirman esta tendencia, mostrando continuas sesiones dedicadas a cancelar líneas, modificar métodos de selección e incorporar nuevos requerimientos de forma constante. Entonces, para el equipo ejecutor del Programa, modificar el PA fue una estrategia de adaptación viable para sortear los cuellos de botella presupuestales, cambiarios y de tiempos, logrando así cumplir con la entrega de los productos finales.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

En cuanto al establecimiento de mecanismos presupuestales que garanticen el mantenimiento y contrarresten la obsolescencia tecnológica a futuro, se identificó como un riesgo no resuelto al cierre del Programa pues no se encuentra una partida presupuestal identificada y suficiente en sus gastos de funcionamiento para sostener y actualizar los sistemas de analítica, big data e infraestructura TIC una vez concluya el préstamo.

- **Recomendación: Mantener la estabilidad de los roles que toman decisiones frente al desarrollo del Programa**

Dado que el Programa, durante la evaluación intermedia, se encontraba en una etapa crítica donde la curva de aprendizaje de los nuevos empleados era de alrededor de tres meses, la rotación de personal resultaba muy costosa; se aconsejó entonces fortalecer la gestión del conocimiento, documentando las decisiones y evitando la sobrecarga laboral en los equipos de las áreas de apoyo de la CGR.

Aunque el riesgo por la rotación de personal y el cambio de administración se materializó y se mantuvo latente, el Programa lo mitigó enfocándose en institucionalizar las prácticas para preservar la memoria institucional más allá de las personas. Esto se logró formalizando políticas como la de Arquitectura Empresarial, los manuales de gestión por procesos y estandarizando los diccionarios de datos en la DIARI, asegurando que los nuevos líderes no retrocedieran en lo ya avanzado. Asimismo, el Comité de Gestión del Programa fue clave para mantener la cohesión operativa durante la transición de directivos. Por lo tanto, la recomendación se cumplió exitosamente desde el frente de la preservación del conocimiento. La CGR logró que la ruta de transformación digital trascendiera a los individuos, apoyándose en un ecosistema documental formalizado y en un esquema de gobernanza lo suficientemente maduro para absorber los relevos de liderazgo sin desviar los objetivos del Programa.

- **Recomendación: Priorizar la medición de productividad a partir de las capacidades instaladas en el manejo de datos**

Debido a que en el momento de la evaluación de medio término el indicador de productividad se asemejaba más a un indicador de producto, se sugirió formular nuevos indicadores que midieran el cambio en la actividad o el tiempo invertido. Se recomendó medir los tiempos de ejecución, el talento humano interviniente y el costo de los recursos.

No obstante, se encuentra que esta recomendación no fue atendida a cabalidad, pues representó un reto metodológico y conceptual profundo para el Programa, el cual no logró resolverse del todo y tiene que ser reiterado como un desafío hacia el futuro. En esta evaluación final se identificó que el indicador utilizado (proporción de tareas automatizadas) continuó asemejándose más a un indicador de producto que a uno que midiera el nivel de actividad o el tiempo invertido. En consecuencia, se insta a la entidad a formular indicadores institucionales que utilicen los datos que generan las nuevas herramientas automatizadas para poder monitorear la productividad real (tiempos, costos y recursos humanos) por cada proceso y por cada estrategia de automatización.

- **Recomendación: Fortalecer la gestión de riesgos institucional**

La evaluación intermedia sugirió a la gerencia del Programa realizar acciones de seguimiento continuo a los riesgos, incluso aquellos de baja probabilidad e impacto. También se presentó como

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

pertinente la inclusión de una auditoría integral al Programa dentro del esquema de la CGR y mantener estable la estructura organizacional y de procesos de la entidad, para no generar ajustes internos que desviarán los resultados ya diseñados en la ruta de transformación digital.

A la fecha, se evidencia que el monitoreo de riesgos ha sido activo, evolucionando hacia la identificación de amenazas a largo plazo. Aunque la evaluación intermedia detectó que el Comité de Gestión del Programa (CGP) no discutía los riesgos con la frecuencia esperada en sus sesiones, el equipo técnico y gerencial continuó mapeando el entorno. Por ejemplo, en las entrevistas de 2026, los líderes identificaron proactivamente un riesgo emergente de gran impacto: la incorporación de cerca de 3.000 nuevos funcionarios producto de un concurso de méritos. Para mitigar el riesgo de que este nuevo personal careciera de las competencias para manejar el ecosistema digital, se estableció un plan de mitigación enfocado fuertemente en la capacitación y apropiación.

Adicionalmente, se mantuvo estable la estructura organizacional y de procesos. Esta recomendación fue atendida y gestionada como una prioridad estratégica mediante la institucionalización de los cambios. Los líderes del Programa reconocieron que el cambio de directivos y la rotación de personal eran riesgos latentes que no podían eliminar por completo. Para evitar que estos ajustes internos desviarán los resultados de la transformación digital, la estrategia se enfocó en formalizar las prácticas para que trascendieran a las personas. Se logró consolidar la política de arquitectura empresarial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se dejaron formalizados los manuales y diccionarios de gestión por procesos. Además, a pesar de los cambios en la cúpula de la Entidad (como la transición temporal de funciones al Vicecontralor), se mantuvo intacta la estructura y la comunicación desde el Comité de Gestión del Programa, garantizando la continuidad de la ruta trazada.

\Como conclusión general se tiene que la gerencia del Programa interiorizó en su mayoría las recomendaciones de la evaluación intermedia y aplicó estrategias de mitigación en gran parte de los frentes, como la metodología de evaluación de impacto, el fortalecimiento normativo para evitar pérdida de conocimiento y el impulso a la gestión del cambio. Sin embargo, la gerencia defendió la necesidad de mantener flexibilidad en su planeación de compras y encontró limitaciones operativas para alcanzar la periodicidad mensual y los indicadores de productividad ideales.

## 2. METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN

En esta sección se presentan los elementos metodológicos que fueron empleados para el desarrollo de la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR, siguiendo los parámetros técnicos fijados en lo TdR, el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) del Programa.

En esa línea se expone enseguida el alcance de evaluación y, en función de ello, los métodos, incluyendo fuentes y procesamiento de información abordado para cada uno de los tres ámbitos evaluativos: i) impacto y resultados; ii) análisis económico ex post; y iii) cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional).

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## 2.1. Alcance de la evaluación final

De acuerdo con los términos de referencia (TdR) fijados por la CGR para el desarrollo de la presente evaluación se tiene como objeto: “Realizar la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO”.

En esa línea esta evaluación se centró en “determinar el grado de cumplimiento del objetivo del Proyecto y sus resultados” siendo preciso “analizar los resultados alcanzados y productos implementados por el Programa en su totalidad, en función de los indicadores definidos en la Matriz de Resultados, tanto antes como después del Programa” (CGR, 2026, pág. 45).

Específicamente la evaluación busca dar cuenta de los siguientes aspectos (basado en (CGR, 2026, págs. 44 - 45)):

- i) Gestión del Programa y su ejecución.
- ii) Grado de coordinación y articulación intra e interinstitucional.
- iii) Grado de institucionalización de las acciones del Programa.
- iv) Estructura de control interno, financiero y contable adoptada y el manejo de los recursos financieros y justificaciones de gastos.
- v) Nivel de cumplimiento de cláusulas contractuales, recomendaciones de los informes de la auditoría externa.
- vi) Identificación de los principales problemas y lecciones aprendidas.

Lo anterior se enmarca en la metodología establecida en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) para evaluar el **impacto y resultados**, así como la evaluación **económica ex post** del Programa, ello en línea con el análisis evaluativo del **cumplimiento** de los productos que se soporta en la operación y arreglo institucional de la intervención; tales aspectos para la presente evaluación han sido comprendidos como **ámbitos evaluativos**: i) impacto y resultados; ii) análisis económico ex post; y iii) cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional).

Por su parte, los criterios centrales de terminación del proyecto -conocidos también como criterios de evaluación- para el desarrollo de la presente evaluación se definen de la siguiente manera (CGR, 2026, págs. 46 - 47):

- **Relevancia del Programa:** se refiere a la coherencia del diseño y objetivos de desarrollo del Programa con la estrategia institucional del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. El consultor debe evaluar: (a) el nivel de alineación de los objetivos de desarrollo del Programa con las realidades y necesidades del país y las Estrategias de País del BID y (b) el nivel de alineación del diseño del Programa con las realidades del país y las necesidades de desarrollo.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- **Efectividad del Programa:** en la evaluación de la efectividad se analiza hasta qué punto el proyecto logró sus objetivos específicos. En esta sección, se pone a prueba la validez de los vínculos anticipados en la lógica vertical del proyecto. La evaluación de la efectividad es la comparación de los resultados esperados de una operación con los resultados reales obtenidos.
- **Eficiencia del Programa:** en la evaluación de la eficiencia se establece hasta qué punto los costos incurridos para lograr los resultados del proyecto fueron razonables. Esto puede determinarse mediante el método más adecuado: análisis de costo-beneficio (CBA, por sus siglas en inglés) o análisis de costo- efectividad (CEA, por sus siglas en inglés).
- **Análisis de sostenibilidad del Programa:** se evaluarán las condiciones que podrían influir en la continuidad de los resultados ya alcanzados y el logro de los resultados futuros esperados durante el ciclo de vida del Programa. La sostenibilidad está determinada tanto por la probabilidad como por el impacto de varios riesgos en la continuidad de los resultados más allá de la culminación del Programa (una vez finalizada su implementación).

Enseguida se plantea la relación indicativa entre los **ámbitos evaluativos** planteados, y el método o métodos de evaluación -que serán detallados en la siguiente sección- y los criterios técnicos, ello apuntó al cumplimiento de los objetivos de la evaluación final y de impacto del Programa; se trata de un ejercicio que busca esquematizar técnicamente el alcance de cada ámbito.

**Tabla 2. Relación entre los ámbitos evaluativos, y métodos de evaluación y criterios técnicos asociados a la evaluación final del Programa para la Transformación Digital de la CGR**

| Ámbito evaluativo                      | Método de evaluación                                                                        | Relevancia | Efectividad | Eficiencia | Sostenibilidad |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------|
| Impacto y resultados                   | Antes y Después (sin tendencia) – posibilidad de complementar con Intensidad de Tratamiento |            | ✓           |            | ✓              |
| Análisis económico ex – post           | Costo – beneficio con base en metodología ex - ante                                         |            |             | ✓          | ✓              |
| Cumplimiento: (productos – operación – | Teoría del Programa                                                                         | ✓          | ✓           |            | ✓              |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| <b>Ámbito evaluativo</b> | <b>Método de evaluación</b> | <b>Relevancia</b> | <b>Efectividad</b> | <b>Eficiencia</b> | <b>Sostenibilidad</b> |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| arreglo institucional)   |                             |                   |                    |                   |                       |

Fuente: elaboración propia considerando Términos de Referencia – TdR (CGR, 2026)

Así entonces, el presente enfoque técnico busca que la evaluación no se limite a la verificación de entregables, sino que avance a generar un análisis evaluativo comprehensivo de los resultados e impacto conseguidos o no en el marco del Programa, considerando el desempeño de la intervención y las condiciones institucionales, operativas y financieras que explican los hechos que serán identificados.


A continuación, se presenta un esquema que sintetiza el abordaje técnico propuesto y su relación con los elementos conceptuales y metodológicos. Se destaca en esta ilustración los ámbitos evaluativos planteados a los cuales se vinculan tanto con los criterios técnicos como los métodos de evaluación, y las fuentes de información respectivas; cabe expresar que en la siguiente sección se detallan los métodos y fuentes información y sus procedimientos, ello en coherencia con el plan de trabajo establecido en la tercera sección de este producto.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## Ilustración 2. Integración del abordaje técnico, conceptual y metodológico para el desarrollo de la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR

Realizar la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR  
Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO

- Alcance:**
- Determinar el grado de cumplimiento del objetivo del Proyecto y sus resultados
  - Analizar los resultados alcanzados y productos implementados por el Programa en su totalidad, en función de los indicadores definidos en la Matriz de Resultados, tanto antes como después del Programa

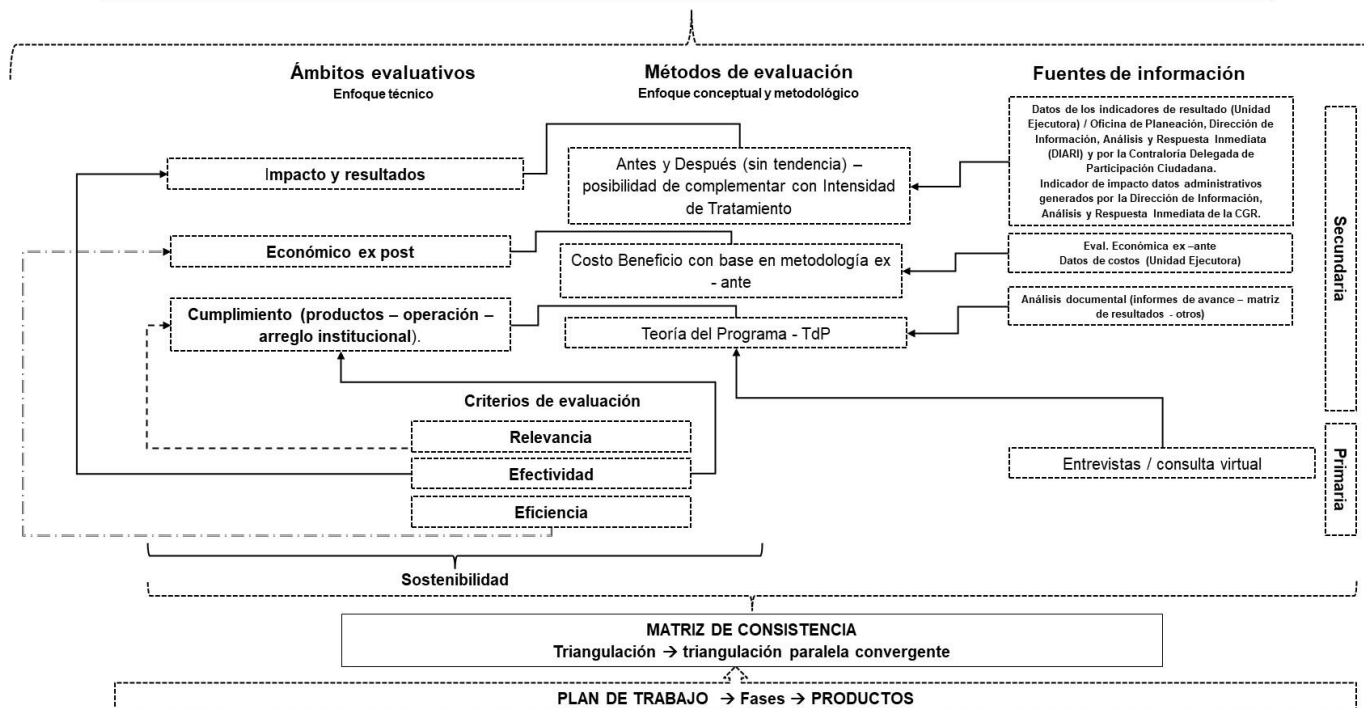

Fuente: elaboración propia considerando Términos de Referencia – TdR (CGR, 2026)

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## 2.2. Ámbito evaluativo: impacto y resultados (análisis atribución)

Para el desarrollo de este ámbito evaluativo se tomaron como punto de partida las definiciones establecidas en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) del Programa. En términos de indicadores, se abordó un indicador de impacto y tres indicadores de resultado. El indicador de impacto correspondió a los beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante. Es importante señalar que, aunque inicialmente se había considerado un indicador asociado a ahorros generados por renegociación o cancelación de contratos, este dejó de medirse después de la pandemia y fue reemplazado en el seguimiento del Programa por el indicador de beneficios directos actualmente disponible.

En relación con los indicadores de resultado, se analizó la proporción de tareas automatizadas, la proporción de alertas con seguimiento sobre el total de alertas y el porcentaje de participación ciudadana canalizada por medios digitales. Estos indicadores fueron utilizados como aproximaciones a los tres objetivos específicos de la operación: incrementar la productividad de la CGR, fortalecer la eficacia del ejercicio del control fiscal y ampliar las oportunidades de participación ciudadana por canales digitales.

El método principal aplicado fue la comparación antes-después sin tendencia, de acuerdo con lo previsto en el PME para el indicador de impacto y los indicadores de resultado. Esta metodología fue seleccionada teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de observaciones en el periodo pretratamiento y la imposibilidad de contar con un grupo de comparación. Esta limitación se explica, entre otros factores, porque la unidad de análisis del Programa corresponde a la CGR y porque no se dispone de información comparable para otras entidades o países que permita construir un contrafactual válido para los indicadores analizados.

La estimación antes-después se realizó mediante modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios, a partir de la siguiente especificación:

$$Y_t = \alpha + \beta T_t + \varepsilon_t$$

Donde  $Y_t$  es la variable de resultado a nivel país en el momento  $t$ ,  $T_t$  es una variable dicotómica que toma valor 0 antes del tratamiento y 1 después del tratamiento,  $\beta$  es el parámetro que recoge el impacto de interés y  $\varepsilon_t$  es un término de error. Para el indicador de impacto también se exploró una transformación logarítmica, con el fin de analizar cambios relativos en una variable monetaria de alta magnitud.

Dado que el diseño no cuenta con grupo de comparación, los resultados obtenidos no deben interpretarse como una estimación causal estricta del impacto atribuible exclusivamente al Programa. En cambio, se interpretaron como evidencia indicativa de cambios temporales asociados al periodo de implementación. Esta cautela metodológica es relevante porque los indicadores analizados pueden estar influenciados por factores institucionales, operativos o contextuales que no son observables en la serie de datos disponible.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Como ejercicio complementario, se estimaron modelos de intensidad de tratamiento. Esta aproximación utilizó la ejecución acumulada del Programa como variable continua de exposición, bajo la hipótesis de que mayores niveles de avance financiero y operativo podían estar asociados con mejores resultados en los indicadores analizados. Para los indicadores de resultado, la intensidad se vinculó con el componente del Programa más directamente relacionado con cada resultado.

#### ➤ Fuentes de información secundaria

Las fuentes de información utilizadas fueron registros administrativos y reportes institucionales del Programa. Para el indicador de impacto, se emplearon datos administrativos generados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Para los indicadores de resultado se utilizaron los registros y reportes disponibles de las dependencias responsables, incluyendo información de la Oficina de Planeación, la Oficina de Sistemas e Informática, la DIARI, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Unidad Ejecutora del Programa. La información fue organizada en una base consolidada anual, incluyendo variables de resultado, ejecución física, ejecución financiera y variables de tratamiento requeridas para las estimaciones.

Finalmente, como parte del procesamiento estadístico, se realizaron pruebas de normalidad sobre los residuos de los modelos estimados y se utilizaron errores estándar robustos cuando correspondía, teniendo en cuenta el tamaño reducido de la muestra y la posibilidad de heterocedasticidad. Los resultados de estos ejercicios se presentan como evidencia cuantitativa exploratoria y se complementan con el análisis descriptivo de las trayectorias de los indicadores frente a sus metas.

### 2.3. Ámbito evaluativo: análisis económico ex - post

Para el desarrollo de este ámbito evaluativo se realizó un análisis económico ex post orientado a comparar los beneficios económicos atribuibles al Programa con los costos incurridos para su implementación. Este ejercicio respondió a lo establecido en los Términos de Referencia y en la matriz de consistencia de la evaluación, en los cuales se definió la necesidad de estimar el costo-beneficio real de la intervención, los beneficios sociales netos, los costos directos y los principales indicadores de desempeño económico del Programa.

El punto de partida metodológico fue la evaluación económica ex ante elaborada durante el diseño de la operación. Dicha metodología estimaba los beneficios a partir de una tasa esperada de ahorro fiscal aplicada sobre un universo contractual de referencia, de modo que el beneficio económico se construía como una proporción de ahorro potencial sobre recursos públicos sujetos a control. No obstante, durante la implementación del Programa el indicador inicialmente previsto, asociado a ahorros generados por renegociación o cancelación de contratos, dejó de ser el referente principal de seguimiento. En su lugar, el análisis ex post utilizó el indicador vigente de impacto, correspondiente a los beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Este cambio tuvo implicaciones metodológicas relevantes. A diferencia del indicador considerado en la evaluación ex ante, el indicador vigente ya reporta beneficios en términos monetarios. Por tanto, no fue necesario aplicar una tasa de ahorro fiscal sobre una base contractual para monetizar beneficios. Sin embargo, tampoco se imputó la totalidad de los beneficios reportados por dicho indicador al Programa, dado que estos reflejan resultados institucionales del control fiscal que pueden depender de capacidades previas de la CGR, decisiones misionales, acciones ordinarias de vigilancia, condiciones sectoriales y otros factores no atribuibles exclusivamente a la operación financiada con el crédito BID.

En consecuencia, el análisis económico ex post adaptó la metodología original mediante dos decisiones principales. En primer lugar, se tomó como beneficio bruto incremental la diferencia entre el valor observado del indicador de impacto en cada vigencia y la línea base preprograma. Esta decisión permitió excluir los beneficios que ya se registraban antes del inicio de la implementación y concentrar la valoración económica en el cambio observado durante el periodo de ejecución y proyección. En segundo lugar, sobre dicho beneficio incremental se aplicaron escenarios conservadores de atribución, con el propósito de estimar la proporción del beneficio que podía asociarse razonablemente con la contribución del Programa.

Los escenarios de atribución se construyeron a partir de una lectura prudente de literatura análoga sobre fortalecimiento institucional, gestión del desempeño, transparencia, analítica pública y auditoría. A partir de esta revisión se definieron valores de atribución bajos, entendidos como escenarios de contribución plausible y no como estimaciones causales directas. Para los años observados se utilizó una trayectoria gradual de atribución, consistente con la maduración progresiva del Programa, el cumplimiento físico alcanzado, la disponibilidad de productos estratégicos y la evidencia cualitativa sobre apropiación funcional. Para los años proyectados dentro del horizonte de análisis se adoptó un valor promedio de atribución, bajo el supuesto de que las capacidades instaladas continuaban generando beneficios, aunque sin asumir que el nivel máximo observado durante la implementación se mantenía indefinidamente.

El horizonte de análisis se mantuvo en diez años, en coherencia con el enfoque de la evaluación económica ex ante. Los costos correspondieron a la ejecución efectiva del Programa, organizada como flujo anual y llevada a valor presente. No se incorporaron costos adicionales posteriores al cierre asociados a operación, mantenimiento o actualización tecnológica, dado que el alcance del ejercicio se concentró en la comparación entre los beneficios atribuibles estimados y los costos de implementación financiados por la operación.

Con base en los flujos de beneficios atribuibles y de costos se calcularon los indicadores de desempeño económico del Programa: valor presente de beneficios, valor presente de costos, valor presente neto y razón beneficio-costos. La Tasa Interna de Retorno se revisó como indicador complementario; sin embargo, cuando la estructura de los flujos no permitió obtener una estimación interpretable, la valoración económica se concentró en el valor presente neto, la razón beneficio-costos y el análisis de sensibilidad de los escenarios de atribución.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

#### ➤ Fuentes de información secundaria

Las fuentes de información utilizadas incluyeron la metodología y los archivos de cálculo de la evaluación económica ex ante, la serie anual del indicador de impacto vigente, los reportes financieros y de ejecución presupuestal efectiva del Programa, los informes semestrales de progreso, los estados financieros disponibles y los insumos de auditoría y seguimiento financiero.

#### 2.4. Ámbito evaluativo: cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional)

El ámbito evaluativo de **cumplimiento** en el marco de la presente evaluación se basó en el análisis de los productos alcanzados durante la implementación del Programa desde un enfoque de dos perspectivas: i) en función de sus resultados e impacto, y ii) considerando su operación y arreglo institucional. Esta estructura busca evaluar cómo se gestionó y ejecutó el Programa, su nivel de coordinación e institucionalización, la solidez de sus controles internos y financieros, y el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales y recomendaciones de auditoría.

A nivel de metodología se utilizó la evaluación **Teoría del Programa**<sup>2</sup>. Dicho método parte de la aproximación y comprensión del diseño y ejecución de una intervención, es decir analizar el Programa de Transformación Digital de la CGR - haciendo énfasis en la conexión de sus componentes (productos / operación / arreglo institucional) con su o sus propósitos (resultados / impacto). El marco lógico del objeto de evaluación -expresado como matriz de resultados del Programa- se utilizó como herramienta clave que permitió priorizar e identificar los temas primordiales y enfocar la evaluación. (Ligero Lasa, 2011, pág. 19); ello considerando los criterios de evaluación fijados para el desarrollo de este ejercicio evaluativo: relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.

El método Teoría del Programa aplicado a esta evaluación tuvo como objetivo “indagar sobre si los éxitos o fracasos del programa o proyecto fueron debidos a las diferentes cadenas de trabajos y si los medios fueron los adecuados para la implementación del programa” (Ligero Lasa, 2011, pág. 20). Ello implicó identificar los factores que desde un **análisis de contribución** conllevaron o no al

<sup>2</sup> Conceptualmente cabe expresar que la Teoría del Programa como método de análisis evaluativo tiene un amplio bagaje teórico. Su origen se sitúa en la década de los 60 del siglo pasado con autores como Schuman (1967) quien planteó que la evaluación de programas y/o proyectos debía dirigirse hacia la cadena de objetivos con énfasis en los procesos que se encuentran entre la formulación de una actividad y la consecución de su propósito. Posteriormente, desarrollos conceptuales de diferentes autores durante la década ochenta del siglo XX fue ampliando la idea, progresivamente, “de que para evaluar es necesario el desarrollo de un marco teórico previo del programa” (Ligero Lasa, 2011, pág. 19).

En América Latina, por su parte, en el contexto de la implementación del proceso de cooperación internacional para el desarrollo, se difundió la metodología de Marco Lógico (MML) como una herramienta para la planificación de programas y proyectos basada en objetivos, siendo la simplificación de esta metodología lo que actualmente se conoce como marco lógico que soporta lo la matriz de resultados de programas como el presente objeto de evaluación, de ahí la pertinencia de emplear la Teoría del Programa como método de evaluación.

Es de anotar que el surgimiento de la Teoría del Programa en las décadas sesenta y setenta no fue espontáneo. En ese momento ocurrían múltiples discusiones respecto a la producción y herramientas para la gestión, ello primordialmente en Estados Unidos. De ahí surge el concepto de proyecto como herramienta de atención clave de los procesos gerenciales, soportado por criterios de eficiencia y eficacia, aspectos que posteriormente se constituyeron en el equivalente del desarrollo productivo a nivel global (Ligero Lasa, 2011, pág. 19).

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

cumplimiento de objetivos, permitiendo determinar los cuellos de botella y las oportunidades de mejora y las recomendaciones, así como el nivel de cumplimiento de la intervención.

De esta manera se hizo una revisión y reconstrucción de la Teoría de cambio Programa para la Transformación Digital de la CGR, ello con base en su Matriz de Resultados y su lógica vertical, expresada como una **cadena de valor** lo que permitirá determinar el nivel de cumplimiento de los productos considerando los resultados e impactos, así como la operaciones e institucionalidad del propio Programa, situando en ese sentido entre los eslabones de dicha cadena los criterios de evaluación fijados (Ligero Lasa, 2011, pág. 19).

Bajo la metodología de Teoría del Programa que, como se dijo anteriormente, considera la Matriz del Resultados y la lógica vertical de la intervención, se identificaron los supuestos esenciales<sup>3</sup> que permitieron profundizar sobre los aspectos prioritarios, estableciendo el número y profundidad de las preguntas orientadoras (PO), integrando los criterios de evaluación como se mencionó previamente. De esta manera se formularon las recomendaciones y conclusiones de la evaluación que se derivarán en las recomendaciones especialmente orientadas a la sostenibilidad de los avances logrados, al igual que sugerencias estratégicas para intervenciones futuras similares.

#### ➤ Fuentes de información secundaria

La revisión y clasificación de información secundaria para lograr una aproximación precisa del Programa se logró mediante la técnica de **análisis documental**, apoyado en un DOKU, herramienta de IA propia de Econometría que permitió el ordenamiento de la documentación existente, tanto cuantitativa (indicadores, metas, etc.) como cualitativa (informes de avance, documentos institucionales, etc.) de acuerdo con los componentes del Programa considerando en todo caso la transversalidad de la información.

Esta técnica tomo en cuenta la identificación y recopilación de documentos, informes, reportes, planes, entre otros insumos, buscando comprender ágilmente el mayor detalle del Programa y su nivel de cumplimiento, ello desde una perspectiva que facilite la identificación de factores críticos que debieron facilitar el cumplimiento de los propósitos y productos del Programa (Plasencia-Soler, Marrero-Delgado, Nicado-García, & Sánchez, 2017), ello en línea con la Teoría de cambio del Programa que aborda la cadena de valor de la intervención (insumos, procesos, productos, resultados e impacto).

El análisis y ordenamiento de información secundaria en este caso fue clave para indagar, en función de ello, sobre aspectos relevantes en las fuentes de información que se aplicaron en las entrevistas y consulta virtual.

- Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO y anexos operativos

<sup>3</sup> “Los «supuestos» pueden aludir a las hipótesis subyacentes acerca de cómo se va a producir el cambio en un programa. (...) Se denominan «supuestos relacionados con la causalidad»” **Fuente especificada no válida.**

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- Documento CONPES 4045 de 2021
- Perfil de Proyecto del BID (CO-L1266)
- Reglamento Operativo del Programa (ROP)
- Matriz de Resultados del Programa
- Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)
- Reportes de Monitoreo de Progreso (PMR), incluido el reporte público de 2025
- Informes semestrales de progreso presentados por la UEP al BID
- Informe final de la Evaluación de Medio Término
- Informes de auditoría externa del Programa
- Plan de adquisiciones y su trazabilidad histórica
- Resoluciones organizacionales asociadas al Programa (creación y ajustes del CGP y la UEP)
- Documentos institucionales de la CGR vinculados al seguimiento y producción de indicadores
- Plan Estratégico Institucional de la CGR 2022–2026
- Planes Operativos Anuales (POA) asociados al período de ejecución del Programa
- Metodología de evaluación económica ex ante y soportes de costeo/beneficios del Programa

➤ Revisión técnica del avance de los productos del Programa: profundización

El Programa cuenta con 25 indicadores de producto distribuidos en los 3 componentes así:

- C1. Desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital: 9 indicadores
- C2. Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal: 9 indicadores
- C3. Enfoque ciudadano e integridad: 7 indicadores

El equipo evaluador desarrolló una revisión sistemática del cumplimiento de cada producto del Programa tomando como referencia lo establecido en el PME, en los avances consignados en los informes semestrales de progreso (ISP) y en los anexos de avance físico y financiero, ello como complemento al análisis de efectividad en curso asociado al ámbito evaluativo de cumplimiento.

Con el fin de facilitar el análisis de la trayectoria de cada producto y organizar de manera consistente los hallazgos relacionados con su nivel de cumplimiento, se hizo una selección de los productos más relevantes para la Programa, teniendo en cuenta el cumplimiento de al menos uno de los siguientes criterios:

1. El % de participación del presupuesto del producto sobre el presupuesto del componente es mayor o igual a 15% y el equipo técnico de la CGR lo considera relevante para el análisis.
2. El % de presupuesto comprometido para 2026 es mayor o igual al 15% y el equipo técnico de la CGR lo considera relevante para el análisis.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

3. El equipo técnico de la CGR considera que el análisis del producto es relevante, aunque no cumpla con el % establecido en los dos criterios anteriores.

De acuerdo con estos criterios, en la siguiente tabla se presenta la lista de los 10 productos seleccionados sobre los cuales se efectuó un análisis con cierta profundidad sobre su ejecución y resultados.

**Tabla 3. Productos del Programa seleccionados para análisis detallado**

| PRODUCTO                                                                                                                           | \$USD PLANEADO AJUSTADO | \$USD EJECUTADO | \$USD COMPR. 2026 | % SOBRE EL TOTAL DEL COMPONENTE | % COMPR. 2026 | CRITERIO DE SELECC. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>C1. Desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital</b>                                                  |                         |                 |                   |                                 |               |                     |
| 1.3 Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos, diseñado e implementado                | 1.205.885               | 447.248         | 758.637           | 23%                             | 62,9%         | 1 y 2               |
| 1.5 Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada                                    | 2.146.072               | 2.133.324       | 12.748            | 41%                             | 0,6%          | 1                   |
| <b>C2. Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal</b>                                                    |                         |                 |                   |                                 |               |                     |
| 2.1 Sistema de control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) diseñado e implementado | 1.965.295               | 1.962.328       | 2.967             | 17%                             | 0,2%          | 1                   |
| 2.2 Herramienta de georreferenciación de control fiscal diseñada e implementada                                                    | 461.716                 | 461.716         | -                 | 4%                              | 0,0%          | 3                   |
| 2.5 Modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante diseñados e implementados                                | 641.539                 | 641.539         | -                 | 5%                              | 0,0%          | 3                   |
| 2.7 Sistema metabuscador integral diseñado e implementado                                                                          | 464.121                 | 89.794          | 374.327           | 4%                              | 80,7%         | 2                   |
| 2.8 Gestión, infraestructura y servicios TIC, adquiridos y en operación                                                            | 4.114.439               | 2.809.666       | 1.304.773         | 35%                             | 31,7%         | 1 y 2               |
| <b>C3. Enfoque ciudadano e integridad</b>                                                                                          |                         |                 |                   |                                 |               |                     |
| 3.1 Estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, diseñada e implementada                                   | 1.071.611               | 1.071.611       | -                 | 36%                             | 0,0%          | 1                   |
| 3.3 Sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimiento ciudadanos, diseñado e implementado                                   | 723.730                 | 719.279         | 4.451             | 24%                             | 0,6%          | 1                   |
| 3.7 Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta          | 922.186                 | 763.357         | 158.829           | 31%                             | 17,2%         | 1 y 2               |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| PRODUCTO                                                               | \$USD PLANEADO AJUSTADO | \$USD EJECUTADO | \$USD COMPR. 2026 | % SOBRE EL TOTAL DEL COMPONENTE | % COMPR. 2026 | CRITERIO DE SELECC. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| operación, con enfoque de género y diversidad, diseñada e implementada |                         |                 |                   |                                 |               |                     |

Fuente: elaboración propia con base en ISP 2025 - II (CGR, 2025).

Para facilitar y estandarizar el análisis, se diseñó una ficha estructurada que consolida la programación inicial y ajustada, los avances físicos reportados y una síntesis analítica del indicador correspondiente.

A continuación, se presentan una ficha ilustrativa como soporte del análisis; las fichas diligenciadas se entregan como anexo del presente informe.

**Tabla 4. Ficha técnica de indicador de producto**

| Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|
| Ficha técnica de indicador de producto                                              |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Caracterización del indicador de producto                                           |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Componente                                                                          |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Producto                                                                            |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Descripción                                                                         |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Unidad                                                                              |      |                            |      |      | Valor LB                    | Año LB |                                     | Meta     |          |
| Estado                                                                              |      | % de Cumplimiento          |      |      |                             |        | Año de cumplimiento                 |          |          |
| Medios de verificación:                                                             |      | Hitos:                     |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Ajustes:                                                                            |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Presupuesto inicial USD\$                                                           |      | Presupuesto ajustado USD\$ |      |      | Presupuesto ejecutado USD\$ |        | Presupuesto Comprometido 2026 USD\$ |          |          |
| Programación y avance del Producto                                                  |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
|                                                                                     | 2019 | 2020                       | 2021 | 2022 | 2023                        | 2024   | 2025                                | EOP 2023 | EOP 2025 |
| Programación inicial [P]                                                            |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Programación ajustada [P a)]*                                                       |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Programación ajustada [P)] **                                                       |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |
| Avance [A]                                                                          |      |                            |      |      |                             |        |                                     |          |          |

\*Ajuste tomado del informe del primer semestre de 2023 (antes de la ampliación del Programa) (CGR, 2023)

\*\*Ajuste tomado del informe del primer semestre de 2025 (CGR, 2025)

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Fuente: elaboración propia a partir de los ISP 2019 - 2025.

Los aspectos para analizar como parte de cada una de las fichas fueron los siguientes:

- a. **Contribución a la Transformación Digital de la CGR**
- b. **Principales logros**
- c. **Uso y apropiación**
- d. **Conclusión**

➤ Fuentes de información primaria

Se realizaron dos ejercicios de levantamiento de información primaria. La primera fueron **entrevistas semiestructuradas individuales o grupales** en modalidad virtual a miembros del equipo del Programa.

- UEP
- Gerencia del Programa
- Oficina de Planeación
- DIARI
- Oficina de Sistemas e Informática
- USATI
- CDPC
- Dirección de Contratación

Dichas entrevistas permitieron obtener información cualitativa con base en una guía común que incorpora temas centrales relacionados con el objeto de evaluación, esto es el Programa; se buscó profundizar en temas específicos, aclarar aspectos sensibles con base en preguntas particulares del actor o actores consultados, constituyéndose en una fuente esencial para el análisis evaluativo. Las entrevistas se codificaron de modo que pudieran determinar puntos comunes y divergentes.

En esa línea información primaria puede ser contrastada con la información secundaria previamente ordenada, en función del alcance y criterios de evaluación, siendo en ese caso la **matriz de consistencia**, la herramienta integradora que oriento metodológicamente la evaluación.

Por su parte, la segunda fuente de información primaria fue la **consulta virtual**. Se trato de un instrumento esencialmente cuantitativo no representativo aplicado individualmente a diferentes actores involucrados en el marco del Programa.

El propósito de este instrumento fue conocer información asociada a los cambios percibidos a partir de la intervención del Programa desde los diferentes roles de los actores consultados. Para ello se empleó un formulario tipo Google forms, en el que a través de 13 preguntas tipo escala de Likert y

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

4 abiertas que indagaron por aspectos específicos del Programa en cuanto a la relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de sus productos logrados; ello como una aproximación cuantitativa no representativa de los hechos identificados.

## 2.5. Organización y tratamiento de información: matriz de consistencia y triangulación

Desde la perspectiva del alcance de la evaluación que incluye cada uno de los tres ámbitos evaluativos: i) impacto y resultados; ii) análisis económico ex post; y iii) cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional), se ha desarrollado la **matriz de consistencia de la evaluación**<sup>4</sup>

Específicamente en dicha matriz se han considerados el alcance de evaluación (actividades relacionadas en los TdR), criterios técnicos, preguntas orientadoras y preguntas específicas de los instrumentos de levantamiento de información.

Así entonces, los elementos evaluativos integrados en la matriz de consistencia precisarán los contenidos específicos de cada uno los instrumentos de levantamiento de información, permitiendo tener una visión técnica, conceptual y metodológica integrada, ello apuntando a dar alcance suficientemente a los TdR de la presente evaluación.

Por su parte, el tratamiento y sistematización de la información tanto primaria como secundaria recabada en el ámbito evaluativo de cumplimiento, resultados e impacto, y económica ex post, se realizó mediante un proceso de **triangulación** que busca no reducir la experiencia a un conjunto de datos, sino en comprender la experiencia integralmente (Álvarez C, 2008; Acero León, 2019). Se trata de que el material proveniente de distintas fuentes y soportes se empleará de forma que aporte sentido, y responda a los objetivos y criterios de evaluación.

Bajo esa línea, toda la información recopilada fue agrupada por categorías analíticas incluidos en la matriz de consistencia, lo anterior desde un enfoque para generar los insumos necesarios para una **triangulación paralela convergente**, lo que implica el uso simultáneo de técnicas cuantitativas y cualitativas, dando prioridad a ambas aproximaciones, tras lo cual los resultados se integran y analizan para llegar a una interpretación conjunta.

---

<sup>4</sup> La matriz de consistencia de la evaluación se define como un instrumento formado por columnas y filas que permite integrar de manera coherente y lógica los objetivos, las variables (supuestos), tipo de información, mecanismos de recolección y otras consideraciones sustantivas del ejercicio evaluativo **Fuente especificada no válida..**

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

### 3. RESULTADOS POR ÁMBITO EVALUATIVO

En esta sección se detallan los resultados y conclusiones asociados a cada uno de los ámbitos de la evaluación: i) impacto y resultados; ii) análisis económico ex post; y iii) cumplimiento (productos – operación – arreglo institucional).

Para la estructuración del análisis evaluativo que se presenta en seguida se adoptó la técnica de identificación de **hechos** que se comprenden como los aspectos relevantes en función de cada una de las preguntas orientadoras y su respectivo análisis. Se trata de partir de las evidencias obtenidas en esta evaluación, lo que facilita el desarrollo de afirmaciones basadas en estas (OECD, 2023). Los hechos incluyen al inicio de estos el siguiente código: (H) y son resaltados en negrilla.

#### 3.1. Ámbito evaluativo: impacto y resultados del Programa<sup>5</sup>

##### ➤ Impacto del Programa<sup>6</sup>

**H. 1. Una mayor tasa de crecimiento de los beneficios directos de las acciones de control preventivo y concomitante se asocia con el inicio del Programa.** El análisis descriptivo de la evolución temporal de los datos muestra que, una vez iniciado la intervención en el año 2022, el valor de los beneficios directos se ha incrementado, excepto en el año 2024, al pasar de US\$367,3 millones a US\$694,4 millones. Por su parte, la metodología de comparación antes-después permite establecer que el coeficiente de la estimación del modelo econométrico es positivo y significativo en términos estadísticos.

Teniendo en cuenta que el objetivo del Programa es el de *“incrementar la efectividad del control fiscal de la Entidad a través del incremento de la productividad y de los niveles de eficacia en el*

<sup>5</sup> Se adjunta el Script de análisis de impacto y resultados (Anexo 2. Script\_análisis\_impacto\_resutados\_Eval\_final\_TD\_CGR). Este script contiene el procesamiento y análisis estadístico utilizado para la evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República. A partir de la base consolidada de indicadores físicos, financieros, de resultados e impacto, el código realiza procesos de limpieza y transformación de variables, incluyendo la identificación del periodo de implementación del Programa, la construcción de variables de tratamiento y la transformación logarítmica de variables monetarias y de ejecución acumulada.

Posteriormente, el script implementa las metodologías cuantitativas utilizadas en la evaluación. En particular, estima modelos de antes y después para analizar cambios asociados a la implementación del Programa, modelos de intensidad de tratamiento para examinar la relación entre los niveles de ejecución acumulada y los resultados observados, y modelos de serie temporal interrumpida como análisis complementario. Adicionalmente, incorpora pruebas de normalidad sobre los residuos de los modelos estimados, genera tablas de resultados en formato de reporte y produce gráficos de evolución temporal de los indicadores de resultado en comparación con las metas definidas para el Programa.

<sup>6</sup> Esta sección se relaciona con las PO:


- ¿Qué cambio se observa en el indicador “Beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante” antes y después de la implementación del Programa?
- ¿En qué medida el cambio del indicador es atribuible al programa y es consistente con la metodología de antes y después sin tendencia definida en el PME y, si la información lo permite, con la aproximación complementaria por intensidad de tratamiento?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

*ejercicio de vigilancia y control y aumentando las oportunidades para la participación ciudadana”* (CGR, 2026), el indicador seleccionado para realizar esta medición corresponde al de los beneficios directos asociados a la efectividad<sup>7</sup> de las acciones del control preventivo y concomitante<sup>8</sup>, expresados estos en valores en millones de dólares.

De ese modo, de manera descriptiva se evidencia que, una vez iniciado el Programa los beneficios se incrementaron 12%, pasando de US\$367,3 millones en 2022 a US\$413 millones en 2023. La siguiente figura muestra el comportamiento anteriormente descrito. Además, dicha figura muestra cómo después del 2023 el incremento en el flujo de beneficios retrocede ligeramente, pero con una recuperación pronunciada en el año 2025.

**Ilustración 3. Beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante**

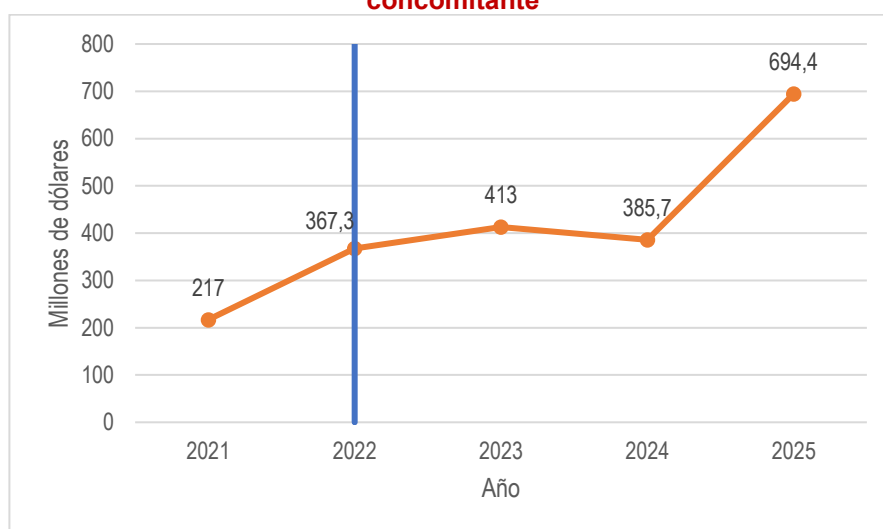

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025)

Por su parte, al implementar la metodología Antes y después sin tendencia, definida desde el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)<sup>9</sup>, se observa que en términos de valores absolutos (en millones de dólares) los beneficios asociados a la efectividad de las acciones del control preventivo y concomitante no cambian una vez iniciado el Programa. Sin embargo, al realizar el análisis en logaritmos naturales (tasas de crecimiento) se observa que después del 2022 los beneficios se incrementaron.

<sup>7</sup> En un primer momento se consideró medir ahorros generados por la renegociación o cancelación de contratos, este indicador no se continuó midiendo posterior a la pandemia. Este indicador no tomaba en consideración los modelos analíticos que fueron construidos para el ejercicio del control fiscal de manera posterior a la pandemia.

<sup>8</sup> Es decir, la vigilancia y seguimiento permanente del patrimonio público en tiempo real y de manera oportuna. Esto implica el acceso a la información y el acompañamiento a la gestión fiscal en todas sus etapas o ciclos, ya sea de forma presencial o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo primordial es observar a los sujetos de control en sus procesos y decisiones sin intervenir en los mismos.

<sup>9</sup> Documento de referencia que propone los aspectos metodológicos a tener en cuenta para la realización de la evaluación de impacto y económica del Programa.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

**Tabla 5. Resultados del modelo antes y después sin tendencia<sup>10</sup>**

|                                   | Valor absoluto beneficios | Logaritmo natural beneficios |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Inicio del Programa (2022)</b> | 826.500                   | 1,409**                      |
|                                   | (354.855)                 | (0,384)                      |
| <b>Constante</b>                  | 217.000***                | 5,380***                     |
|                                   | (0,000)                   | (0,000)                      |
| <b>Número de observaciones</b>    | 5                         | 5                            |
| <b>R-squared</b>                  | 0,311                     | 0,528                        |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025)

Es importante resaltar que el uso de la metodología definida acarrea una limitación en cuanto a el nivel de atribución de los cambios observados al Programa. Al no ser una evaluación de impacto, no es posible atribuir el efecto observado únicamente a la intervención, por lo tanto, la metodología de comparación antes-después tiene un alcance más de evaluación de resultados. A pesar de esto, la teoría de cambio del Programa permite establecer que desde el diseño del Programa se establece la causalidad de las acciones desarrolladas con el efecto esperado<sup>11</sup>. Además, es de tener presente que en Colombia no se identifica otro tipo de intervenciones que busquen generar efectos similares. Por tanto, razonablemente, el efecto observado de tener una mayor tasa de crecimiento de los beneficios directos se puede relacionar únicamente con el Programa para la Transformación Digital de la CGR.

En relación con lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (2023) resalta que la transformación digital puede mejorar las operaciones fiscales y asegurar el uso óptimo de los recursos públicos ya que reduce errores manuales e incrementa la eficiencia de las transacciones. Además, se menciona que la automatización de procesos soporta la planeación y la asignación de recursos, así como refuerza la capacidad de control y monitoreo de estos. También se cuenta con evidencia empírica de la misma CGR a través de una experiencia piloto, en la cual, sobre la base de un conjunto de nuevas alertas generadas de sobrecostos bajo el contexto de la Pandemia COVID-19, se generaron ahorros por US\$11 millones (CGR, 2020).

Para finalizar, con el objetivo de analizar estrategias alternativas para valorar el impacto del Programa, desde la evaluación intermedia se propusieron tres alternativas. Para cada una de ellas se mencionan los principales hallazgos sobre su implementación para la esta evaluación final.

1. Ampliar la frecuencia de reporte de los indicadores tanto de resultado como impacto a una periodicidad mensual. Los datos reportados en los informes semestrales de seguimiento y en la matriz de seguimiento de los indicadores reportan la información con una periodicidad anual, por lo que esta alternativa no fue viable para esta evaluación.

<sup>10</sup> El modelo cumple con el supuesto de normalidad, y se correo con errores robustos.

<sup>11</sup> La implementación de modelos analíticos genera alertas preventivas haciendo más efectivo y focalizado el control fiscal.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

2. Implementar la metodología antes-después, pero utilizando el método de series de tiempo interrumpidas (Linden & Arbor, 2015). Esta propuesta se sustentaba principalmente en la posibilidad de contar con datos bajo una periodicidad mensual; sin embargo, como ya mencionó, los datos reportados son anuales por lo que los modelos econométricos cuentan con 5 datos a lo más. Como resultado de lo anterior, no fue posible obtener resultados adecuados.
3. Implementar el método de intensidad de tratamiento utilizando la ejecución presupuestal total del Programa. Al plantear el modelo de esa manera, se puede entonces identificar si un mayor nivel de intervención, dado por los recursos invertidos, mejoran o no el indicador definido y por tanto se estaría validando la atribución del Programa. Como supuesto central, la ejecución presupuestal del Programa no responde a factores externos, sino que se da de acuerdo con el presupuesto, que, con los datos de seguimiento analizados, parece un supuesto razonable.

Como se puede deducir de la siguiente tabla, los resultados del modelo de intensidad de tratamiento muestran una asociación positiva y significativa entre la ejecución presupuestal, tanto del componente 2 del Programa como la total, y el indicador de beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante (tanto en valor absoluto como en logaritmo natural – tasas de crecimiento). Es decir, el modelo planteado permite argumentar que un incremento en la ejecución presupuestal del Programa se asocia con una mejora en el beneficio directo (en millones de dólares), que, bajo el supuesto mencionado previamente, lleva a argumentar que dicho cambio se puede atribuir mayoritariamente a la implementación del Programa.

**Tabla 6. Resultados modelo de intensidad de tratamiento<sup>12</sup>**

|                                                                                 | Valor absoluto<br>beneficios | Logaritmo<br>natural<br>beneficios | Valor absoluto<br>beneficios | Logaritmo<br>natural<br>beneficios |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |                              |                                    |                              |                                    |
| <b>Logaritmo natural de la ejecución presupuestal componente 2 del Programa</b> | 897.870*                     | 1,002**                            |                              |                                    |
|                                                                                 | (211.900)                    | (0,144)                            |                              |                                    |
| <b>Logaritmo natural de la ejecución total del Programa</b>                     |                              |                                    | 899.172**                    | 1,009***                           |
|                                                                                 |                              |                                    | (192.136)                    | (0,085)                            |
| <b>Constante</b>                                                                | -12.850,304*                 | -8,717*                            | -13.413,274**                | -9,435**                           |
|                                                                                 | (3.153,873)                  | (2,223)                            | (2.995,497)                  | (1,349)                            |
| <b>Número de observaciones</b>                                                  | 4                            | 4                                  | 4                            | 4                                  |
| <b>R-squared</b>                                                                | 0,888                        | 0,943                              | 0,907                        | 0,975                              |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025)

Además, en la evaluación intermedia se sugirió acompañar los resultados obtenidos de una revisión de literatura de estudios similares que aporten evidencia que soporten los resultados de la

<sup>12</sup> El modelo cumple con el supuesto de normalidad, y se corrió con errores robustos.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

evaluación final. Para dar alcance a lo anterior, previamente se realizó una revisión de literatura en dicho sentido.

### ➤ Resultados del Programa<sup>13</sup>

La medición de resultados del Programa se estructuró alrededor de tres indicadores orientados a capturar los principales cambios esperados en las capacidades institucionales de la Contraloría General de la República. El indicador de resultado 1.1 mide la proporción de solicitudes de información para el control fiscal que son atendidas mediante mecanismos automatizados, reflejando avances en eficiencia operativa y transformación digital. Por su parte, el indicador de resultado 2.1 mide la proporción de productos de control fiscal que incorporan herramientas de analítica de datos, como aproximación al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para apoyar los procesos misionales de la entidad. Finalmente, el indicador de resultado 3.1 mide la proporción de denuncias ciudadanas atendidas dentro de los términos establecidos, capturando mejoras en la capacidad institucional para responder a la ciudadanía y fortalecer los mecanismos de participación y control social.

**H. 2. Los indicadores de resultado muestran mejoras sostenidas durante la implementación del Programa y alcanzan o superan las metas establecidas al cierre de la operación.** La evolución de los indicadores de resultado muestra una mejora sostenida a lo largo del periodo de implementación del Programa. Como se observa en la Ilustración 4, los tres indicadores presentan incrementos importantes respecto a los niveles registrados antes del inicio de la operación y alcanzan o superan las metas definidas en la matriz de resultados al cierre de 2025.


Los cambios más notorios se observan en los indicadores de resultado 2.1 y 3.1. El indicador 2.1 pasó de niveles cercanos al 65% durante 2020 y 2021 a valores superiores al 90% a partir de 2022, manteniéndose por encima de la meta establecida para la operación. De manera similar, el indicador 3.1 registró un aumento desde 37% hasta niveles cercanos al 90%, superando ampliamente la meta prevista y manteniendo una trayectoria estable durante los años posteriores.

Por su parte, el indicador 1.1 presentó una evolución más gradual. Aunque partía de niveles cercanos a cero antes del inicio del Programa, mostró incrementos progresivos durante la implementación hasta alcanzar la meta establecida al cierre de 2025.

<sup>13</sup> Esta sección se relaciona con las PO:

- ¿Cuál ha sido la evolución del indicador I.R.1.1. Proporción de tareas automatizadas durante la implementación del Programa y qué nivel de cumplimiento presenta frente a la meta establecida?
- ¿Cuál ha sido la evolución del indicador I.R.2.1. Proporción de alertas con seguimiento sobre el total de alertas durante la implementación del Programa y qué nivel de cumplimiento presenta frente a la meta establecida?
- ¿Cuál ha sido la evolución del indicador I.R.3.1. Porcentaje de participación ciudadana canalizada por canales digitales durante la implementación del Programa y qué nivel de cumplimiento presenta frente a la meta establecida?

#### Ilustración 4. Comportamiento de los indicadores de resultado del Programa

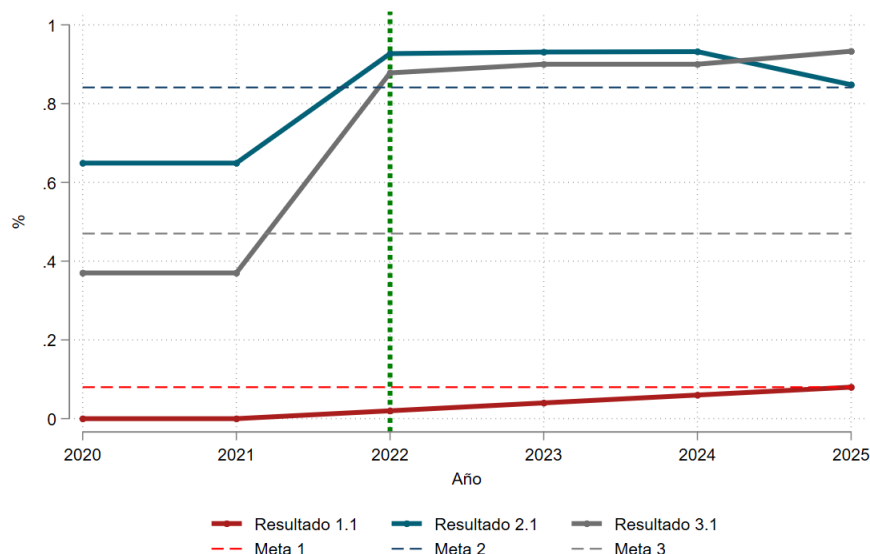

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

Con el fin de complementar el análisis descriptivo, se estimó un ejercicio de series temporales interrumpidas de carácter exploratorio, utilizando una variable dicotómica que identifica el periodo posterior al inicio de la implementación del Programa (2022-2025). Este ejercicio busca evaluar si los indicadores presentan cambios sistemáticos una vez iniciada la ejecución de la operación.

Los resultados muestran coeficientes positivos para los tres indicadores de resultado analizados. En particular, el indicador 1.1 registra un incremento promedio de 5 puntos porcentuales respecto al periodo previo, mientras que los indicadores 2.1<sup>14</sup> y 3.1 presentan aumentos de aproximadamente 26 y 53 puntos porcentuales, respectivamente. En los tres casos, los coeficientes estimados resultan estadísticamente significativos, lo que indica que los niveles observados después de 2022 son sistemáticamente superiores a los registrados antes de la implementación del Programa.

La consistencia entre los resultados econométricos y la evidencia descriptiva fortalece la hipótesis de que los avances observados en los indicadores coinciden temporalmente con la ejecución de la operación. No obstante, dada la naturaleza agregada de la información y el reducido número de observaciones disponibles, los resultados deben interpretarse como evidencia indicativa de asociación temporal.

**Tabla 7. Resultados del modelo antes y después – resultados del Programa**

| Parámetro | Resultado 1.1 | Resultado 2.1 | Resultado 3.1 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
|           | 0.050**       | 0.261***      | 0.533***      |

<sup>14</sup>Se debe tomar con cautela, puesto que se prueba para normalidad y en ese test, se rechaza la H0 de normalidad, pero, a la vez, ese resultado probablemente se asocia al ligero quiebre de tendencia entre el 2024 y 2025 (con pocos datos, la sensibilidad del modelo es muy alta).

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| Parámetro                                  | Resultado 1.1 | Resultado 2.1 | Resultado 3.1 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Inicio de la ejecución del programa (2022) | (0.014)       | (0.022)       | (0.012)       |
| Constante                                  | 0.000         | 0.649***      | 0.370***      |
|                                            | (0.000)       | (0.000)       | (0.000)       |
| ¿Normalidad <sup>15</sup> ?                | Sí            | No            | Sí            |
| Observaciones                              | 6             | 6             | 6             |
| R-squared                                  | 0.625         | 0.947         | 0.996         |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

Como ejercicio complementario, se exploró la relación entre la evolución de los indicadores de resultado y el nivel acumulado de ejecución de los componentes<sup>16</sup> del Programa. Este análisis busca identificar si mayores niveles de avance de la operación se asocian con mejores resultados observados en los indicadores monitoreados.

Los resultados muestran asociaciones positivas y estadísticamente significativas para los indicadores 1.1 y 3.1. En ambos casos, mayores niveles de ejecución acumulada se relacionan con mejores resultados observados, lo que resulta consistente con la hipótesis de que el progreso de la operación contribuyó al fortalecimiento gradual de las capacidades institucionales medidas por dichos indicadores.

En contraste, para el indicador 2.1 no se identificó una asociación estadísticamente significativa con la intensidad de ejecución. Este resultado debe interpretarse con cautela, dado que el indicador alcanzó niveles elevados de cumplimiento desde etapas tempranas de la implementación y mostró una variabilidad limitada durante los años posteriores. En estas condiciones, la capacidad estadística para identificar relaciones entre la ejecución acumulada y la evolución del indicador es naturalmente reducida.

**Tabla 8. Resultados del modelo de intensidad de tratamiento - resultados del Programa**

| Parámetro                                                 | Resultado 1.1 | Resultado 2.1 | Resultado 3.1 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Logaritmo natural de la ejecución del Componente asociado | 0.024**       | -0.038        | 0.054**       |
|                                                           | (0.004)       | (0.033)       | (0.012)       |
| Constante                                                 | -0.289**      | 1.491*        | 0.124         |
|                                                           | (0.056)       | (0.501)       | (0.176)       |
| ¿Normalidad?                                              | Sí            | Sí            | Sí            |
| Observaciones                                             | 4             | 4             | 4             |
| R-squared                                                 | 0.928         | 0.371         | 0.861         |

Fuente: elaboración propia con base en información de (CGR, 2025-II)

<sup>15</sup> La normalidad de los residuos se evaluó mediante la prueba de Shapiro-Wilk, cuya hipótesis nula establece que los datos provienen de una distribución normal. Valores *p* superiores al nivel de significancia adoptado indican que no existe evidencia suficiente para rechazar dicha hipótesis

<sup>16</sup> Para cada resultado se asocia con su componente más directo de ejecución, es decir, el resultado 1 va contra el componente 1 de ejecución.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## ➤ Conclusiones

El análisis de impacto y resultados muestra una evolución favorable de los indicadores asociados al Programa durante su periodo de implementación. En el caso del indicador de impacto, medido a partir de los beneficios directos asociados a la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante, la evidencia descriptiva muestra un incremento posterior al inicio del Programa, pasando de US\$367,3 millones en 2022 a US\$413 millones en 2023, con una reducción parcial en 2024 y una recuperación pronunciada en 2025 hasta alcanzar US\$694,4 millones. Esta trayectoria sugiere una mejora en la capacidad de generación de beneficios asociados al control preventivo y concomitante, aunque con variaciones interanuales que deben ser consideradas en la interpretación del resultado.

Los ejercicios econométricos complementan esta lectura. La metodología antes-después, definida en el Plan de Monitoreo y Evaluación, muestra resultados consistentes con un cambio positivo posterior al inicio de la intervención, especialmente cuando el indicador de impacto se analiza en términos de crecimiento. De manera similar, los ejercicios de intensidad de tratamiento permiten explorar la relación entre la ejecución acumulada del Programa y la evolución de los indicadores, aportando evidencia adicional sobre la asociación entre el avance de la operación y los resultados observados. No obstante, debido a la ausencia de un grupo de comparación, al reducido número de observaciones y al nivel agregado de medición, estos resultados deben interpretarse como evidencia indicativa de asociación temporal y no como una estimación causal estricta del impacto atribuible exclusivamente al Programa.

En relación con los indicadores de resultado, la evidencia es igualmente positiva. Los tres indicadores definidos para capturar avances en capacidades institucionales muestran mejoras durante la implementación y alcanzan o superan las metas establecidas al cierre de la operación. El indicador 2.1, asociado a la incorporación de herramientas de analítica de datos en productos de control fiscal, y el indicador 3.1, relacionado con la atención oportuna de denuncias ciudadanas, presentan incrementos tempranos y sostenidos frente a sus niveles iniciales. Por su parte, el indicador 1.1, correspondiente a la automatización de solicitudes de información para el control fiscal, muestra una trayectoria más gradual, pero alcanza la meta prevista en 2025.

## 3.2. Ámbito evaluativo: análisis económico ex – post del Programa<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Esta sección se relaciona con las PO:

- ¿Se dispone de la metodología, supuestos, parámetros y criterios técnicos necesarios para replicar el análisis económico ex post del Programa con base en la evaluación económica ex ante?
- ¿Los beneficios observados del Programa, medidos a partir del indicador “Beneficios directos de la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante”, permiten una monetización consistente para el análisis económico ex post?
- ¿Cuáles fueron los costos reales de implementación del Programa y en qué medida la información financiera disponible permite organizarlos en un flujo de costos consistente con el análisis económico ex post?
- ¿Los beneficios sociales estimados del Programa superan los costos económicos de implementación, de acuerdo con los indicadores VPN, Razón Beneficio-Costo y TIR?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

El análisis económico ex post del Programa parte de la metodología definida en la evaluación económica ex ante, la cual estimaba los beneficios a partir de una tasa esperada de ahorro fiscal aplicada sobre un universo contractual de referencia. Bajo esa lógica, el beneficio económico se construía como una proporción de ahorro potencial sobre recursos públicos sujetos a control, y posteriormente se comparaba con los costos esperados de implementación del Programa. Esta aproximación era consistente con el indicador de impacto previsto originalmente, pero requiere ajustes para la evaluación ex post, dado que durante la ejecución del Programa el indicador utilizado para el seguimiento de impacto fue modificado.

El indicador vigente corresponde a los beneficios directos asociados a la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante. Esta modificación tiene implicaciones metodológicas relevantes. A diferencia de la formulación ex ante, el indicador actual ya expresa los beneficios en términos monetarios, por lo que no resulta necesario aplicar una tasa de ahorro fiscal sobre una base contractual. Sin embargo, el hecho de que el indicador reporte beneficios directos del control fiscal no implica que la totalidad de dichos beneficios pueda atribuirse exclusivamente al Programa financiado con el crédito BID. Estos beneficios también pueden reflejar capacidades institucionales previas de la CGR, decisiones misionales, acciones ordinarias de control, condiciones sectoriales, cambios en priorización institucional y otros factores no directamente imputables a la operación, como se puede deducir de la matriz de resultado del Programa. Por esta razón, el análisis económico ex post adapta la metodología original mediante dos decisiones.

En primer lugar, se toma como beneficio bruto incremental la diferencia entre el valor observado del indicador de impacto en cada vigencia y la línea base preprograma. Esta decisión permite excluir los beneficios que ya se registraban antes de la implementación de la operación y concentrar la valoración económica en el cambio observado durante el periodo de ejecución. En segundo lugar, sobre dicho beneficio incremental se aplican escenarios conservadores de atribución, con el fin de estimar la proporción del beneficio que podría asociarse razonablemente a la contribución del Programa.

Los escenarios de atribución se construyen a partir de una lectura prudente de literatura análoga sobre fortalecimiento institucional, gestión del desempeño, transparencia, analítica pública y auditoría (Carrillo & Singhal, 2018), (Gerrish, 2016) y (Vogel, 2009). En particular, se adopta un rango de atribución bajo, con valores de referencia mínimos, medios y altos, entendidos como escenarios de contribución plausible y no como estimaciones causales directas. Para los años observados, se utiliza una trayectoria gradual de atribución, consistente con la maduración progresiva del Programa y con la evidencia documental y cualitativa sobre cumplimiento físico, disponibilidad de productos estratégicos y apropiación funcional. Para los años proyectados dentro del horizonte de diez años, se adopta el valor promedio del rango, bajo el supuesto de que las capacidades instaladas continúan generando beneficios, pero sin asumir que el nivel máximo observado al cierre se mantiene indefinidamente.

En cuanto a los costos, el análisis considera la ejecución efectiva del Programa, actualizada y llevada a valor presente bajo los parámetros definidos para el ejercicio económico. La

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

comparación entre beneficios atribuibles y costos permite calcular los indicadores de desempeño económico, incluyendo el Valor Presente Neto, la razón beneficio-costo y, cuando la estructura de flujos lo permite, la Tasa Interna de Retorno. En caso de que la TIR no sea interpretable por la forma de los flujos netos, la lectura económica se concentra en el Valor Presente Neto, la razón beneficio-costo y el análisis de sensibilidad de los escenarios de atribución.

**Tabla 9. Resumen de parámetros usados**

| Parámetro                   | Valor usado                           | Uso en el análisis                             | Justificación                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea base                  | Valor observado en 2021               | Referente para calcular beneficio incremental  | Último año pre-implementación del Programa                                                            |
| Beneficio incremental       | Indicador año t menos línea base 2021 | Base bruta para estimar beneficios atribuibles | Evita imputar beneficios que ya existían antes del Programa                                           |
| Beneficio incierto base     | Promedio de años 2022-2024            | Base para calcular incrementos en años futuros | No se toma año 2025 por su comportamiento atípico en la tendencia                                     |
| Atribución mínima           | 2,5%                                  | Años iniciales / escenario conservador         | Rango bajo informado por literatura análoga sobre efectos parciales de intervenciones institucionales |
| Atribución promedio         | 5,0%                                  | Años proyectados / escenario base              | Valor central del rango de contribución plausible                                                     |
| Atribución máxima operativa | 7,5%                                  | Año de mayor maduración observada              | Asociada al cierre de implementación y evidencia de apropiación funcional                             |
| Sensibilidad alta           | 10,0%                                 | Escenario alternativo                          | No se usa como escenario central por prudencia metodológica                                           |
| Horizonte                   | 10 años                               | Comparabilidad con evaluación ex ante          | Mantiene estándar de análisis económico del diseño                                                    |
| Tasa de descuento           | 12%                                   | Valor presente de costos y beneficios          | Parámetro de referencia del ejercicio económico ex ante                                               |

Fuentes: Elaboración propia con base en (BID, 2021)

### **H. 3. El cambio en el indicador de impacto exige adaptar la metodología ex ante del análisis económico, en el fin de evitar la sobreestimación de beneficios atribuibles al programa**

El análisis económico ex post del Programa requiere adaptar la metodología prevista en la evaluación ex ante, debido al cambio en el indicador utilizado para el seguimiento del impacto. La metodología ex ante estimaba los beneficios económicos a partir de una tasa esperada de ahorro fiscal aplicada sobre un universo contractual de referencia (BID, 2021). Esta aproximación era coherente con la lógica inicial de medición, en la cual el beneficio debía ser construido a partir de un parámetro de ahorro esperado. Sin embargo, el indicador vigente reporta directamente beneficios monetarios asociados a la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante, lo que modifica la forma de estimar los beneficios económicos del Programa.

En este contexto, no resulta metodológicamente adecuado aplicar nuevamente una tasa de ahorro fiscal sobre una base contractual, pues el indicador actual ya expresa beneficios en términos

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

monetarios. No obstante, tampoco sería apropiado imputar la totalidad de dichos beneficios al Programa, dado que estos reflejan resultados institucionales del control fiscal que pueden depender de capacidades previas de la CGR, decisiones misionales, acciones ordinarias de vigilancia, condiciones sectoriales y otros factores no atribuibles exclusivamente a la operación financiada con el crédito BID. Por ello, el análisis económico ex post distingue entre beneficios directos del control fiscal y beneficios atribuibles al Programa.

Para responder a esta diferencia, el ejercicio toma como punto de partida el beneficio incremental frente a la línea base preprograma y aplica escenarios conservadores de atribución. Esta decisión permite excluir los beneficios que ya se registraban antes de la implementación del Programa y concentrar el análisis en la proporción del cambio observado que puede asociarse razonablemente con la contribución de la operación. En lugar de asumir un único parámetro de atribución, se adopta un rango informado por literatura análoga sobre gestión del desempeño público, transparencia en contratación, analítica pública y auditoría, cuyos resultados muestran efectos positivos pero parciales sobre desempeño institucional, eficiencia y cumplimiento (McDevitt, 2022) (Ohashi, 2009).

Bajo esta lógica, el análisis utiliza una trayectoria gradual de atribución para los años observados, consistente con la maduración progresiva del Programa y con la evidencia sobre cumplimiento físico, disponibilidad de productos estratégicos y apropiación funcional al cierre de la operación. Para los años proyectados, se adopta un valor promedio de atribución, bajo el supuesto de que las capacidades instaladas continúan generando beneficios, pero sin asumir que el máximo observado durante la implementación se mantiene indefinidamente. Esta adaptación permite mantener la comparabilidad general con el enfoque ex ante, al tiempo que reduce el riesgo de sobreestimar los beneficios económicos atribuibles al Programa.

#### **H. 4. Bajo escenarios conservadores de atribución, los beneficios económicos atribuibles al Programa supera los costos de implementación, aunque la TIR no se reporta como indicador principal por la estructura de los flujos del ejercicio**

Los resultados del análisis económico muestran que, aun bajo supuestos conservadores de atribución, los beneficios atribuibles al Programa superan los costos de implementación. En los tres escenarios considerados, el valor presente de los costos se estima en aproximadamente US\$15 millones, mientras que el valor presente de los beneficios atribuibles oscila entre US\$32 millones en el escenario conservador plano y US\$58 millones en los escenarios gradual base y gradual favorable. Esto se traduce en valores presentes netos positivos en todos los casos, con un rango entre US\$16 millones y US\$43 millones.

La razón beneficio-costos también muestra resultados favorables. En el escenario conservador plano, que asigna una atribución de 2,5% durante todo el horizonte de análisis, la razón beneficio-costos es de 2,06. Esto implica que, por cada dólar invertido en el Programa, se generarían aproximadamente US\$2,06 en beneficios atribuibles bajo el supuesto más prudente. En los escenarios que incorporan una trayectoria gradual de maduración, la razón beneficio-costos se ubica entre 3,76 y 3,77, lo que refleja una mayor generación de beneficios cuando se reconoce que la

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

contribución del Programa pudo aumentar conforme avanzó la implementación y se consolidaron sus productos estratégicos.

Estos resultados deben interpretarse a la luz de los supuestos de atribución definidos para el ejercicio. El escenario conservador plano mantiene constante una atribución baja de 2,5%, mientras que el escenario base gradual incorpora una trayectoria creciente durante los años observados, consistente con la maduración progresiva del Programa, y utiliza posteriormente una atribución promedio de 5%. El escenario gradual favorable supone una mayor atribución desde los primeros años y una persistencia superior en el periodo proyectado. En todos los casos, los porcentajes aplicados se mantienen en rangos bajos frente al total de beneficios reportados por el indicador de impacto, con el fin de evitar una sobreestimación de los beneficios atribuibles exclusivamente a la operación financiada con el crédito BID.

La Tasa Interna de Retorno no se reporta como indicador principal del ejercicio, debido a que la estructura de los flujos netos no permite obtener una estimación interpretable para los escenarios considerados. En este contexto, la valoración económica se concentra en el valor presente de costos y beneficios, el valor presente neto y la razón beneficio-costos, que son indicadores suficientes para establecer la conveniencia económica del Programa bajo los supuestos definidos.

**Tabla 10. Resumen del ejercicio de beneficios económicos bajo 3 escenarios**

| Escenario         | Descripción de la atribución    | Valor presente de los costos (M USD) | Valor presente de los beneficios (M USD) | Valor presente neto (M USD) | Razón beneficio-costos USD | TIR social |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Conservador plano | 2,5% todos los años             | 15                                   | 32                                       | 16                          | 2,06                       | NA         |
| Base gradual      | 2,5%; 3,5%; 5%; 7,5% y luego 5% | 15                                   | 58                                       | 42                          | 3,76                       | NA         |
| Gradual favorable | 5% al inicio y luego 7,5%       | 15                                   | 58                                       | 43                          | 3,77                       | NA         |

Fuentes: Elaboración propia

## ➤ Conclusiones

El análisis económico ex post del Programa requirió ajustar la metodología prevista en la evaluación ex ante, debido al cambio en el indicador utilizado para el seguimiento del impacto. Mientras la aproximación original estimaba beneficios a partir de una tasa esperada de ahorro fiscal aplicada sobre un universo contractual, el indicador vigente reporta directamente beneficios monetarios asociados a la efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante. Esta modificación hizo necesario distinguir entre beneficios directos del control fiscal y beneficios atribuibles al Programa, con el fin de evitar una sobreestimación de la contribución económica de la operación.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

A partir de esta adaptación, el ejercicio tomó como base el beneficio incremental frente a la línea base preprograma y aplicó escenarios prudentes de atribución. Los resultados muestran que, incluso bajo el escenario conservador plano, los beneficios atribuibles superan los costos de implementación del Programa. En dicho escenario, el valor presente de los beneficios se estimó en US\$32 millones frente a costos por US\$15 millones, con un valor presente neto de US\$16 millones y una razón beneficio-costos de 2,06. En los escenarios graduales, que reconocen una mayor maduración de la contribución del Programa durante la implementación, la razón beneficio-costos se ubica alrededor de 3,76, con valores presentes netos superiores a US\$42 millones.

Estos resultados sugieren que el Programa presenta un balance económico favorable bajo los supuestos definidos. No obstante, su interpretación debe mantenerse vinculada al enfoque de contribución adoptado en el análisis: los beneficios monetizados por el indicador de impacto reflejan resultados institucionales amplios del control fiscal, por lo que no pueden imputarse en su totalidad a la operación financiada con el crédito BID. En este sentido, la principal fortaleza del ejercicio es mostrar que la conveniencia económica se sostiene aún bajo atribuciones parciales y conservadoras; su principal limitación es que depende de supuestos de atribución informados por literatura análoga y por la maduración observada del Programa, más que de una estimación causal directa del beneficio económico atribuible.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

### 3.3. Ámbito evaluativo: cumplimiento

A continuación, se presenta el avance de resultados asociados al ámbito de cumplimiento considerando los criterios de evaluación de relevancia, efectividad y sostenibilidad.

#### 3.3.1. Análisis de relevancia

Esta sección tiene como objetivo analizar la gestión del Programa e identificar si sus productos fueron pertinentes y coherentes con las necesidades institucionales de la CGR, para así contribuir a incrementar la efectividad del control fiscal (preventivo y concomitante), a mejorar la transformación digital, el proceso de monitoreo y seguimiento de la información, y la participación ciudadana.

Para este fin, de acuerdo con la matriz de consistencia y dando continuidad a la evaluación de medio término (Econometría SAS, 2025), este análisis revisa si el Programa aporta a resolver las necesidades de las personas usuarias<sup>18</sup> que hayan surgido en este segundo periodo de ejecución desde 2025; si estuvo alineado con la estrategia del BID para Colombia, particularmente para el periodo 2024 – 2027 (BID, 2024)<sup>19</sup>, y frente a la estrategia institucional de la CGR establecida en el Plan Estratégico de la CGR 2022 – 2026.

#### ➤ Diseño del Programa (lógica vertical)<sup>20</sup>

**H. 5. Desde el diseño del Programa, los productos e hitos han sido coherentes con las necesidades institucionales que dieron lugar a su origen.** Con la evaluación de medio término (Econometría S.A.S, 2025, p. 23) se identificó que lo gestionado por cada componente estaba alineado con la estrategia de transformación digital formulada por la CGR.

En efecto, se indicó *“en relación con los componentes 1 de Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital y 2 de Fortalecimiento de herramientas digitales para el control (...) se previeron actividades y productos como la formulación de la estrategia de transformación digital, modelo de gobierno de datos con estándares que faciliten la desagregación de datos con enfoque poblacional, implementación de un modelo de gestión de derechos digitales,*

<sup>18</sup> Para este análisis, se consideran dos tipos de personas usuarias, uno de carácter institucional y otro de carácter externo, lo cual se establece desde el alcance de los componentes. Para el Componente 1, serán aquellas que desarrollan las capacidades analíticas para la transformación digital y que en la práctica lo comprende la Oficina de Sistemas e Informática, la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI) y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Si bien las áreas misionales de la CGR son usuarias de la gestión de los riesgos en el control fiscal, las necesidades de estas áreas son canalizadas a través de la DIARI para su implementación. Para el Componente 2, las personas usuarias son las áreas usuarias, la Oficina de Planeación, así como también la Oficina de Sistemas e Informática, la USATI y la DIARI. Para el Componente 3, se consideran como personas usuarias los actores institucionales que gestionan cada hito y producto de este componente, a los cuales se suman la ciudadanía y, particularmente, los pueblos indígenas, afrocolombianos, personas con discapacidad y otras poblaciones diversas.

<sup>19</sup> La alineación del Programa desde su diseño con la estrategia del BID 2019 y 2022 se analizó en la evaluación de medio término.

<sup>20</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿En qué medida los productos del Programa fueron pertinentes y coherentes con las necesidades institucionales de la CGR para contribuir a incrementar la efectividad del control fiscal (preventivo y concomitante), mediante mejoras en transformación digital, monitoreo y seguimiento de la información, y participación ciudadana?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

*seguimiento y control institucional a partir de datos que son objeto de aplicación de herramientas tecnológicas para lograr mayor trazabilidad, y calidad de los datos publicados y producción de analítica para la vigilancia y el control fiscal” (Econometría SAS, 2025).*

Incluso, se concluyó en la citada evaluación, que la inclusión de acciones para lograr el cambio cultural frente a la adopción de la transformación digital, así como la definición de criterios en materia de género y diversidad como facilitadores del control fiscal, evidenció relevancia para comprender y atender necesidades y requisitos de personas usuarias internos de la CGR y de la ciudadanía. Lo anterior se ratifica en relación con el Componente 3 que contribuye a mejorar las veedurías ciudadanas, promover la transparencia y la integridad.

A su vez, también se observa que la ejecución del Programa ha sido relevante frente a lo que el documento CONPES 4045 de 2021 estipuló. Quienes tuvieron bajo su responsabilidad la ejecución del Programa fueron específicos al señalar que las contrataciones estuvieron guiadas por lo que este documento de política señalaba: *“a través de las adquisiciones (...) permitió que cada producto, desde el mismo CONPES, apuntara directamente a cumplir con la efectividad del control fiscal”* (entrevista, 2026).

Se logra así evidenciar una alineación del diseño de la lógica vertical del Programa tanto con las necesidades ciudadanas como con la agenda del BID en Colombia, que en línea con lo identificado en la evaluación de medio término, y luego de revisar tanto el ISP II - 2025 (CGR, 2025), hay una contribución clara con la estrategia del BID que expone beneficios esperados de la transformación digital. Esto se expone por el BID en su Guía de transformación digital del gobierno (BID, 2022), *“ciudadanos que quieren interactuar con el gobierno en línea para acceder a la información y los servicios que necesitan (...) instituciones públicas eficaces en su propósito”*<sup>2</sup>.

En adición, al valorar la percepción de las personas entrevistadas, estos avances en relevancia requieren fortalecerse en relación con las condiciones para la sostenibilidad en lo tecnológico y el capital humano. Esto debido a que se manifestó que, ante las necesidades de tecnología, el talento humano confundía los fines de la transformación digital con la dotación de elementos de cómputo: *“la transformación digital es un simple cambio de computadores o la instalación de software”* (entrevista, 2026). Sin querer indicar una falla pues los resultados en efectividad son claros, si es necesario mantener los esfuerzos en la dinamización de conceptos propios de la arquitectura empresarial para fortalecer la confianza hacia las nuevas herramientas. Esto en las voces de las personas entrevistadas, exige un esfuerzo mayor en gestión de cambio.

Finalmente, el diseño del Componente 3 es pertinente pues aporta a la consolidación del fortalecimiento institucional de la CGR que se ha logrado en vigencias anteriores a través de la incorporación del enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos) (BID, 2021c, pág. 9) en las estrategias de gestión del cambio y de formación digital, también bajo ejecución del Programa y en línea con lo definido en el Componente 1.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

**H. 6. El enfoque de género y diversidad se reporta como cumplido en relación con la gestión de cambio en el marco del Componente 3. Adicionalmente, la entidad avanzó en 2026 en la implementación de un protocolo frente a este tema. Sin embargo, su diseño transversal al componente 1 no se observa cumplida, a lo que suma el bajo conocimiento práctico que se tiene en el equipo de la entidad.**

El Programa desde su diseño, propuso estrategias para el cierre de brechas de género, las cuales fueron desagregadas por componente (BID, ND). Se describen a continuación:

**Componente 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales para la transformación digital.** Los productos sobre datos deberán incluir la definición de metadatos para su desagregación por criterios de género y poblaciones diversas (población indígena, población afrocolombiana, población con discapacidad y otras poblaciones diversas). Se prevé una contribución al direccionamiento de acciones de control fiscal orientadas a atender necesidades específicas de esta población.

**Componente 3: Enfoque ciudadano e integridad.** Se plantearon las siguientes estrategias buscando una mayor participación ciudadana e integridad en el ciclo de control fiscal mediante:

- El diseño e implementación de una estrategia para la atención, acercamiento y participación ciudadana, incluyendo las necesidades para cerrar la brecha de género y diversidad; esta estrategia contará con la participación de organismos de la sociedad civil que trabajen con estos grupos de población para tomar en cuenta las necesidades diferenciales y las barreras que enfrentan al querer participar en los asuntos relacionados con la C.G.R.
- Apoyar la implementación de una metodología para auditar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en el Objetivo 5 sobre Igualdad de Género. Esta actividad permitirá determinar en qué medida se cumplen los objetivos, los planes, los programas y los proyectos que están orientados a promover la igualdad de género y de qué manera se ejecutan los recursos públicos con este mismo fin. Por lo tanto, la CGR rendirá cuentas sobre los avances que contribuyan a disminuir la brecha de desigualdad de género al interior de la CGR, y en otras entidades del gobierno.
- Desarrollo de un tablero de control específico de género y diversidad para el seguimiento y control de indicadores relevantes para la institución. A partir de la desagregación por género y diversidad de la información de la C.G.R, se podrá formular indicadores que sean relevantes para la entidad y para las distintas direcciones de la C.G.R. De esta manera, se podrá conocer mejor las características de la población, hacer seguimiento a los avances o retrocesos para la rendición de cuentas y formular políticas públicas con enfoque diferencial para atender mejor a las necesidades de la población.
- Diseño e implementación de estrategia con enfoque de género y diversidad para la gestión cultural del cambio y la transformación digital. El objetivo de esta estrategia es el fortalecimiento del uso, la innovación y la adopción de herramientas digitales de control fiscal por parte de las y los funcionarios públicos considerando las barreras existentes que enfrentan las mujeres y las

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

poblaciones diversas al disfrute de este tema. Esta estrategia contara con actividades de comunicación y sesiones de capacitación dirigidas a mujeres funcionarias y a funcionarios/as que estén ubicados en territorios donde se encuentre la mayor concentración de población indígena y afrocolombiana.

En el ISP II - 2025 (CGR, 2025), se reporta cumplido el producto 3.7 *“Estrategia de gestión cultural del cambio y de formación digital continua, transversal a los tres componentes de esta operación, con enfoque de género y diversidad (pueblos indígenas y afrocolombianos), diseñada e implementada”*. Se reporta que se cuenta con la estrategia diseñada en 2023 que en 2025 fue complementada para mejorar el uso de herramientas y tecnologías de información y productividad.

En adición, se ha identificado por la evaluación que en el SIGECI hay definido y publicado un “Protocolo para la eliminación de las diferentes formas de violencia de género y por otras razones en la CGR” (CGR, 2026), como parte del maestro documental de la Gestión del Talento Humano (CGR, 2026).

Sin embargo, es de indicar que, al indagar a los actores sobre temas específicos relacionados con la aplicación del enfoque de género, no se reportan acciones concretas que hayan sido implementadas como resultado del Programa e incluso, llamó la atención que al preguntar por el cumplimiento del ODS 5, no se indicara nada relacionado con la Igualdad de Género en la implementación del control fiscal o de algún tipo de auditoría especial.

#### ➤ **Arreglo institucional y alineación con la misión de la CGR<sup>21</sup>**

**H. 7. Las sesiones del CGP evidencian una gobernanza activa y comprometida, que ha respondido a los riesgos identificados con acciones concretas; cabe expresar que la conversión del CGP en una instancia permanente de la CGR es una decisión prioritaria para garantizar que los logros del Programa no dependan de la continuidad del financiamiento externo.**

Se logra identificar que lo plasmado en el ROP en relación con el marco institucional y esquema de ejecución se cumple. La gobernanza y los roles de los actores se han desarrollado conforme el diseño planteado, creando un mecanismo de cumplimiento a las herramientas de planificación y gestión que el Programa requiere. Además, las voces de los actores se unen al manifestar que la Unidad Ejecutora del Programa, su Gerencia y especialistas en temas financiero, planeación y monitoreo, adquisiciones y tecnologías de la información, han sido pilares para la consecución de metas.

A su vez, el Comité de Gestión del Programa que se creó con la Resolución Organizacional OGZ-0792-2021 de 2021 y que se modificó con la Resolución Organizacional OGZ – 0820 - 2023 de

---

<sup>21</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿Cómo el arreglo institucional definido para el Programa, en particular la Unidad Ejecutora y el Reglamento Operativo, fue pertinente y suficiente para orientar su ejecución, coordinación y seguimiento dentro de la CGR?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

2023, se reconoce como una instancia que ha logrado armonizar la toma de decisiones y planificar con estabilidad y de forma articulada con el Plan Estratégico de la Entidad.

De acuerdo con la información analizada en los informes semestrales, el CGP se ha reunido 11 veces desde 2022. El último registro de reunión muestra una sesión en diciembre de 2025 y enero de 2026, en el cual se hace el balance final de la ejecución, el estado de la evaluación final (actualmente en ejecución); se abordan temas en relación con la sostenibilidad institucional y de preparación para el cierre del Programa. Se registra como necesario la emisión de un acto administrativo que institucionalice el Comité de Transformación Digital de la CGR como instancia permanente, así como la necesidad de finalizar el Plan de Sostenibilidad Institucional antes del cierre del Programa. En el Anexo 1 se puede observar un resumen de temas tratados por sesión.

**H. 8. Desde el diseño, las auditorías a la gestión del Programa han facilitado el cumplimiento de objetivos.** De acuerdo con lo documentado en los informes semestrales, la gestión del Programa ha desarrollado las auditorías conforme lo define el Reglamento Operativo del Programa (ROP) (BID, 2021, pág. 19).

Para los periodos 2022 y 2023, y según fue citado en el informe de evaluación de medio término (Econometría SAS, 2025), se efectuaron los correspondientes ejercicios de auditoría externa. La auditoría de los estados financieros del Programa calificó de forma satisfactoria la gestión debido al cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Documentación soporte y contabilidad de los desembolsos y su pertinencia;
- Segregación de funciones en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los pagos;
- Proceso de conciliación de la cuenta bancaria y depuración de partidas conciliatorias;
- Conciliación del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversión acumulada;
- Exactitud en el registro de gastos;
- Integridad, exactitud de la aplicación y conversión de la tasa de cambio con norma BID.

Se concluyó a su vez que no se observaron deficiencias significativas en el sistema de control interno (KPMG, 2023).

Para la auditoría del periodo 2024, en el ISP 2025 – I, se reporta la ejecución de la primera fase del ejercicio auditor, a través de la contratación de la firma BDO AUDIT S.A.S BIC mediante el contrato de auditoría CGR-BID-032-2024. Esta auditoría se realizó a los Estados Financieros del Programa de Transformación Digital, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024. La segunda fase, periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, se ejecutó a través de un contrato con esta misma firma que se celebró el 6 de marzo de 2025 (contrato de auditoría CGR-BID-007-2025).

Una vez enviado el informe de la vigencia 2024 al BID, este manifestó la siguiente observación:

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

*“Complementar el informe incluyendo “el detalle de los procesos de contratación que presente mínimamente la siguiente información: Número del contrato, Nombre del contratista o empresa, monto contratado, fecha de vigencia, monto de oferta ganadora, monto pagado en contratos finalizados, monto pagado hasta el momento en contratos en ejecución que presente en lo posible, la identificación de los procesos revisados con el número asignado en el Plan de Adquisiciones”” (CGR, 2025).*

Esta observación se responde a través de un alcance al informe que se formalizó ante el BID el 4 de junio de 2025 (CGR, 2025, pág. 28).

Para el periodo 2025, se reportó en el ISP 2025 - II, que se encuentra en trámite la suscripción del contrato de auditoria con la firma Auditora BDO AUDIT S.A.S para el desarrollo de la fase II de la auditoria correspondiente a la vigencia 2025. Esto, en cumplimiento de la cláusula 5.02 Capítulo V de las estipulaciones especiales y el artículo 7.3 capítulo VII de las normas generales del contrato de Préstamo. La ejecución de la auditoría por fases de expuso en el ISP 2025 - I.

En este ejercicio de evaluación, se ratifica lo identificado en 2024 sobre el cumplimiento del requisito de presentación de informes conforme lo define el Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo del Programa en la calidad y contenido requerido, así como cumplimiento de parámetros de gestión financiera para garantizar la calidad de los informes financieros.

Finalmente, en abril de 2026, se presentó al BID por parte de la UEP, el informe de auditoría sobre los estados financieros, de aseguramiento razonable independiente y de auditoría sobre el control interno, correspondiente al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, elaborados por la firma BDO Audit S.A.S – BIC. Este informe concluye cumplimiento en materia del proceso de adquisiciones y contrataciones:

*“Los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el “Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República” en el marco del Contrato de préstamo No. 5385/OC-CO, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2025 son adecuadas, en todos los aspectos materiales, según los criterios aplicables” (UEP CGR , 2026) (subraya por fuera de texto).*

También hay cumplimiento en materia de Estados Financieros, específicamente del Estado de Efectivo recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas a 31 de diciembre de 2025:

*“Consideramos el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas con sus respectivas notas explicativas y los registros contables de la Contraloría General de la República para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo No. 5385/OC-CO, las bases de*

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

*contabilidad descritas en la Nota 2 de los Estados Financieros de Propósito Especial y el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa del Banco” (UEP, 2026) (subraya por fuera de texto).*

Finalmente, se declara cumplimiento de lo relacionado con el control interno del Programa, consistente con lo identificado en el análisis de efectividad:

*“No observamos asuntos relacionados con la estructura del sistema de control interno y su operación que consideramos sea una deficiencia significativa” (UEP, 2026).*

### ➤ Conclusiones

En relación con el arreglo institucional previsto para el Programa y que desarrolla el Reglamento Operativo, su contribución, tanto desde el análisis documental como reconocido por los actores entrevistados radica en que se constituyó como la carta de navegación que facilitó el cumplimiento. Este ejercicio brindó seguridad jurídica y procedimental al Programa y a la CGR, debido a la claridad del rol de cada miembro de la Unidad Ejecutora y al rol y funcionamiento tanto del CGP como de las áreas de la CGR, lideradas por el despacho del Vicecontralor, lo que a su vez facilitó la alineación estratégica del Programa con la estrategia institucional. A su vez, es reconocido por las personas entrevistadas que la entidad ha logrado acumular capacidades de apoyo en la gestión contractual, administrativa y financiera.

Las personas entrevistadas y el análisis efectuado al arreglo institucional muestran que la UEP actuó como un articulador técnico, que facilitó la estructuración de necesidades desde la realidad de las áreas de la CGR, lo que facilitó la apropiación y garantizó que la tecnología respondiera a la misionalidad. Además, se reconoció por la CGR la experiencia del equipo consultor.

En relación con el aporte del Programa a la misión de la CGR, se reconoce la capacidad del mismo para transformar el paradigma del control fiscal, lo que a su vez muestra efectos positivos en la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2019. La calidad y oportunidad de la información que se logra con el Programa fortalece el control preventivo y concomitante y, por ende, el beneficio es mayor para el país. A su vez, con los avances en el Componente 3, se fortalece la incidencia ciudadana que suma a los fines de una mejor información para el control. Las personas entrevistadas se ratifican en que el Programa ha logrado aportar a esta calidad de la información a partir de la evidencia científica que ofrece la cultura de los datos y la analítica.

Esta relevancia se apalanca con la consolidación de la DIARI (Dirección de Información y Reacción Inmediata) creada en 2021 y el Laboratorio Forense y Almacén de Evidencias, que aporta a la confiabilidad, velocidad y custodia segura de acervos probatorios. A esto suma la mejora en la participación ciudadana que ayudó a integrar a regiones apartadas, logrando mejorar la gestión de respuesta a quejas y denuncias a través de canales digitales directos.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

En complemento, los informes de auditoría efectuados en el marco del Contrato de Préstamo aplican lo descrito en el Reglamento Operativo, ratificando las capacidades logradas tanto por la UEP como por la CGR para cumplir las normas que guían estas operaciones de crédito.

### 3.3.2. Análisis de efectividad

La efectividad del Programa se analiza como el grado en que los productos, resultados y mecanismos previstos por la operación lograron materializarse y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en su diseño. En concordancia con la matriz de consistencia y con los criterios utilizados en la evaluación intermedia, este análisis considera tanto el nivel de ejecución física y financiera de los productos como la evidencia disponible sobre su implementación, apropiación institucional, procesos de contratación y mecanismos de seguimiento y control.

El análisis se fundamenta en la triangulación de información documental, cuantitativa y cualitativa. Para ello se consideraron informes semestrales de progreso, matrices de seguimiento físico-financiero, estados financieros, documentación técnica del Programa, fichas de indicadores, reportes de avance y resultados de las entrevistas institucionales realizadas en el marco de la evaluación. Esta combinación de fuentes permite contrastar el cumplimiento reportado en los instrumentos de seguimiento con la percepción de los actores consultados sobre la implementación, uso, apropiación y condiciones de sostenibilidad de los productos desarrollados.

Los hallazgos identificados muestran, en términos generales, altos niveles de cumplimiento físico de los productos previstos, una trayectoria de ejecución financiera consistente con la naturaleza de los procesos de transformación digital impulsados por la operación, evidencia de apropiación funcional diferenciada de varios desarrollos estratégicos y la existencia de mecanismos formales de seguimiento y control. Asimismo, la triangulación permite identificar restricciones técnicas, contractuales e institucionales que incidieron en la implementación, así como condiciones de cierre administrativo, contractual y financiero propias de una operación de esta naturaleza.

#### ➤ Cumplimiento de productos y avance físico<sup>22</sup>

**H.9. La matriz físico-financiera muestra un cumplimiento físico alto frente a la programación ajustada de los productos sustantivos del programa.** Al cierre de 2025, el avance físico agregado alcanzó el 100,0% de los productos previstos, lo que refleja un nivel de ejecución de la totalidad de los compromisos establecidos para los componentes misionales de la operación.

El análisis por componente muestra que los Componentes 1 (Fortalecimiento de capacidades institucionales) y 3 (Fortalecimiento de la participación ciudadana y transparencia) alcanzaron el cumplimiento total de los productos programados. Por su parte, el Componente 2 (Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal) también registro un nivel de cumplimiento de

<sup>22</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿En qué medida se cumplieron los productos del Programa de acuerdo con la Matriz de Resultados, los informes de avance y los hitos previstos durante su implementación?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

100%. Como resultado, el Programa logró materializar prácticamente la totalidad de los productos previstos en la programación ajustada.

**Tabla 11. Nivel de cumplimiento físico acumulado del Programa**

| Componente                                                                 | Nivel de cumplimiento físico |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 (Desarrollo e implementación de la estrategia de transformación digital) | 100%                         |
| 2 (Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal)   | 100%                         |
| 3 (Enfoque ciudadano e integridad)                                         | 100%                         |
| Total                                                                      | 100%                         |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)


#### **H. 10. La evolución del cumplimiento físico muestra un patrón de crecimiento acelerado y una concentración de entregables durante las fases finales de implementación del Programa.**

La evolución del cumplimiento físico de los productos muestra una trayectoria de crecimiento acelerado a lo largo del periodo de implementación, alcanzando niveles cercanos al cumplimiento total al cierre de 2025. Como se observa en la Ilustración 5, el avance físico agregado pasó de niveles incipientes en las primeras etapas de ejecución a una expansión sustancial durante los dos últimos años del Programa, pasando de 10,3% en 2023 a 55,2% en 2024 y alcanzando finalmente un 100,00% en 2025.

Este comportamiento evidencia que una parte importante de los productos y entregables previstos se materializó durante las fases finales de implementación. En particular, el crecimiento observado entre 2024 y 2025 refleja la entrada en operación y culminación de múltiples iniciativas asociadas a fortalecimiento institucional, herramientas digitales para el control fiscal y mecanismos de participación ciudadana, las cuales habían requerido previamente actividades de diseño, estructuración técnica, contratación, desarrollo tecnológico y articulación institucional.

La trayectoria observada sugiere que una proporción importante de los productos y entregables del Programa se consolidó durante las fases finales de implementación. Este comportamiento refleja una dinámica en la cual las actividades de diseño, estructuración técnica, contratación y desarrollo precedieron la materialización de los productos finales, generando una aceleración progresiva del cumplimiento físico conforme los distintos componentes alcanzaron etapas más avanzadas de ejecución.

**Ilustración 5. Ejecución física acumulada del Programa – vigencias**

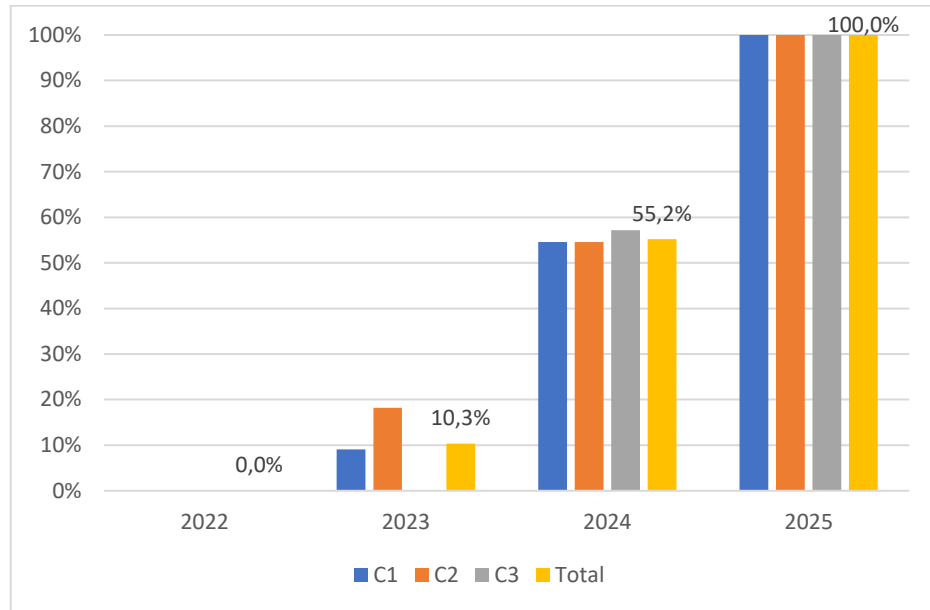

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

**H. 11. Los productos estratégicos ejecutados se encuentran alineados con los principales mecanismos de cambio previstos en la lógica de resultados del Programa.** La revisión de los productos ejecutados evidencia que los principales avances del Programa se concentran en iniciativas que, desde su diseño, fueron concebidas como mecanismos habilitadores para el logro de los resultados esperados (CGR, 2025). En particular, los productos asociados a automatización de procesos, analítica de datos, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y participación ciudadana corresponden a intervenciones que ocupan una posición central dentro de la lógica de resultados del Programa.

Esta conclusión encuentra sustento en la evaluación de medio término (Econometría SAS, 2025), la cual identificó como proyectos estratégicos la automatización de procesos (Producto 1.5), el modelo de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante (Producto 2.5), el modelo de Data Lake basado en Big Data (Producto 2.6), la gestión e infraestructura TIC (Producto 2.8) y la estrategia de atención y participación ciudadana (Producto 3.1). Dichos productos fueron objeto de seguimiento específico debido a su relevancia para materializar los objetivos de fortalecimiento institucional, mejora de la eficacia del control fiscal y promoción de la participación ciudadana.

Es importante recalcar que el Programa entonces, no se centró en actividades operativas o de apoyo, sino en productos estrechamente vinculados con las transformaciones institucionales que el Programa buscaba generar. Por consiguiente, el alto nivel de cumplimiento alcanzado adquiere especial relevancia, pues corresponde a intervenciones que constituyen la base funcional para el desarrollo de capacidades institucionales, el fortalecimiento de las herramientas digitales de control fiscal y la consolidación de mecanismos de interacción con la ciudadanía.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

La información cualitativa recogida en las entrevistas complementa esta lectura documental al mostrar que varios de los productos ejecutados son percibidos por los actores institucionales como desarrollos funcionales para el fortalecimiento de la gestión misional de la CGR. En las entrevistas se mencionó, por ejemplo, la utilidad de herramientas asociadas al Data Lake, la interoperabilidad de sistemas, el seguimiento de proyectos y sectores no priorizados previamente, el fortalecimiento de capacidades de análisis, la ciberseguridad, la trazabilidad de información y el apoyo a las contralorías delegadas. Esta evidencia cualitativa sugiere que el cumplimiento físico reportado no se limita a la entrega formal de productos, sino que incluye desarrollos que han comenzado a cumplir funciones concretas dentro de distintos procesos institucionales.

La consulta virtual refuerza esta lectura, en la medida en que la totalidad de los participantes manifestó estar de acuerdo (25%) o totalmente de acuerdo (75%) con que los productos desarrollados respondieron a las necesidades institucionales de su dependencia. Asimismo, la valoración sobre la funcionalidad de los productos fue mayoritariamente positiva (66,7% totalmente de acuerdo y 13,8% de acuerdo).

#### ➤ Ejecución presupuestal y avance<sup>23</sup>

### **H. 12. La ejecución financiera antecedió el avance físico de los productos durante parte de la implementación, aunque ambas dimensiones convergieron hacia el cierre del Programa.**

La comparación entre el avance físico acumulado y la ejecución financiera acumulada evidencia que ambas dimensiones siguieron trayectorias diferenciadas durante buena parte de la implementación del Programa. Como se observa en la Ilustración 6, la ejecución financiera mostró un comportamiento más acelerado en las etapas iniciales, alcanzando un avance acumulado de 18,9% en 2022 y 34,3% en 2023, mientras que el avance físico acumulado se ubicó en 0,0% y 10,3%, respectivamente.

La diferencia observada entre ambas trayectorias se redujo progresivamente a medida que avanzó la implementación. En 2024, la ejecución financiera acumulada alcanzó el 64,9% frente a un avance físico acumulado de 55,2%, mientras que al cierre de 2025 los niveles de ejecución convergieron hacia valores elevados, registrando un avance financiero acumulado de 84,7% y un cumplimiento físico acumulado de 100%

Al cierre de 2025, la ejecución financiera acumulada ascendió a USD 18,7 millones frente a un presupuesto ajustado de USD 22,1 millones, mientras que el cumplimiento físico alcanzó el 100% de los hitos programados. Estos resultados evidencian que la mayor parte de los productos previstos fue efectivamente implementada, aunque la ejecución financiera aún presentaba recursos pendientes de ejecutar o justificar en el marco de las actividades de cierre de la operación.


La información cualitativa recogida en las entrevistas es consistente con esta lectura. Los actores consultados señalaron que, en términos generales, la asignación presupuestal fue suficiente para

<sup>23</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿Qué relación se observa entre la ejecución presupuestal del Programa, el avance físico de sus productos y el avance sustantivo de sus resultados?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

atender los requerimientos de la operación y que en las distintas vigencias se contó con los recursos solicitados para avanzar en los contratos asociados al cumplimiento de los componentes del préstamo. En ese sentido, las tensiones identificadas no se relacionaron principalmente con insuficiencia de recursos, sino con la temporalidad de la ejecución, los procesos de contratación, la programación de caja y la gestión de recursos que no alcanzaron a comprometerse dentro de una vigencia determinada.

**Ilustración 6. Avance físico presupuestal del Programa – vigencias**

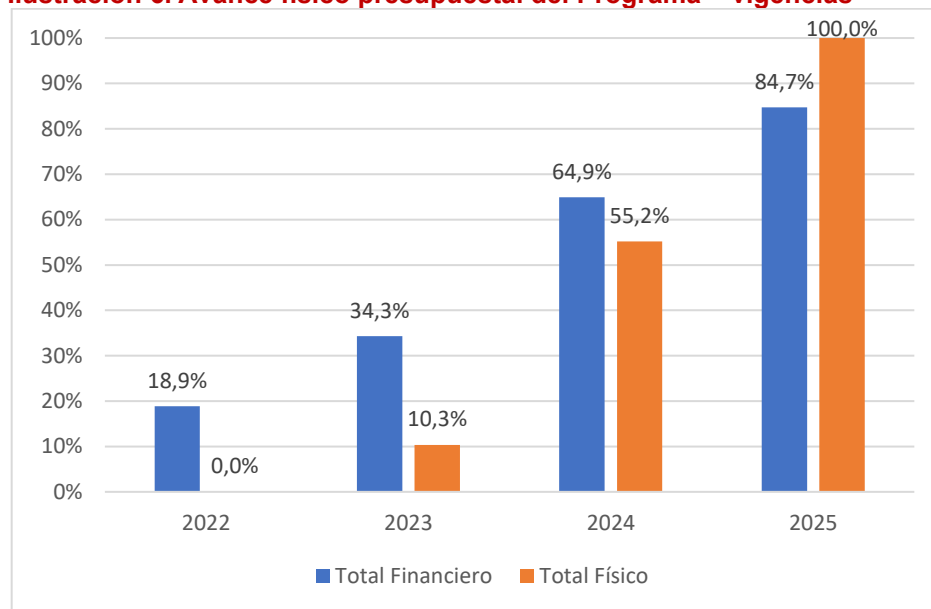

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

**H. 13. El Programa alcanzó un alto nivel de cumplimiento físico con una ejecución esperada inferior al monto total aprobado del préstamo, lo que exige distinguir entre ejecución acumulada, reservas, presupuesto de cierre y recursos estimados a liberar.** El análisis financiero de cierre muestra que el Programa no requeriría la totalidad del monto aprobado del préstamo para culminar la operación. Si bien el contrato de préstamo fue aprobado por USD 30 millones, al 31 de diciembre de 2025 la ejecución acumulada ascendía a USD 18.723.228,88. A este valor se suman una reserva presupuestal por pagar equivalente a USD 2.671.746,26 y un presupuesto aprobado para la vigencia 2026 equivalente a USD 720.998,89, con lo cual el monto esperado de uso efectivo de recursos se ubicaría alrededor de USD 22,1 millones<sup>24</sup>.

En las entrevistas también se indicó que los recursos no ejecutados no deberían interpretarse, por sí mismos, como evidencia de incumplimiento de productos. Los actores consultados señalaron que esta diferencia puede explicarse por varios factores, entre ellos procesos de contratación suscritos por valores inferiores a los estimados inicialmente, variaciones asociadas

<sup>24</sup> Con base en información del (CGR, 2025)

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

a la tasa de cambio, recursos no comprometidos por restricciones de tiempo y la existencia de saldos asociados al cierre financiero de la operación.

En consecuencia, el ISP 2025 - II señala que los productos y metas reportados por el Programa presentan niveles de cumplimiento cercanos o equivalentes al total previsto, aun cuando permanecen recursos asociados a reservas presupuestales, pagos pendientes y actividades de cierre.

La lectura de este resultado debe realizarse con cautela. La diferencia entre el monto total aprobado del préstamo y el monto esperado de uso efectivo no debe interpretarse automáticamente como eficiencia presupuestal ni como subejecución problemática. De forma inicial, constituye un elemento que requiere distinguir entre ejecución acumulada, compromisos, pagos, justificaciones ante el Banco, reservas por pagar, presupuesto de cierre y recursos estimados a liberar. En este sentido, la información disponible sugiere que el Programa alcanzó altos niveles de cumplimiento físico con una demanda efectiva de recursos inferior al monto inicialmente aprobado.

**H. 14. La ejecución financiera presenta diferencias entre componentes, aunque los componentes sustantivos alcanzan altos niveles de cumplimiento físico.** La ejecución financiera del Programa presenta diferencias entre componentes, aunque aquellos con productos sustantivos registran niveles elevados de cumplimiento físico.

Como se observa en la Tabla 12, los componentes 1, 2 y 3 alcanzaron avances físicos de 100,0%, 100% y 100,0%, respectivamente, mientras que sus niveles de ejecución financiera se ubicaron entre 85,0% y 94,2% del presupuesto ajustado.

El componente 3, orientado al fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia, presenta la mayor ejecución financiera relativa (94,2%), acompañada de un cumplimiento físico total de los productos programados. Por su parte, los componentes 1 y 2 registran niveles de ejecución financiera cercanos al 85%, aunque con avances físicos igualmente elevados. En particular, el Componente 2 concentra el mayor volumen de recursos del Programa y es el único que presenta productos aún no completados en su totalidad al cierre del periodo analizado. La evidencia cualitativa permite interpretar esta concentración presupuestal como consistente con el énfasis tecnológico del Programa. En las entrevistas se señaló que el Componente 2 debía concentrar una proporción relevante de los recursos, dado que allí se ubicaban buena parte de las herramientas y desarrollos orientados a materializar la transformación digital de la entidad.

La comparación entre avance físico y financiero señala que la materialización de los productos sustantivos no dependió de la ejecución total de los recursos presupuestados para cada componente. En los Componentes 1 y 3, por ejemplo, el cumplimiento físico alcanzó el 100% pese a que la ejecución financiera permaneció por debajo de ese nivel. Este comportamiento se alinea con los hallazgos previos relacionados con la diferencia entre recursos aprobados, recursos efectivamente utilizados y recursos estimados a liberar al cierre de la operación.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Finalmente, se observa que el Componente 4, correspondiente a administración y gestión del Programa, registra una ejecución financiera de 67,3%, inferior a la observada en los componentes sustantivos. Las diferencias observadas entre componentes apuntan a que la relación entre ejecución financiera y cumplimiento físico no fue homogénea a lo largo de la operación. Mientras algunos componentes alcanzaron el cumplimiento total de sus productos con niveles de ejecución financiera inferiores al 100%, otros mantuvieron mayores requerimientos presupuestales asociados a desarrollos tecnológicos, infraestructura o actividades de cierre.

**Tabla 12. Paralelo de avance físico y financiero por componentes del Programa**

| Componente | Programado Financiero ajustado USD | Avance % Financiero | Avance % Físico |
|------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| C1         | \$ 5.173.981                       | 85,0%               | 100,0%          |
| C2         | \$ 11.709.612                      | 85,5%               | 100%            |
| C3         | \$ 2.959.215                       | 94,2%               | 100,0%          |
| C4         | \$ 2.261.706                       | 67,3%               | NA              |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

**H. 15. Aunque existe una alta correspondencia entre el avance físico y financiero de la mayoría de los productos, algunos desarrollos estratégicos presentan cumplimiento físico completo con niveles de ejecución financiera significativamente inferiores.** La comparación entre el avance físico y financiero a nivel de producto muestra una alta correspondencia en la mayoría de los casos. De los 29 productos incluidos en la operación, la mayor parte registra niveles de ejecución física y financiera cercanos o equivalentes al 100%, lo que es señal de una relación consistente entre los recursos ejecutados y los productos efectivamente entregados.

No obstante, se identifican algunos productos estratégicos que presentan cumplimiento físico total acompañado de niveles de ejecución financiera considerablemente inferiores. Entre los casos más destacados se encuentran el Producto 2.7 “Sistema metabuscador integral diseñado e implementado”, con un cumplimiento físico de 100% y una ejecución financiera de 19%; y el Producto 1.3 “Modelo semántico de documentos y expediente electrónico y datos asociados a los mismos”, con un cumplimiento físico de 100% y una ejecución financiera de 37%. También se observan diferencias relevantes en productos asociados al fortalecimiento de capacidades institucionales y a la gestión cultural del cambio. De manera complementaria, la consulta virtual muestra una percepción favorable sobre la relación entre ejecución financiera y avances del Programa: el 91,7% de los participantes estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la ejecución financiera fue consistente con los avances logrados.

La triangulación entre la información físico-financiera y las entrevistas institucionales permite interpretar estas diferencias como resultado de dinámicas contractuales y presupuestales específicas, más que como evidencia directa de incumplimiento físico. En particular, la evidencia cualitativa señala que algunas brechas pueden asociarse a contrataciones realizadas por valores inferiores a los previstos inicialmente, ajustes de programación, pagos pendientes, rezagos presupuestales o recursos que no fueron requeridos para completar determinados entregables.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

**Tabla 13. Avance físico y financiero por producto del Programa**

| Componente | Producto | Avance% financiero | Avance% físico |
|------------|----------|--------------------|----------------|
| 1          | 1        | 100%               | 100%           |
| 1          | 2        | 100%               | 100%           |
| 1          | 3        | 37%                | 100%           |
| 1          | 4        | 100%               | 100%           |
| 1          | 5        | 99%                | 100%           |
| 1          | 6        | 97%                | 100%           |
| 1          | 7        | 100%               | 100%           |
| 1          | 8        | 100%               | 100%           |
| 1          | 9        | 98%                | 100%           |
| 2          | 1        | 100%               | 100%           |
| 2          | 2        | 100%               | 100%           |
| 2          | 3        | 100%               | 100%           |
| 2          | 4        | 100%               | 100%           |
| 2          | 5        | 100%               | 100%           |
| 2          | 6        | 100%               | 100%           |
| 2          | 7        | 19%                | 100%           |
| 2          | 8        | 68%                | 100%           |
| 2          | 9        | 100%               | 100%           |
| 3          | 1        | 100%               | 100%           |
| 3          | 2        | 100%               | 100%           |
| 3          | 3        | 99%                | 100%           |
| 3          | 4        | 100%               | 100%           |
| 3          | 5        | 75%                | 100%           |
| 3          | 6        | 100%               | 100%           |
| 3          | 7        | 83%                | 100%           |
| 4          | 1        | 72%                | NA             |
| 4          | 2        | 61%                | NA             |
| 4          | 3        | 25%                | NA             |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

➤ **Apropiación institucional de productos y desarrollos estratégicos<sup>25</sup>**

**H. 16. Se evidencia una apropiación funcional diferenciada de los productos estratégicos del Programa, especialmente en herramientas asociadas a analítica, georreferenciación, canales digitales, gestión de información e infraestructura tecnológica. La información**

<sup>25</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿En qué medida los productos y desarrollos implementados por el Programa fueron apropiados e incorporados por las dependencias responsables de su uso y sostenimiento, de acuerdo con su ámbito funcional?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

cualitativa recogida en las entrevistas permite complementar la evidencia documental sobre los productos ejecutados por el Programa, incorporando elementos sobre su uso e incorporación en procesos institucionales. En particular, los actores consultados señalaron que varios desarrollos asociados a analítica de datos, georreferenciación, canales digitales, modelos de información, infraestructura tecnológica y herramientas de consulta han comenzado a ser utilizados por dependencias misionales y técnicas de la CGR en actividades de seguimiento, control fiscal, atención de requerimientos y soporte a la toma de decisiones. Particularmente, lo referido a la automatización de procesos se indicó que contribuye positivamente a la efectividad del control fiscal.

En el caso de los productos asociados al Componente 2, las entrevistas muestran una apropiación más visible en dependencias vinculadas con análisis de información y control fiscal. Se mencionó el uso de modelos analíticos para hacer seguimiento a sectores como infraestructura, educación, salud, defensa y justicia, así como la utilización de herramientas de georreferenciación e imágenes satelitales para monitorear proyectos de infraestructura, emergencias invernales y situaciones territoriales específicas. También se señaló que el Metabuscador ha contribuido a mejorar la consulta de información institucional, incluyendo requerimientos, derechos de petición, alertas emitidas y reportes solicitados por directivos o delegadas sectoriales.

Respecto al Componente 3, las entrevistas permiten identificar una apropiación asociada al fortalecimiento de canales digitales y a la ampliación de la capacidad de recepción de peticiones ciudadanas. Los actores consultados señalaron que las herramientas tecnológicas han facilitado el acceso de la ciudadanía a la CGR, especialmente en territorios donde la atención presencial puede ser más limitada. En algunos casos, se indicó que las denuncias recibidas por canales virtuales han permitido activar procesos de articulación institucional y generar alertas o actuaciones relacionadas con problemáticas de interés nacional. La apropiación también se observa en desarrollos de soporte tecnológico e infraestructura.

En las entrevistas se mencionó que la capacidad en nube, la conectividad en gerencias, los equipos de comunicación y los servicios tecnológicos adquiridos han permitido fortalecer condiciones operativas para el uso y evolución de modelos de análisis, automatización y gestión de información. Estos elementos no siempre son visibles como productos finales para el usuario, pero constituyen condiciones habilitantes para sostener el uso de herramientas digitales dentro de la entidad. No obstante, la evidencia cualitativa también muestra que la apropiación no es homogénea entre dependencias. Algunas áreas, especialmente aquellas con funciones administrativas, financieras o contractuales, indicaron no utilizar directamente los productos del Programa, aunque sí participan en su seguimiento, financiación, contratación o verificación. En este sentido, la apropiación debe entenderse de manera diferenciada: más intensa en las dependencias usuarias de herramientas analíticas, tecnológicas y de participación ciudadana, y más indirecta en las áreas de soporte institucional.

La triangulación entre la evidencia documental y la información cualitativa permite afirmar que varios productos estratégicos no solo fueron entregados, sino que han comenzado a incorporarse en

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

procesos institucionales específicos. Sin embargo, la consolidación de dicha apropiación dependerá de la continuidad en el uso, actualización, mantenimiento y articulación de estos desarrollos con las rutinas operativas de las dependencias responsables.

➤ **Restricciones, cuellos de botella y ajustes en la implementación<sup>26</sup>**

**H. 17. Las principales restricciones de implementación se concentraron en factores técnicos, contractuales e institucionales, más que en incumplimientos generalizados de productos.**

La evidencia documental muestra que el Programa alcanzó un alto nivel de cumplimiento físico al cierre de 2025, por lo que las restricciones identificadas no parecen haber comprometido de manera generalizada la entrega de productos. No obstante, las entrevistas institucionales permiten precisar que la implementación enfrentó dificultades de distinta naturaleza, especialmente en los frentes técnico, contractual e institucional.

En las entrevistas se mencionaron restricciones asociadas a la calidad, disponibilidad e integración de datos, particularmente en productos que requerían interoperabilidad, análisis de información o consulta de fuentes externas e internas. Estas dificultades incidieron en los tiempos de desarrollo y en la posibilidad de contar con información en condiciones adecuadas para su procesamiento y uso operativo. Asimismo, los actores consultados señalaron que algunos productos tecnológicos requirieron ajustes durante la implementación, dada la necesidad de adaptar especificaciones, adquisiciones o desarrollos a las condiciones reales de operación de la entidad.

También se identificaron restricciones relacionadas con los tiempos de contratación y los procedimientos aplicables a una operación financiada con crédito multilateral. En las entrevistas se señaló que las diferencias entre procedimientos institucionales y procedimientos BID, junto con la programación presupuestal, la gestión del PAC y los plazos disponibles para comprometer recursos, generaron presiones sobre la ejecución. En algunos casos, estas condiciones llevaron a solicitar prórrogas, ajustar adquisiciones o reprogramar pagos a proveedores.

Finalmente, la evidencia cualitativa muestra que la implementación también estuvo condicionada por factores organizacionales, como cambios en directivos, ingreso de nuevos funcionarios y resistencia al uso de herramientas tecnológicas. Estos factores no implicaron necesariamente incumplimientos de productos, pero sí afectaron la velocidad de apropiación, continuidad y estabilización de algunos desarrollos. Así pues, las restricciones observadas fueron consistentes con la complejidad de una intervención de transformación digital que combina cambios tecnológicos, contractuales y organizacionales.

<sup>26</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿Qué factores facilitaron o limitaron la implementación de los productos del Programa, por componente y área responsable, y de qué manera favorecieron su incorporación y uso institucional?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

#### **H. 18. La articulación entre la UEP, las áreas técnicas de la CGR y el BID operó como un factor facilitador para mitigar restricciones y ajustar la implementación durante el cierre del Programa.**

Ahora bien, la información de las entrevistas también muestra la existencia de factores que facilitaron la implementación y permitieron ajustar la operación durante su desarrollo. Entre ellos se destaca la comunicación permanente entre la UEP, las áreas técnicas de la CGR y el BID, así como la participación de las dependencias usuarias en la definición, seguimiento y ajuste de productos.

Los actores consultados señalaron que la articulación entre la Unidad Ejecutora y las áreas técnicas fue relevante para adaptar los desarrollos a las necesidades institucionales y resolver dificultades que surgieron durante la implementación. En particular, se mencionó la socialización constante de avances, la participación de equipos técnicos y profesionales en la construcción de productos, y el acompañamiento del BID frente a la gestión de ajustes, adquisiciones y decisiones de cierre.

La información cualitativa también resalta la apropiación progresiva del Programa por parte de funcionarios y dependencias de la CGR como un factor facilitador. En las entrevistas se observó que, a medida que los productos comenzaron a mostrar utilidad práctica para el seguimiento, la automatización, la gestión de información y el control fiscal, aumentó la disposición institucional para incorporarlos en procesos de trabajo. Esta apropiación progresiva contribuyó a mitigar resistencias iniciales y a fortalecer la continuidad de los desarrollos implementados. La consulta virtual también respalda esta interpretación: el 91,6% de los participantes estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el Programa superó cuellos de botella mediante ajustes oportunos y decisiones estratégicas.

#### **➤ Plan de adquisiciones, contratación y soporte fiduciario<sup>27</sup>**

#### **H. 19. El proceso de adquisiciones y contratación fue un habilitador clave para materializar los principales desarrollos tecnológicos previstos por el Programa, particularmente aquellos asociados a transformación digital, gestión de información y control fiscal.**

La revisión de la documentación técnica y de seguimiento evidencia que los procesos de adquisición y contratación desempeñaron un papel central en la materialización de los principales desarrollos tecnológicos previstos por el Programa. En particular, una parte importante de los recursos ejecutados estuvo orientada a la contratación de bienes, servicios y soluciones tecnológicas necesarias para fortalecer las capacidades institucionales de la Contraloría General de la República en materia de gestión de información, automatización de procesos, analítica de datos y control fiscal.

<sup>27</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿En qué medida el Plan de Adquisiciones, sus reprogramaciones y la gestión contractual incidieron en la oportunidad y eficiencia de la ejecución del Programa?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

La evidencia disponible muestra que, al cierre del Programa, se encontraban implementados productos estratégicos asociados a la estrategia de transformación digital, la automatización de procesos, los modelos de analítica para el control fiscal preventivo y concomitante, el modelo de Data Lake basado en Big Data, la georreferenciación para el control fiscal y los desarrollos orientados a fortalecer la participación ciudadana. La evaluación intermedia identificó varios de estos productos como iniciativas estratégicas debido a su potencial para contribuir al logro de los resultados esperados por la operación.

En este contexto, los procesos de adquisición no constituyeron únicamente mecanismos administrativos para la ejecución de recursos, sino instrumentos habilitadores para la implementación de los desarrollos que sustentan la lógica de intervención del Programa. La alta ejecución física observada en la mayoría de los productos estratégicos sugiere que las adquisiciones realizadas permitieron avanzar de manera significativa en la consolidación de las capacidades tecnológicas previstas durante el diseño de la operación.

La información cualitativa complementa esta lectura al mostrar que los procesos de adquisición y contratación fueron percibidos por los actores institucionales como una condición habilitante para la implementación de productos tecnológicos especializados. En las entrevistas se observó que varios de los desarrollos asociados a analítica de datos, infraestructura tecnológica, interoperabilidad, ciberseguridad, georreferenciación y gestión de información requerían capacidades técnicas, bienes y servicios que debían ser incorporados mediante procesos contractuales específicos. En ese sentido, las adquisiciones no solo permitieron ejecutar recursos, sino traducir necesidades misionales y tecnológicas de la CGR en soluciones concretas para apoyar la transformación digital y el fortalecimiento del control fiscal.

## **H. 20. La culminación física de la mayoría de los productos antecedió el cierre administrativo, contractual y financiero de la operación.**

La culminación física de los productos previstos por el Programa se produjo antes de la finalización completa de los procesos administrativos y financieros asociados a la operación. Al cierre de 2025, el Programa registraba un cumplimiento físico acumulado de 100%, mientras que continuaban vigentes actividades relacionadas con pagos pendientes, reservas presupuestales, justificaciones financieras y procesos de cierre programados para la vigencia 2026.

Esta situación resulta consistente con la naturaleza de operaciones complejas de transformación institucional y tecnológica, en las cuales la entrega efectiva de productos suele preceder las etapas de cierre contractual, conciliación financiera, justificación de gastos y formalización administrativa de los procesos ejecutados.

La evidencia disponible sugiere que la mayor parte de los desarrollos previstos ya se encontraba implementada al finalizar el periodo analizado, mientras que las actividades pendientes se

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

concentraban principalmente en aspectos administrativos, financieros y de consolidación del cierre de la operación.

Las entrevistas también permiten precisar que la diferencia entre culminación física y cierre administrativo-financiero responde a la coexistencia de fases distintas dentro de la operación. Los actores consultados señalaron que, aun cuando varios productos ya se encontraban implementados o en uso, permanecían actividades asociadas a pagos, justificaciones, reservas presupuestales, cierre de contratos y depuración de saldos. Esta evidencia cualitativa es consistente con la información financiera revisada, en la medida en que muestra que el cierre de la operación no ocurre de manera simultánea a la entrega física de los productos, sino que requiere procesos posteriores de formalización, verificación y liquidación.

#### ➤ **Control interno, financiero y contable del Programa<sup>28</sup>**

#### **H. 21. La operación contó con mecanismos formales y funcionales de seguimiento, control financiero y gestión contable, respaldados por reportes periódicos, auditorías externas y rutinas de seguimiento fiduciario durante la implementación.**

La información cualitativa recogida en las entrevistas complementa esta lectura al señalar que los mecanismos de seguimiento financiero y contable fueron utilizados de manera periódica durante la implementación del Programa. Los actores consultados destacaron la existencia de reportes, controles internos, revisión de compromisos, seguimiento a pagos, justificaciones ante el Banco y coordinación entre la UEP, las áreas financieras y las instancias de supervisión de la operación. En ese sentido, la evidencia cualitativa sugiere que el control financiero no se limitó a la producción documental exigida por el préstamo, sino que hizo parte de una rutina de seguimiento operativo y fiduciario durante la ejecución

La documentación financiera y los insumos de auditoría disponibles muestran que el Programa contó con mecanismos formales de seguimiento, control financiero y gestión contable a lo largo de su ejecución. Entre estos mecanismos se encuentran los estados financieros periódicos, los informes semestrales de progreso, los procesos de auditoría externa, los reportes de desembolsos y justificaciones ante el Banco Interamericano de Desarrollo, así como las herramientas de seguimiento físico-financiero utilizadas para monitorear la operación.

La información cualitativa recogida en las entrevistas complementa esta lectura al señalar que los mecanismos de seguimiento financiero y contable fueron utilizados de manera periódica durante la implementación. Los actores consultados destacaron la existencia de reportes, controles internos, revisión de compromisos, seguimiento a pagos, justificaciones ante el Banco y coordinación entre la UEP, las áreas financieras y las instancias de supervisión de la operación.

En la consulta virtual, el 91,6% de los participantes manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la estructura de control y seguimiento financiero del Programa fue adecuada. Este

<sup>28</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿La estructura de control interno, financiero y contable adoptada fue suficiente para soportar adecuadamente la ejecución del Programa?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

resultado complementa la evidencia documental sobre reportes, auditorías, justificaciones y mecanismos de seguimiento fiduciario, y confirma una percepción institucional favorable sobre la suficiencia de dichos mecanismos.

La triangulación de fuentes permite concluir que la operación contó con una estructura activa de control financiero y contable. Los procesos que permanecen asociados al cierre deben entenderse principalmente como actividades propias de liquidación, legalización de gastos, depuración de saldos, pagos pendientes y formalización final de la operación, y no como ausencia de mecanismos de control durante la implementación.

### ➤ Conclusiones

El análisis de efectividad muestra que el Programa alcanzó un nivel alto de materialización de los productos previstos y que, en términos generales, logró avanzar de manera consistente frente a los objetivos definidos en su diseño. La evidencia físico-financiera indica que al cierre de 2025 el cumplimiento físico agregado llegó a 100%, con cumplimiento total en los Componentes 1, 2 y 3. Este resultado es relevante porque los productos ejecutados no corresponden únicamente a actividades de apoyo, sino a desarrollos estratégicos asociados a automatización de procesos, analítica de datos, gestión de información, infraestructura tecnológica, participación ciudadana y fortalecimiento del control fiscal.

La trayectoria de ejecución muestra que la efectividad del Programa estuvo asociada a una dinámica propia de intervenciones de transformación digital: la ejecución financiera avanzó inicialmente por encima del cumplimiento físico, mientras que los productos se consolidaron de forma acelerada en las fases finales de implementación. La triangulación de información documental, financiera y cualitativa permite interpretar esta secuencia como resultado de procesos previos de diseño, estructuración técnica, contratación, desarrollo tecnológico y articulación institucional. En ese sentido, las diferencias observadas entre avance físico y financiero no constituyen, por sí mismas, evidencia de incumplimiento, sino que reflejan la coexistencia de fases contractuales, presupuestales y operativas distintas.

Uno de los factores que favoreció la efectividad fue la capacidad del Programa para articular adquisiciones, contratación, soporte fiduciario y trabajo técnico con las áreas responsables de los productos. Las entrevistas muestran que las adquisiciones fueron un habilitador clave para incorporar bienes, servicios y capacidades especializadas necesarias para la transformación digital de la CGR. Asimismo, la información cualitativa evidencia una apropiación funcional diferenciada de varios productos estratégicos, especialmente aquellos asociados a analítica, georreferenciación, canales digitales, gestión de información e infraestructura tecnológica. Esto permite concluir que una parte importante de los desarrollos no solo fue entregada formalmente, sino que ha comenzado a incorporarse en procesos institucionales específicos.

No obstante, la efectividad alcanzada estuvo acompañada de restricciones técnicas, contractuales e institucionales que incidieron en los tiempos y condiciones de implementación. Entre ellas se identifican dificultades asociadas a calidad e integración de datos, interoperabilidad, tiempos de

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

contratación, programación presupuestal, gestión del PAC, cambios directivos y resistencia inicial al uso de algunas herramientas tecnológicas. Estos factores no impidieron el cumplimiento general de los productos, pero sí muestran que la consolidación de los resultados depende de mantener capacidades institucionales, asegurar continuidad operativa, fortalecer la transferencia de conocimiento y sostener los mecanismos de seguimiento, control financiero y gestión contable que acompañaron la ejecución.

### 3.3.3. Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a las estrategias que deberían adelantarse para que los productos y resultados por cada componente se mantengan en uso en el futuro por parte de la CGR, una vez finalizada la implementación del Programa. La sostenibilidad está determinada tanto por la probabilidad como por el impacto de varios riesgos sobre la continuidad de los resultados más allá de la culminación del Programa.

#### ➤ Análisis de riesgos

Desde la perspectiva de los riesgos, se encuentran vigentes los siguientes.

**Tabla 14. Riesgos vigentes al cierre del Programa**

| A CARGO DE LA UEP - BID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Producto/resultado asociado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nivel de riesgo | Estado actual                                                                                                                                                      |
| Si el Programa para la Transformación Digital de la CGR no es priorizado estratégicamente por la nueva administración antes del 30 de septiembre, la contratación de la automatización de procesos priorizados no podría iniciar en el plazo previsto, lo que generará una desviación del avance de la meta del 32% prevista del producto 1.5 (Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada) para el primer año de ejecución del contrato. | P: Estrategia para la implementación de la automatización de procesos, diseñada e implementada<br><br>R: Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones; Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales; Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control | Medio alto      | Se manifiesta que este riesgo se ha mantenido latente debido a los cambios en la dirección de la CGR, lo que trae consigo reprocesos que se espera sean superados. |
| Si en la entidad se presenta recorte de personal por parte de las diferentes áreas, puede afectar la ejecución del Programa al no contar con enlaces suficientes que apoyen la ejecución de los procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P: productos para la vigencia 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medio bajo      | Se afecta esta gestión por la reducción del presupuesto asignado a la CGR para la vigencia 2025 (56,05%)                                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Producto/resultado asociado                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de riesgo | Estado actual                                                                                                                                                                                                                                  |
| Si la USATI no prepara los insumos técnicos para iniciar los procesos de contratación de acuerdo con el cronograma previsto, la contratación del diseño e implementación de los modelos de identidad digital y de gestión de derechos digitales no podrían iniciarse en el plazo previsto, lo que generará una desviación del avance de la meta financiera de aproximadamente el 50% prevista del producto 1.8 (Modelos de identidad digital diseñado e implementado) para el primer año de ejecución del programa. | P: Modelo de identidad digital diseñado e implementado<br><br>R: Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones; Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales; Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control | Medio bajo      | Se indica que las capacidades de la USATI han demostrado previamente que tiene un nivel de cumplimiento del 90% frente a requerimientos. Es necesario controlar este nivel de cumplimiento en tiempo y previendo la finalización del Programa. |
| Si el Programa para la Transformación Digital de la CGR no es priorizado estratégicamente por la nueva administración antes del 30 de septiembre, La contratación de la auditoría externa del programa no podría iniciar en el plazo previsto, lo que generará un incumplimiento del Artículo 7,03 Contrato de Préstamo, Estipulaciones Especiales, en cuanto a la entrega de los estados financieros auditados durante los siguientes 120 días a partir de la finalización de la vigencia.                         | P: 25 productos<br><br>R: Incrementar la productividad de la CGR para cumplir adecuadamente sus nuevas funciones; Incrementar las oportunidades para la participación ciudadana por canales digitales: Incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio del control                                        | Bajo            | Si bien está activo, se indica que el Programa ha presentado los estados financieros al BID en los plazos requeridos.                                                                                                                          |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa (CGR, 2025-II)

En adición, en el marco de esta evaluación, se identifican los siguientes, los cuales se fundamentan en las lecciones aprendidas identificadas por la UEP en su ISP 2025 - II y en los resultados de la evaluación:

Riesgo 1. La falta de una fuente de financiamiento para el mantenimiento de los sistemas del Componente 2 puede afectar la sostenibilidad financiera posterior al Programa.

Esto tiene origen en que desde el diseño del mismo no se incluyó una estrategia de financiamiento una vez finalice el mismo. A diferencia de los componentes 1 y 3 que sugieren contar con recursos de funcionamiento por abordar aspectos más estructurales a la gestión, en el caso de los productos del Componente 2 que están sujetos a mantenimiento y actualización es necesario prever los mismos para garantizar la continuidad. Lo anterior puede tener efectos de obsolescencia y abandono de los sistemas logrados en analítica, big data, georreferenciación, todos con efectos en la efectividad del control fiscal.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

Riesgo 2. La culminación del Programa requiere ser más riguroso en la ejecución de acciones para fortalecer el uso y apropiación de la transformación digital por parte del talento humano.

Esta situación tiene origen en el hecho de reconocer que *“Para crear apropiación de ello, se sugiere fortalecer la gestión del cambio e involucrar tempranamente a los equipos misionales y apoyos de áreas de los procesos, articulando estrategias de acompañamiento constante, escucha activa y participación en la definición, ejecución y medición de las herramientas”* (CGR, 2025).

➤ **Análisis de sostenibilidad: institucional, financiero, tecnológico y capital humano**<sup>29</sup>

En consecuencia, con el análisis de riesgos, en el marco de esta evaluación se presenta el análisis de la sostenibilidad desde lo institucional, lo financiero, lo tecnológico y en relación con el capital humano, con base en los riesgos expuestos. En lo institucional, se aborda la capacidad de la CGR para operar y mantener los productos sin financiación externa. En lo financiero, se revisan las condiciones para la disponibilidad de recursos para el mantenimiento de sistemas, licencias y capacidades técnicas alcanzadas. En lo tecnológico, se revisa el valor agregado y la alineación de lo logrado, en particular de los componentes 1 y 2 en relación con la compatibilidad de los desarrollos con la infraestructura institucional existente y las condiciones futura. Finalmente, en relación con el capital humano, tema estructural para el cambio institucional y la adopción tecnológica, se analizan las capacidades para operar, mantener y evolucionar los desarrollos del Programa desde la perspectiva del ciclo de talento humano.

○ **Condiciones institucionales**

**H. 22. La sostenibilidad debe diseñarse desde el inicio, no gestionarse al final.** El Programa abordó la sostenibilidad principalmente en la fase final de implementación, cuando una parte relevantes de las decisiones de diseño sobre tecnología, modelos de licenciamiento y capacidades del personal, ya estaban tomadas.

Los productos del Componente 1 relacionados con la estrategia de transformación digital, modelo de gobierno de datos, estándares, requieren para su sostenibilidad que la CGR institucionalice estas capacidades más allá de la vigencia de la UEP. La EMT identificó que la concentración de conocimiento en la UEP y en contratistas externos representa un riesgo para la sostenibilidad, riesgo latente en la actualidad. Al terminar el Programa, la Unidad Ejecutora deja de existir y las capacidades acumuladas no necesariamente están incorporadas en la estructura organizacional de la entidad. Este riesgo se mantiene de acuerdo con la información identificada en los ejercicios cualitativos, pues la indagar por productos logrados, se identificó bajo conocimiento, uso y apropiación.

<sup>29</sup> Este aspecto aborda la PO: ¿Qué condiciones institucionales, técnicas, operativas y presupuestales podrían favorecer o limitar la continuidad de los desarrollos y resultados alcanzados por el Programa?

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

El CGP instruyó a la UEP para que incluyera cláusulas de transferencia tecnológica en los contratos del Componente 2 sin que a la fecha de la propuesta de evaluación final se hubiera formalizado un acuerdo.

**H. 23. La gobernanza logra liderar las decisiones para la transformación digital, pero su continuidad como instancia no está garantizada lo que puede afectar la cohesión futura que requieren los resultados logrados y por desarrollar.** El Programa sí logró que el CGP funcione como instancia permanente de gobernanza y que la Oficina de Sistemas e Informática participe activamente en él, lo que constituye un avance de sostenibilidad institucional. Sin embargo, no se ha formalizado la continuidad de estos espacios de gobernanza una vez concluya el Programa.

El CGP discutió en sesiones de 2024 la necesidad de formular un plan de capacitación interna para personal de las áreas involucradas. La UEP inició la documentación de procesos críticos, pero sin un plan estructurado aprobado formalmente.

- **Condiciones tecnológicas**

**H. 24. La transferencia de conocimiento requiere mejorar en estructuración.** No se identifica un plan de transferencia de conocimiento formalizado a las áreas de la CGR, específicamente a la Oficina de Planeación, Oficina de Sistemas, DIARI.

En adición, la estrategia de ciberseguridad prevista en el Componente 2 es tanto un producto del Programa como una condición de sostenibilidad del conjunto de los desarrollos digitales. Luego de la consulta a los documentos institucionales, no se conoce si hay una estrategia de ciberseguridad implementada, y con recursos de mantenimiento asignados. Esto puede afectar todos los demás desarrollos tecnológicos. No obstante, la consulta al SIGECI evidencia que se documentado procesos en relación con la gestión del riesgo, seguridad y continuidad del negocio (CGR, 2026) que, si bien tienen un fin diferente al de una estrategia, es la base para gestionar esta ciberseguridad de forma estructural.

**H. 25. Es necesario reforzar las capacidades tecnológicas para fortalecer el conocimiento en lo tecnológico.** Se identifica un riesgo de dependencia de proveedores externos, debido a que varios de los desarrollos del Componente 2 (sistemas de georreferenciación, plataformas de control fiscal remoto) han sido implementados por contratistas externos. No se evidencia un mecanismo de transferencia tecnológica hacia el personal de la Oficina de Sistemas e Informática.

Las entrevistas con actores que participaron en el Programa muestran como prioritario mantener esfuerzos realizados para implementar la analítica de datos y la automatización de procesos como base para incorporar la inteligencia artificial como herramienta de trabajo. Estos se observan como facilitadores de organización de información para la toma de decisiones. Similar aporte genera las

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

inversiones en análisis forense. Estos tres aspectos pueden ser prioritarios para la sostenibilidad en términos de fortalecer el conocimiento.

- **Condiciones financieras**

**H. 26. Sin recursos previstos en gastos de funcionamiento se compromete la sostenibilidad de inversiones en hardware y software que puedan requerir actualización.** La CGR no cuenta con una partida presupuestal identificada y suficiente en su presupuesto de funcionamiento para sostener estos sistemas una vez concluya el préstamo.

Se identifica un riesgo de obsolescencia tecnológica, en razón a que los sistemas de analítica, big data e infraestructura TIC en lo que ha invertido el Programa requieren recursos para su mantenimiento y actualización. No se observa una planeación en este sentido.

Se identifica que se han abordado acciones junto con la Dirección Financiera de la CGR para identificar fuentes de financiamiento para la sostenibilidad del Programa luego de su finalización, pero aún no están identificadas.

- **Condiciones en relación con el capital humano**

**H. 27. El SIGECI logra cimentar bases para una gestión que capitalice los productos del Programa en los tres componentes, lo cual facilita adelantar con mayor esfuerzo acciones para que el talento humano de la entidad comprenda los productos entregados, los aprenda a gestionar y los aplique para su desempeño.** En efecto, se observa en el SIGECI ha documentado procesos en relación con los productos del Componente 1 en la gestión del riesgo, seguridad y continuidad del negocio - RSC (CGR, 2026), y en relación con los productos del Componente 2 en la gestión de direccionamiento estratégico, gestión de información y análisis, gestión de relaciones con los grupos de valor, en la gestión misional de vigilancia fiscal – control fiscal concomitante y preventivo, control fiscal micro y macro (CGR, 2026).

Sin embargo, es conocido que los sistemas de gestión tienen el reto de generar incentivos para lograr su uso y apropiación. Esto constituye un espacio para aprovechar esta capacidad que, con el liderazgo de la Oficina de Planeación, se puede apalancar. Adicionalmente, es necesario mitigar el riesgo que identifica esta evaluación en relación con la definición de acciones para fortalecer el uso y apropiación de la transformación digital por parte del talento humano.

➤ **Conclusiones**

Se exponen, a continuación, las conclusiones en materia de sostenibilidad para la CGR, a partir de las cuatro dimensiones analizadas.

En relación con la sostenibilidad institucional, los productos conseguidos con los tres componentes requieren mejorar en integración para lo cual, el SIGECI aporta a esta institucionalización de procesos. Así, es necesario consolidar una política de arquitectura institucional que estandarice los modelos tecnológicos logrados. Si bien los productos del Programa les conciernen a todos los

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

procesos de la entidad, el reto de adopción requiere mejorar en la declaración y desarrollo documental de los macroprocesos de Direccionamiento Estratégico, gestión de Información y análisis (GIA), gestión del riesgo, seguridad y continuidad del negocio (RSC), y los misionales de Vigilancia fiscal – control fiscal concomitante y preventivo (VIG) y Control fiscal micro (CMI).

A su vez, los entrevistados y la información analizada sobre la gestión del Programa muestran que la falta de socialización y los silos de información pueden constituir riesgos críticos en razón a que para una sostenibilidad efectiva se exige maximizar la difusión interna. Esto garantiza que la información se comparta entre las áreas con el fin de lograr que las innovaciones tecnológicas que se han desarrollado y focalizado en Bogotá se desplieguen en los territorios.

En relación con la sostenibilidad tecnológica y financiera, por definición la tecnología es un activo dinámico que, a su vez, configura un ecosistema institucional. Por estas características, requiere de políticas y recursos estables para su mantenimiento y para su evolución. Esto con el fin de mitigar la obsolescencia que se constituye en la principal amenaza, lo que es señalado también por los entrevistados. Se manifestó, en adición, la falta de una planificación para la actualización y acompañamiento en la implementación de las herramientas que se lograron con el Programa, a lo que se suma que no es clara la forma como se documentan las necesidades institucionales frente a lo logrado con fines de mantener su pertinencia.

Es de notar que la innovación tecnológica requiere, en relación con la sostenibilidad de condiciones del capital humano, garantizar que los funcionarios cuenten con conocimiento a través de acciones de información y comunicación, como de mejora de competencias a través de capacitación y formación. Si bien el riesgo de intermitencia del personal es propio de las entidades públicas en el país, a lo cual la CGR no es ajena, la falta de mecanismos para la gestión del conocimiento representa el mayor riesgo de pérdida de memoria institucional, situación que se agrava con la terminación de actividades de la Unidad Ejecutora.

## 4. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

A continuación, se detallan las lecciones aprendidas identificadas como parte del presente ejercicio evaluativo, y se plantean recomendaciones soportadas en los hechos destacados en la sección previa.

### 4.1. Lecciones aprendidas

Las **lecciones aprendidas** en el marco de una evaluación se definen como el aprendizaje obtenido a partir de las acciones desarrolladas en el marco de la intervención evaluada, reflejando la calidad de los resultados derivados de ellas. Tales experiencias podrían ser favorables (prácticas que mejoraron la gestión y resultados) conocidas como buenas prácticas, o bien experiencias no favorables (dificultades u obstáculos) que tienen oportunidad de ser mejoradas (UNODC, 2018, pág. 49).

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

#### 4.1.1. Buenas prácticas

Las **buenas prácticas** corresponden a prácticas que pueden ser destacadas como resultado de una intervención. Se pueden definir como un mecanismo para sensibilizar a los tomadores de decisión en los diferentes niveles sobre posibles soluciones a desafíos comunes de desarrollo, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimiento mediante redes y aprendizaje entre pares, y orientado principalmente a fortalecer las intervenciones públicas con base en prácticas que ya han demostrado efectos positivos (ILO, 2015, págs. 10-11).

##### ➤ **Ámbito evaluativo: impacto y resultados**

- El Programa contó con indicadores de impacto y resultado que permitieron hacer seguimiento periódico a dimensiones relevantes de su desempeño. Aunque el indicador de impacto fue ajustado durante la implementación, la disponibilidad de una serie anual permitió realizar ejercicios descriptivos y estadísticos orientados a valorar la evolución de los beneficios directos asociados al control preventivo y concomitante.
- La medición de resultados incorporó indicadores asociados a productividad institucional, seguimiento de alertas y participación ciudadana por canales digitales. Esta combinación permitió capturar avances en distintas dimensiones de la transformación digital de la CGR y no limitar el análisis a una única medida agregada de desempeño.

##### ➤ **Ámbito evaluativo: análisis económico ex – post**

- El análisis económico ex post adaptó la metodología de evaluación económica prevista inicialmente a las condiciones reales de seguimiento del Programa. Esta decisión permitió reconocer el cambio en el indicador de impacto y evitar la aplicación mecánica de una fórmula ex ante que ya no correspondía plenamente con la información disponible al cierre de la operación.
- La estimación de beneficios económicos distinguió entre beneficios directos del control fiscal y beneficios atribuibles al Programa. Esta práctica fortaleció la prudencia del análisis, al evitar imputar la totalidad de los beneficios reportados por el indicador de impacto a la operación financiada con crédito BID.

##### ➤ **Ámbito evaluativo: cumplimiento**

- El Programa contó con una estructura de seguimiento físico-financiero que permitió reconstruir la trayectoria de ejecución por componente, producto y vigencia. Esta práctica facilitó identificar avances acumulados, diferencias entre programación inicial y ajustada, y posibles desfases entre cumplimiento físico y ejecución financiera.
- La articulación entre la UEP, el BID y las áreas técnicas de la CGR funcionó como un factor facilitador para la implementación. Las entrevistas evidencian que esta coordinación permitió resolver restricciones técnicas, contractuales y operativas, así como acompañar la materialización de productos estratégicos.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- Los procesos de adquisiciones y contratación fueron utilizados como mecanismo habilitador para incorporar bienes, servicios y capacidades especializadas. Esto fue particularmente relevante en productos asociados a analítica, georreferenciación, infraestructura tecnológica, servicios TIC, interoperabilidad y ciberseguridad.
- EL ROP y los procesos adelantados por la UEP y el CGP dieron seguridad jurídica y técnica, además de facilitar la articulación entre la institucionalidad (roles y funciones) propios del Programa como de la CGR.
- La comunicación permanente entre el despacho del Vicecontralor y la UEP mejoró la oportunidad de las decisiones y la coordinación interna para lograr el cumplimiento de los hitos del Programa. La frecuencia de las reuniones para la toma de decisiones también contribuyó a esta efectividad.

#### 4.1.2. Aspectos por mejorar

Los **aspectos por mejorar** se identifican tras haberse realizado un proceso de análisis de una intervención, en este caso se trata de un ejercicio de evaluación. Se trata de establecer hasta qué punto una organización (sus programas y proyectos) se ajustan a los estándares normativos, las buenas prácticas y otros criterios, y así hacer recomendaciones a fin de mejorar o corregir determinadas acciones (PNUD, 2009).

En esta línea, se considera que el aprendizaje derivado de una evaluación, como es este caso, no solo ayuda a mejorar los resultados de los programas y proyectos existentes, sino que también refuerza la capacidad de la organización para tomar mejores decisiones y formular mejores programas y proyectos en el futuro (PNUD, 2009, pág. 11). Es desde esta perspectiva que se sitúan aspectos por mejorar en el marco del Programa, siempre con el ánimo de contribuir a la optimización de la operación del Programa

El aprendizaje derivado de una evaluación, como en este caso, no solo contribuye a mejorar los resultados de programas y proyectos en curso, sino que también fortalece la capacidad institucional para tomar decisiones más acertadas y diseñar mejores iniciativas en el futuro (PNUD, 2009, pág. 11). Desde esa mirada se identifican aspectos por mejorar en el marco del Programa siendo el propósito contribuir a la apropiación y sostenibilidad de los avances logrados.

##### ➤ **Ámbito evaluativo: impacto y resultados**

- La modificación del indicador de impacto durante la implementación evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de actualización de indicadores, metas y metodologías asociadas. Si bien el indicador vigente permitió contar con una medición monetaria de beneficios directos, el cambio frente a la formulación inicial generó retos para la trazabilidad metodológica y para la comparación entre el diseño ex ante y la evaluación ex post.
- La evaluación de resultados se vio limitada por el reducido número de observaciones disponibles y por la ausencia de un grupo de comparación. Esto restringe la posibilidad de

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

realizar inferencias causales robustas y muestra la importancia de diseñar, desde el inicio, estrategias de medición compatibles con evaluaciones de atribución o contribución.

➤ **Ámbito evaluativo: análisis económico ex – post**

- El cambio en el indicador de impacto redujo la aplicabilidad directa de la metodología económica ex ante. Esto evidencia la necesidad de que futuras operaciones definan reglas explícitas para ajustar el análisis costo-beneficio cuando se modifiquen indicadores, fuentes de información o supuestos de monetización.

➤ **Ámbito evaluativo: cumplimiento**

- La apropiación institucional de los productos no fue homogénea entre dependencias. Algunos desarrollos muestran uso funcional en áreas misionales y técnicas, mientras que otras dependencias participan de manera más indirecta en seguimiento, contratación o soporte. Esto evidencia la necesidad de fortalecer estrategias diferenciadas de apropiación según el rol de cada área.
- Persisten retos asociados a calidad, integración, interoperabilidad y documentación de datos. En una operación centrada en transformación digital, estos elementos son críticos para asegurar que los productos no solo estén implementados, sino que puedan ser usados de manera sostenida y confiable.
- La transferencia de conocimiento y la reducción de dependencia frente a proveedores externos requieren mayor estructuración. Los desarrollos tecnológicos implementados demandan capacidades internas para operar, mantener, actualizar y evolucionar las soluciones una vez finalizado el financiamiento externo.
- La gestión del cambio y la apropiación de capacidades digitales deben continuar más allá de la entrega de productos. La evidencia disponible muestra avances importantes, pero también indica que la consolidación de resultados depende de incentivos, formación continua, acompañamiento a usuarios y vinculación de los desarrollos con rutinas institucionales.

## 4.2. Recomendaciones

Las **recomendaciones** de un ejercicio evaluativo deben establecerse de modo que puedan efectivamente concretarse con los recursos y alcance del objeto evaluado, en este caso el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.

Las recomendaciones pueden ser definidas como “propuestas de acción basadas en las evidencias y destinadas a los usuarios de la evaluación (...)” y que se caracterizan por ser “claras para un enfoque futuro a fin de afrontar los retos principales” (PNUD, 2009, pág. 178).

En este caso, dado que se trata de una evaluación de cierre, se plantean recomendaciones destinadas a impulsar la sostenibilidad de los avances y resultados logrados en el marco del Programa, así como consideraciones para una experiencia futura similar.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- ✓ Incorporar en el plan de acción de la vigencia 2026 segundo semestre y para 2027, acciones centradas en tres frentes: mantenimiento de herramientas tecnológicas, identificación de necesidades de usuario y consecuente ajuste y capacitación. Esta acción debe estar acompañada de una estrategia para atenuar la dependencia de proveedores de tecnología, para sostener el licenciamiento en casos específicos y para reforzar con talento humano a la Oficina de Sistemas e Informática.
- ✓ Fortalecer el sistema de seguimiento de indicadores de impacto y resultado, incorporando fichas metodológicas actualizadas, responsables de reporte, fuentes de información, periodicidad, supuestos de cálculo y mecanismos de control de cambios. Esto permitiría mejorar la trazabilidad de los indicadores, especialmente cuando se presenten ajustes metodológicos o sustitución de mediciones durante la implementación.
- ✓ Institucionalizar una instancia de seguimiento posterior al cierre del Programa, tomando como referencia las funciones ejercidas por el Comité de Gestión del Programa y la UEP. Esta instancia debería apoyar la continuidad de los productos estratégicos, monitorear riesgos de sostenibilidad y articular a las dependencias responsables de los desarrollos tecnológicos, financieros, misionales y de planeación.
- ✓ Estructurar un plan formal de transferencia de conocimiento y apropiación institucional dirigido a las dependencias usuarias y de soporte. Este plan debería incluir documentación técnica, manuales de operación, formación continua, acompañamiento a usuarios, transferencia desde proveedores externos y mecanismos para asegurar que las capacidades queden incorporadas en equipos internos de la CGR.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## DOCUMENTOS CONSULTADOS

- ANECA. (s.f.). *Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación*. Obtenido de PLAN DE MEJORAS:  
[http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion\\_docente/15\\_elaboracion\\_plan\\_de\\_mejoras.pdf](http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_mejoras.pdf)
- BID. (2021). *Anexo - cálculo de beneficios económicos CO-L1266. EEO1A*. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.
- BID. (julio de 2021). *Reglamento Operativo del Programa*. Bogotá , Colombia.
- BID. (junio de 2021). *Reglamento Operativo del Programa Versión 2*. Bogotá, Colombia.
- BID. (28 de octubre de 2021a). *Colombia impulsará la transformación digital de la Contraloría General con apoyo del BID*. Recuperado el noviembre de 2024, de Comunicados de prensa: <https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-impulsara-la-transformacion-digital-de-la-contraloria-general-con-apoyo-del-bid>
- BID. (ND). *Anexo sobre la Contribución de la Operación a la Equidad de Género y Diversidad CO-L1266*. Bogotá.
- BID. (s.f.). *Plan de Monitoreo y Evaluación - Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la República*. Bogotá D.C.
- Carrillo, P. P., & Singhal, M. (2018). Dodging the taxman: Firm misreporting and limits to tax enforcement. *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(2), 144-164.
- CGR. (2020). *Matriz de lógica vertical*.
- CGR. (2022). *Informe de Gestión 2021-2022. Al Congreso y al Presidente de la República*. Bogotá. Recuperado el noviembre de 2024, de <https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-10/INFORME%20DE%20GESTION%20FINAL%202021-2022%20CONTRALORIA.pdf>
- CGR. (2023). *ISP - Semestre I - 2023*.
- CGR. (2025). *ISP - Semestre I - 2025*. Bogotá D.C.
- CGR. (2025). *ISP - Semestre II - 2025*. Bogotá D.C.
- CGR. (2025). *ISP - Semestre II - 2025*. Bogotá.
- CGR. (2025-II). *Anexo 6. Matriz de seguimiento a los indicadores del Programa*. Bogotá: IDB.
- CGR. (2025-II). *Matriz de resultados, metas físicas y financieras del programa para la transformación digital de la CGR*. Bogotá: BID.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

- CGR. (2026). *Protocolo para la Eliminación de las diferentes formas de Violencia de Género y por otras razones en la CGR*. Obtenido de <https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/CDISC/Entorno/MCopNoCont?codigo=743>
- CGR. (2026). *SISTEMA DE GESTION Y CONTROL INTERNO- SIGECI*. Obtenido de <https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/cdisc/Entorno/MaestroExterno>
- CGR. (2026). *SP No. CGR- 216-SCC/CO-L1266-P00147* . Bogotá D.C.
- CGR. (2026). *SP No. CGR- 216-SCC/CO-L1266-P00147* . Bogotá D.C.
- DNP. (junio de 2019). *Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor*. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Guia%20Cadena%20de%20valor%202019.pdf>
- DNP. (2021). *CONPES 4045*. Bogotá D.C.
- Econometría SAS. (2025). *Producto III – Informe final de la evaluación de medio término del Programa Transformación Digital de la CGR, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5385/OC- CO*. Bogotá: ND.
- Fondo Monetario Internacional. (2023). *Digital solutions guidelines for public financial management*.
- Gerrish, E. (2016). The impact of performance management on performance in public organizations: A meta analysis. *Public Administration Review*, 76(1), 48-66.
- ILO. (2015). *Guía para el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas: para combatir el trabajo infantil y promover el trabajo decente*. Oficina Internacional del Trabajo. Obtenido de [http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/gui\\_a\\_intercambio\\_de\\_buenas\\_pra\\_cticas\\_cambios.pdf](http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/gui_a_intercambio_de_buenas_pra_cticas_cambios.pdf)
- KPMG. (2023). *Informe sobre el Funcionamiento del Sistema de Control Interno, asociado con una auditoría de los estados financieros*.
- Ligero Lasa, J. A. (2011). Dos Métodos de Evaluación: Criterios y Teoría del Programa. *Documentos de Trabajo del Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD)*. Obtenido de [https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/4157/1/dos\\_ligero\\_2011.pdf](https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/4157/1/dos_ligero_2011.pdf)
- Linden, A., & Arbor, A. (2015). Conducting interrupted time-series analysis for single- and multiple-group comparisons. *The Stata Journal*, 480 - 500.
- McDevitt, A. (2022). *State of the evidence: Open Contrating*. Open Government Partnership.
- OCDE. (2023). *Glosario de términos clave en evaluación y gestión basada en resultados para el desarrollo sostenible*. Paris: Ediciones OCDE.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

OECD. (2023). *Glosario de términos clave en evaluación y gestión basada en resultados para el desarrollo sostenible*. París: Ediciones OCDE.

Ohashi, H. (2009). Effects of transparency in procurement practices on government expenditure: A case study of municipal public works. *Review of Industrial Organization*, 34(3), 267-285.

Plasencia-Soler, Marrero-Delgado, Nicado-García, & Sánchez, A. (2017). Procedimiento para la priorización de Factores Críticos de Éxito . *DYNA*.

PNUD. (2009). *Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo*. New York.

PNUD. (2009). *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*. Obtenido de MANUAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DESARROLLO: [https://procurement-notice.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=134774](https://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=134774)

UEP. (2026). *INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 5385/OC-CO “PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR” EJECUTADO POR LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*. Bogotá .

UEP. (2026). *INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 5385/OC-CO “PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR” EJECUTADO POR LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*. Bogotá.

UEP CGR . (2026). *INFORME DE ASEGURAMIENTO DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA REVISIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL “PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CGR” CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 5385/OC-CO, PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*. Bogotá.

UNODC. (2018). *Manual para Gestión Basada en Resultados y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena. Obtenido de [https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC\\_Handbook\\_on\\_Results\\_Based\\_Management\\_Espanol.pdf](https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC_Handbook_on_Results_Based_Management_Espanol.pdf)

Vogel, L. (2009). Macroeconomic effects of cost savings in public procurement. *Economic and Financial Affairs*, Economica paper 389.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

## ANEXO 1. LISTADO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA<sup>30</sup>

| NO. / FECHA | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                   | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                  | CONCLUSIONES                                                                                                                               | COMPROMISOS                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 dic 2021 | Vicecontralor, Directora de la Oficina de Planeación Gerente Administrativo y Financiero Consultor BID                                                                                                       | Análisis y aprobación del Reglamento Operativo del Programa (ROP)<br>Análisis y aprobación del Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones de la vigencia 2022 | Aprobación del ROP y del POA y del PA 2022.                                                                                                | Informar al BID sobre la aprobación del Reglamento Operativo del Programa y adelantar las gestiones para la contratación. |
| 31 ene 2022 | Contralor, Vicecontralor, Directora de la Oficina de Planeación Gerente Administrativo y Financiero, Director Oficina de Sistemas e Informática, Gerente UEP Directora Centro de Estudios Fiscales de la CGR | Aprobación al ajuste del Plan de Adquisiciones                                                                                                                  | Aprobación al ajuste del Plan de Adquisiciones                                                                                             | Ninguno                                                                                                                   |
| 1 mar 2022  | Contralor General, Vicecontralor, Directora de la Oficina de Planeación Gerente Administrativo y Financiero, Director Oficina de Sistemas e Informática, Gerente UEP                                         | Instalación formal del CGP; presentación del Plan de Adquisiciones 2022; definición de roles y responsabilidades.                                               | Aprobación del PA inicial. Definición del mecanismo de sesiones trimestrales. Acuerdo sobre canales de comunicación entre el CGP y la UEP. | UEP: gestionar aprobación del PA ante el BID en 30 días. Dir. Sistemas: designar enlace técnico permanente para la UEP.   |
| 7 jun. 2022 | Contralor General, Vicecontralor,                                                                                                                                                                            | Estado del Contrato de Préstamo                                                                                                                                 | Aprobación de ajuste al PA versión 2. Acuerdo de fortalecer el equipo                                                                      | UEP: vincular consultor                                                                                                   |

<sup>30</sup> La evaluación final en curso deberá validar y ampliar esta información con las actas originales del CGP.

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. / FECHA | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                               | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONCLUSIONES                                                              | COMPROMISOS                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Directora de la Oficina de Planeación<br>Gerente Administrativo y Financiero,<br>Director Oficina de Sistemas e Informática,<br>Gerente UEP                                                                              | Estado actual de ejecución del programa 2022<br><br>Estado del Plan de Adquisiciones 202                                                                                                                                                                                                                                                                   | de adquisiciones de la UEP.                                               | especializado en adquisiciones BID.                                                           |
| 21 oct 2022 | Contralor General,<br>Vicecontralor,<br>Director de la Oficina de Planeación<br>Gerente Administrativo y Financiero,<br>Director Oficina de Sistemas e Informática,<br>Gerente UEP                                       | Estado del Contrato de Préstamo<br>Estado actual de ejecución del programa 2022<br>Estado del Plan de Adquisiciones 2022                                                                                                                                                                                                                                   | Aprobación de ajuste al PA                                                | Ninguno                                                                                       |
| 23 ene 2023 | Contralor General,<br>Vicecontralor (asume como gerente de la UEP), Gerente Administrativo y Financiero,<br>Director Oficina de Sistemas e Informática,<br>Director de la Oficina de Planeación<br>Directora de la DIARI | Presentación de la Resolución organizacional No. OGZ.0820 de enero de 2023 que modifica la conformación y funcionamiento del CGP y la Resolución ordinaria 01428 de enero de 2023 pro la cual se asignaron funciones al Vicecontralor de la gerencia de la UEP.<br>Presentación del estado del crédito a 31 de diciembre de 2023<br>Aprobación del PA 2023 | Aprobación del PA para 2023                                               | Ninguno                                                                                       |
| 17 may 2023 | Vicecontralor y Gerente UEP,<br>Gerente Administrativo y Financiero, Dir.                                                                                                                                                | Presentación unidad ejecutora,<br>presentación estado de la operación, aprobación                                                                                                                                                                                                                                                                          | Llamado de atención en relación con la supervisión de contratos de 2022 y | Convocar al CGP para incluir los proyectos que sean objeto de adición y sean aprobados por el |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. /<br>FECHA | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                        | TEMAS TRATADOS                                | CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                  | COMPROMISOS             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                | Planeación, Dir. Sistemas e Informática<br>Miembros UEP; asesoras despacho<br>Vicecontralor, asesora Oficina de Planeación, consultora BID                                                                        | modificación al PA 2023, adición presupuestal | 2023 para concluir reservas.<br>Se aprueba la modificación del PA 2023.                                                                                                                       | Ministerio de Hacienda. |
| 27 Jun. 2023   | Vicecontralor y Gerente UEP, Gerente Administrativo y Financiero, Dir. Planeación, Dir. Sistemas e Informática<br>Miembros UEP; asesoras despacho<br>Vicecontralor, asesora Oficina de Planeación, consultora BID | Aprobación de modificación al PA 2023         | Se aprueba la modificación del PA 2023                                                                                                                                                        | Ninguno                 |
| 14 ago 2023    | Vicecontralor y Gerente UEP, Gerente Administrativo y Financiero, Dir. Planeación, Dir. Sistemas e Informática<br>Gerente DIARI consultora BID                                                                    | Aprobación de modificación al PA 2023         | Se aprueba la modificación del PA 2023                                                                                                                                                        | Ninguno                 |
| 27 sep 2023    | Director de despacho con funciones de Vicecontralor y contralor<br>Gerente Administrativo y Financiero, Dir. Planeación, Gerente UEP<br>Jefe DIARI Consultora BID                                                 | Avance del Programa Aprobación al PA 2023     | Revisión y ajuste con el BID, del indicador de impacto, para ajustar y conocer el resultado del programa implementado y ejecutado para el año 2025.<br>Se aprueba la modificación del PA 2023 | Ninguno                 |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. / FECHA | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                     | CONCLUSIONES                                                                                                                 | COMPROMISOS |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | Asesora Oficina de Planeación<br>Asesor Contraloría Delegada de Participación Ciudadana<br>Asesora DIARI                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |             |
| 5 dic 2023  | Asesor de despacho encargado como Vicecontralor y funciones de Contralor General, Dir. Planeación, Dir. Sistemas, Gerente Administrativo y Financiero, Gerente UEP DIARI Unidad de Información y Unidad de Seguridad y Aseguramiento tecnológico Consultora BID | Aprobación orden del día.<br>Aprobación Modificación Plan de Adquisición 2023 (inclusión nueva línea)<br>Aprobación Plan Operativo 2024.<br>Aprobación Plan de Adquisiciones 2024. | Se aprueba la modificación del PA 2023<br>Aprobación del POA 2024 previa presentación al BID y DNP<br>Aprobación del PA 2024 | Ninguna     |
| 28 dic 2023 | Vicecontralor y funciones de Contralor General, Dir. Planeación, Dir. Sistemas, Gerente Administrativo y Financiero, Gerente UEP Directora USATI DIARI Contraloría Delegada de Participación Ciudadana                                                          | Aprobación cancelación de 7 líneas de contratación en el Plan de Adquisiciones del año 2023                                                                                        | Aprobación del ajuste el PA 2024                                                                                             | Ninguna     |
| 17 ene 2024 | Vicecontralor y funciones de Contralor                                                                                                                                                                                                                          | Aprobación de modificación al PA 2024                                                                                                                                              | Se aprueba la modificación del PA 2024                                                                                       | Ninguno     |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. / FECHA    | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                                                              | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                 | CONCLUSIONES                                                                                          | COMPROMISOS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | General, Dir.<br>Planeación, Dir.<br>Sistemas,<br>Gerente<br>Administrativo y<br>Financiero,<br>Directora USATI<br>DIARI<br>Contraloría<br>Delegada de<br>Participación<br>Ciudadana                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |             |
| 23 feb<br>2024 | Vicecontralor y<br>funciones de<br>Contralor<br>General, Dir.<br>Planeación, Dir.<br>Sistemas,<br>Gerente<br>Administrativo y<br>Financiero<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Contraloría<br>Delegada de<br>Participación<br>Ciudadana                | Aprobación de<br>modificación al PA<br>2024                                                                                                                                    | Se aprueba la<br>modificación del PA<br>2024                                                          | Ninguno     |
| 14 mar<br>2024 | Vicecontralor y<br>funciones de<br>Contralor<br>General, Dir.<br>Planeación, Dir.<br>Sistemas,<br>Gerente<br>Administrativo y<br>Financiero<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Contraloría<br>Delegada de<br>Participación<br>Ciudadana<br>Gerente UEP | Aprobación de<br>modificación al PA<br>2024<br>Aprobación<br>Modificación Plan<br>Operativo Anual (POA)<br>Aprobación<br>Reasignación<br>excedentes por<br>modificación del PA | Se aprueba la<br>modificación del PA<br>2024 y al POA 2024 así<br>como la reasignación<br>de recursos | Ninguno     |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. / FECHA | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                                               | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                         | CONCLUSIONES                                                                                                                                                                       | COMPROMISOS |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 may 2024 | Vicecontralor y funciones de Contralor General, Dir. Planeación, Dir. Sistemas, Gerente Administrativo y Financiero Gerente UEP USATI Gerente UEP                                                                                        | Avance del programa Modificación plan de adquisición 2024. Cancelación de líneas Incorporación de nuevas líneas de adquisición Resultados de la auditoría                                                                                              | Se aprueba la modificación del PA 2024                                                                                                                                             | Ninguno     |
| 27 may 2024 | Vicecontralor y funciones de Contralor General, Dir. Planeación, Dir. Sistemas, Gerente Administrativo y Financiero Gerente UEP USATI Gerente UEP Contraloría Delegada de Participación Ciudadana Jefe Unidad Análisis de la Información | Presentación informe avance del programa.<br>a. Avance Físico.<br>b. Avance Financiero.<br>c. Avance Adquisiciones. Modificación plan de adquisición 2024. Presentación y aprobación plan de adquisiciones 2025. Evaluación medio término del Programa | No hubo novedades en la implementación Se aprueba la modificación del PA 2024 Aprobación del plan de adquisiciones 2025. Instrucciones para atender la evaluación de medio término | Ninguno     |
| 11 dic 2024 | Directora despacho, Dir. Planeación, Dir. Sistemas, Gerente Administrativo y Financiero, Gerente UEP USATI DIARI Contraloría Delegada de Participación Ciudadana Jefe Unidad Análisis de la Información                                  | Modificación del PA 2025                                                                                                                                                                                                                               | Aprobación al nuevo PA 2025                                                                                                                                                        | Ninguno     |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. / FECHA  | ASISTENTES                                                                                                                                                                                               | TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                             | CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROMISOS |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20 ene 2025  | Contralor General,<br>Vicecontralor,<br>Dir. Planeación,<br>Dir. Sistemas,<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Contraloría Delegada de Participación Ciudadana<br>Jefe Unidad Análisis de la Información | Modificación del PA 2025                                                                                                                                                   | Aprobación al nuevo PA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ninguno     |
| 17 mar 2025  | Directora despacho<br>Dir. Planeación,<br>Dir. Sistemas,<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Jefe Unidad Análisis de la Información                                                                      | Modificación Plan De Adquisición 2025.<br>Modificación método de Selección<br>Revisión de líneas de adquisiciones 1.8, 1.9 y 2.9<br>Cronograma ejecución del programa 2025 | Aprobación al nuevo PA 2025<br>Una vez presentado el avance del Programa, el gerente insiste en la importancia que en el mes de marzo se terminen de definir los aspectos técnicos de los procesos que deben publicarse en abril sus avisos previo envío para no Objeción al Banco, y así garantizar los plazos de ejecución de los contratos y entregas de productos. | Ninguno     |
| 19 mayo 2025 | Directora despacho<br>Gerente Administrativo y Financiero<br>Dir. Planeación,<br>Dir. Sistemas,<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Jefe Unidad Análisis de la Información<br>Contraloría Delegada de    | Modificación del PA 2025                                                                                                                                                   | Aprobación al nuevo PA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ninguno     |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. / FECHA | ASISTENTES                                                                                                                                                                                                                    | TEMAS TRATADOS                                                                                                  | CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                                | COMPROMISOS |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | Participación Ciudadana                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |             |
| 5 jun 2025  | Directora despacho<br>Gerente Administrativo y Financiero<br>Dir. Planeación,<br>Dir. Sistemas,<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Jefe Unidad Análisis de la Información<br>Contraloría Delegada de Participación Ciudadana | Modificación del PA 2025                                                                                        | Aprobación al nuevo PA 2025                                                                                                                                                                                 | Ninguno     |
| 3 sep 2025  | Directora despacho<br>Gerente Administrativo y Financiero<br>Dir. Planeación,<br>Dir. Sistemas,<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI<br>Jefe Unidad Análisis de la Información<br>Contraloría Delegada de Participación Ciudadana | Modificación del PA 2025                                                                                        | Aprobación al nuevo PA 2025                                                                                                                                                                                 | Ninguno     |
| 3 dic 2025  | Directora despacho<br>Gerente Administrativo y Financiero<br>Dir. Planeación,<br>Dir. Sistemas,<br>Gerente UEP<br>USATI<br>DIARI                                                                                              | Avance de indicadores del Programa<br>Resultados 2025<br>Modificación del PA 2025<br>PA 2025 y presupuesto 2025 | Es relevante el resultado del indicador de acciones de control preventivo que tiene un valor de 148% representando efectividad de las acciones de control preventivo y concomitante. Otros en presentación. | Ninguno     |

|                                                                                   |                                                                                                                           |  |  |    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|------|
|  | Evaluación final y de impacto del Programa para la Transformación Digital de la CGR - Contrato de Préstamo BID 5385/OC-CO |  |  | 16 | 6 | 2026 |
|                                                                                   | PRODUCTO II. INFORME DE EVALUACIÓN FINAL Y DE IMPACTO                                                                     |  |  |    |   |      |

| NO. /<br>FECHA | ASISTENTES                                                                                               | TEMAS TRATADOS | CONCLUSIONES                                                                                         | COMPROMISOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | Jefe Unidad<br>Análisis de la<br>Información<br>Contraloría<br>Delegada de<br>Participación<br>Ciudadana |                | Presentación de logros<br>relevantes.<br>Aprobación al nuevo PA<br>2026<br>Aprobación del PA<br>2026 |             |

Fuente: elaboración propia con base en información del Programa.

## ANEXO 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS (ADJUNTO EN ARCHIVO COMPRIMIDO)
